

Certyfikat PMP: Rozplanowanie ryzyka projektu

Przewodnik analityczny
według standardów PMBOK®

Opracowanie eksperckie: **dr Zbigniew Galar**



Czym jest ryzyko?

Niepewność, która posiada swoje przyczyny oraz konsekwencje.
Zarządzanie ryzykiem to sztuka znalezienia punktu równowagi.



Zagrożenia

Negatywne skutki dla celów projektu. Wymagają unikania lub minimalizacji.



Szanse

Pozytywne skutki dla projektu. Wymagają wykorzystania i wzmacniania.

Złota zasada PMBOK®: Gdy ryzyko się zmaterializuje, przestaje być ryzykiem, a staje się Problemem (Issue).

Pejzaż Planowania: 6 Procesów Zarządzania Ryzykiem

Faza Planowania

Faza Monitorowania i Kontroli



Zauważ: Prawie całe zarządzanie ryzykiem odbywa się w fazie Planowania, na długo przed pojawieniem się problemów.

Rurociąg Procesu: Planowanie Zarządzania Ryzykiem



Planowanie zarządzania ryzykiem rozpoczyna się wraz z samym projektem. Ten jeden dokument gwarantuje, że ryzykowi poświęcono odpowiednią ilość czasu i zasobów.

Fundamenty Danych: Gdzie szukać polityki ryzyka?

EEF (Czynniki Środowiskowe Przedsiębiorstwa)

Warunki zewnętrzne i wewnętrzne narzucone projektowi.



Podejście i nastawienie interesariuszy do ryzyka (Risk Attitude). To tutaj zapisane są ich lęki i apetyt na sukces.

OPA (Aktywa Procesów Organizacyjnych)

Zgromadzona wiedza i zasoby historyczne organizacji.



Gotowe szablony, formaty oświadczeń o ryzyku, bazy danych z poprzednich projektów. Nie wymyślaj koła na nowo.



Uwaga: Dokumentacja planu projektu (Scope Statement) to pierwsze miejsce, do którego zaglądasz przed zdefiniowaniem tych czynników.

Psychologia Ryzyka: Trzy Poziomy Nastawienia



Apetyt na ryzyko (Appetite)

Poziom niepewności, który interesariusze są gotowi zaakceptować w zamian za korzyści.

Przykład: Firma akceptuje ryzyko strajku, aby wdrożyć rewolucyjny system IT, ponieważ potencjalne zyski przeważają nad chaosem.



Tolerancja na ryzyko (Tolerance)

Indywidualny stopień wrażliwości i komfortu w obliczu konkretnej skali zagrożenia.

Przykład: 130-kilogramowy osilek z ochroniarzami wejdzie w ciemny zaułek, podczas gdy 45-kilogramowa osoba tego uniknie.



Próg ryzyka (Threshold)

Ściśle określona, mierzalna granica, po przekroczeniu której ryzyko staje się nieakceptowalne.

Przykład:
Reguła: »Nie akceptujemy żadnego ryzyka, które zagraża więcej niż 5% całkowitego budżetu«.

Kalibracja: Narzędzia i Techniki Planowania



Techniki Analityczne

- Zrozumienie apetytu i tolerancji interesariuszy.
- Opracowanie matrycy punktacji dla poszczególnych rodzajów ryzyka.
- Ocena ogólnej ekspozycji projektu na ryzyko.



Spotkania Planistyczne (Kluczowe Decyzje)

- Budżetowanie:** Włączenie kosztów ryzyka do budżetu projektu.
- Harmonogramowanie:** Dodanie działań zarządczych do harmonogramu.
- Odpowiedzialność:** Przypisanie ról dla zespołów zarządzania ryzykiem.
- Rezerwy:** Ustalenie procesu tworzenia rezerw na nieprzewidziane wydatki.

Anatomia Planu Zarządzania Ryzykiem



UWAGA: Plan zarządzania ryzykiem określa JAK zarządzać ryzykiem.
Nie zawiera on jeszcze definicji reakcji na konkretne, pojedyncze ryzyka!

Struktura Podziału Ryzyka (RBS – Risk Breakdown Structure)



RBS ujednolica słownik i klasyfikację w zespole, ułatwiając późniejszą identyfikację.

Wymiary Niepewności: Prawdopodobieństwo i Skutek

Prawie pewność



Niemał zero

Prawdopodobieństwo (Probability)

- Szansa, że dane zdarzenie (ryzyko) rzeczywiście wystąpi.
- **Wartości:** Od niemal zera do prawie pewności (ale nigdy 100%, bo wtedy staje się faktem).

Oś X



Niski


Wysoki

Skutek / Wpływ (Impact)

- Konsekwencje dla projektu w przypadku zmaterializowania się ryzyka.
- **Obszary wpływu:** Czas, Koszt, Zakres, Jakość.

Same wartości nie wystarczą. Dopiero ich kombinacja pozwala określić, które ryzyka wymagają natychmiastowej reakcji i szczegółowych planów.

Macierz Prawdopodobieństwa i Wpływu (P&I Matrix)

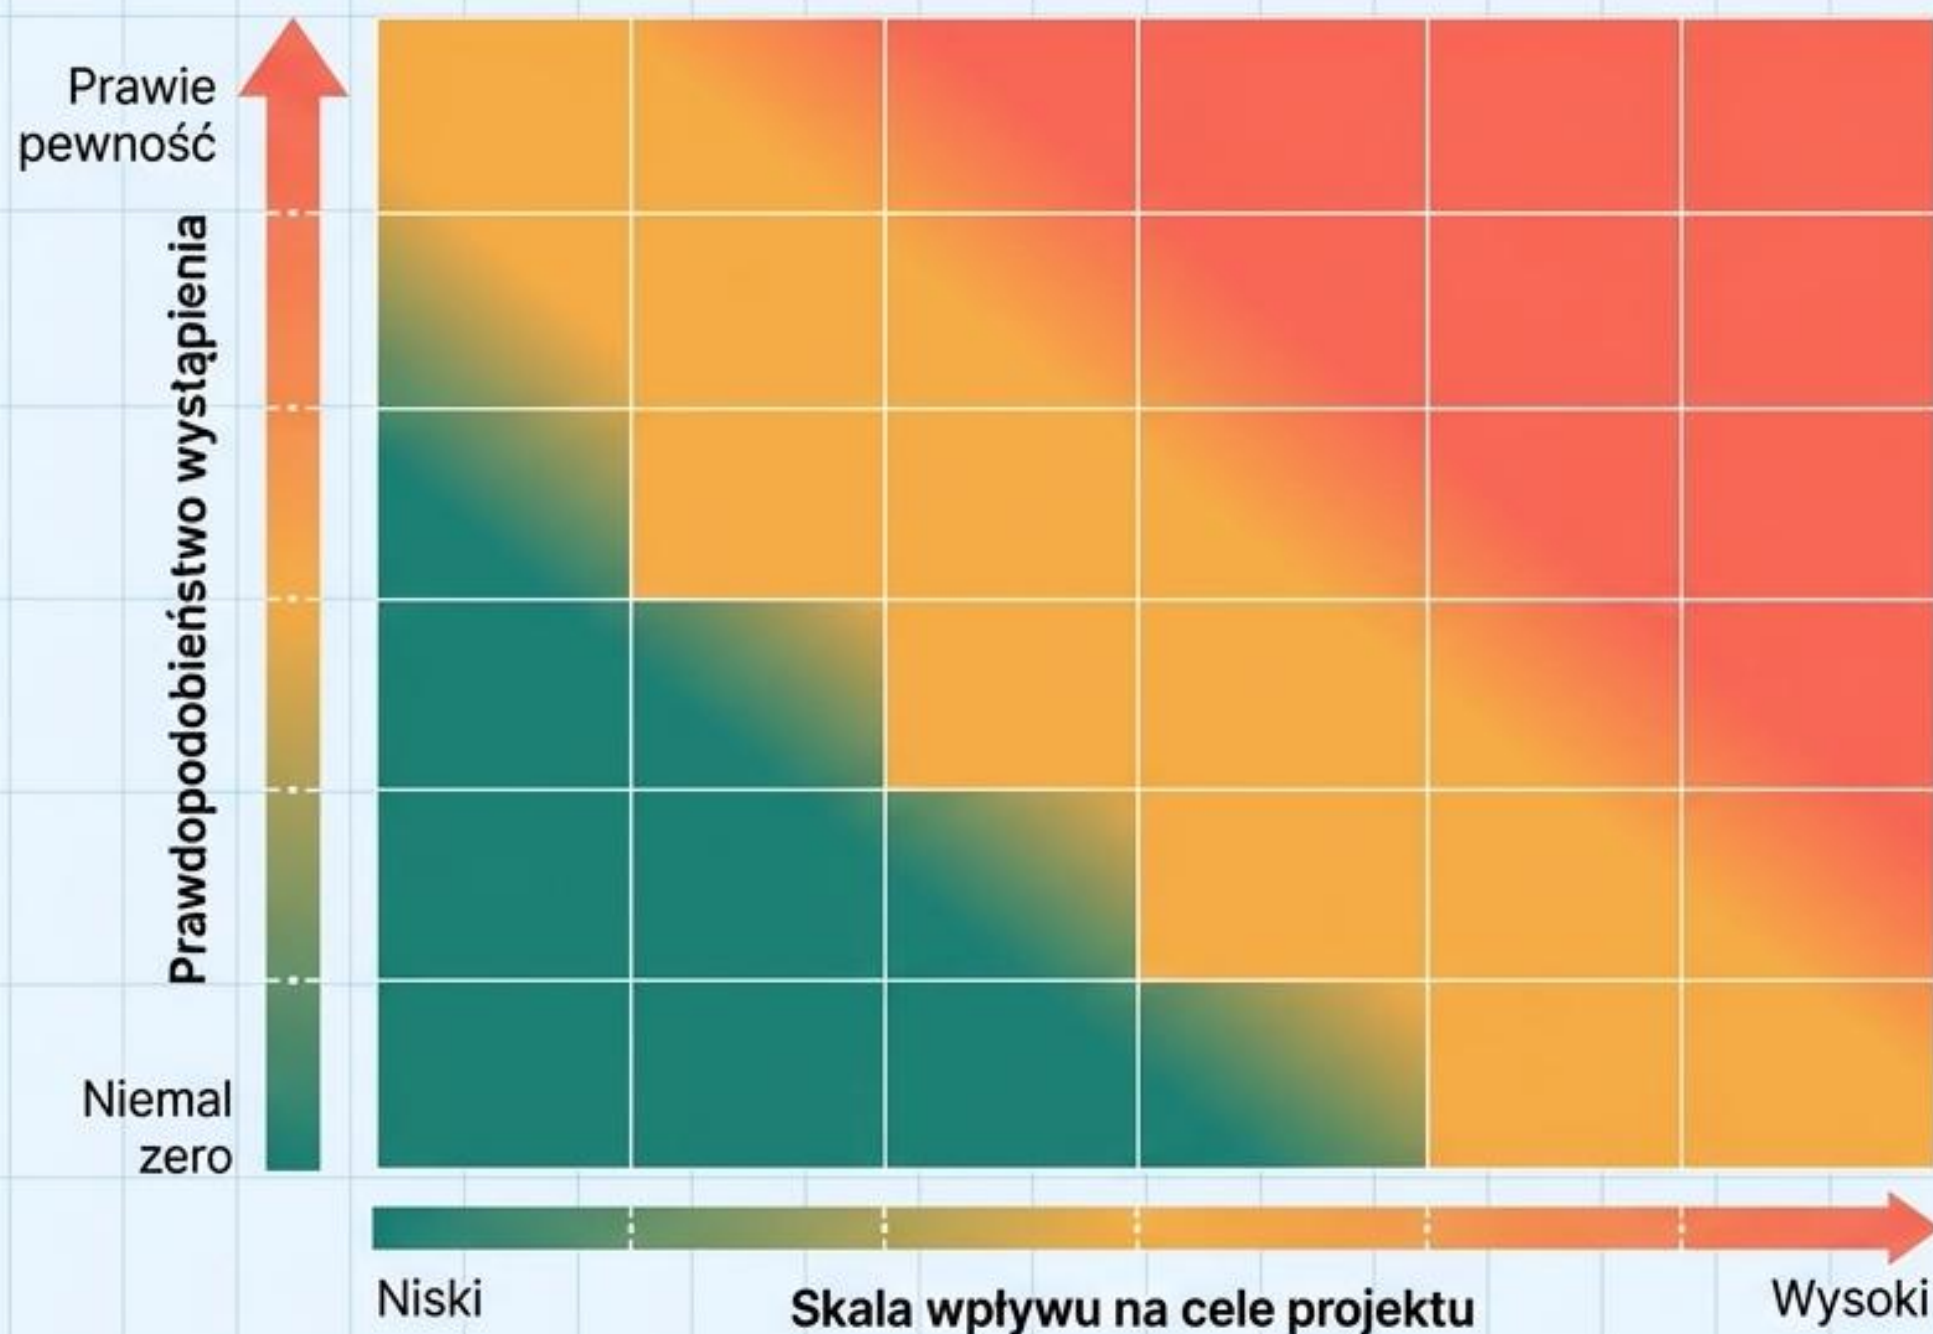

Wysoki priorytet: Wymaga natychmiastowego, szczegółowego planu reakcji.



Średni priorytet: Monitorowanie i rezerwy awaryjne.




Niski priorytet: Akceptacja, wpis na listę obserwacyjną (Watchlist).

Strategic Note

Ważne! Definiujesz zasady i kształt tej macierzy teraz (w procesie Planowania), aby dostarczyć zespołowi obiektywną linijkę do oceny ryzyka w późniejszych fazach projektu.

Proces 2: Identyfikacja Ryzyka

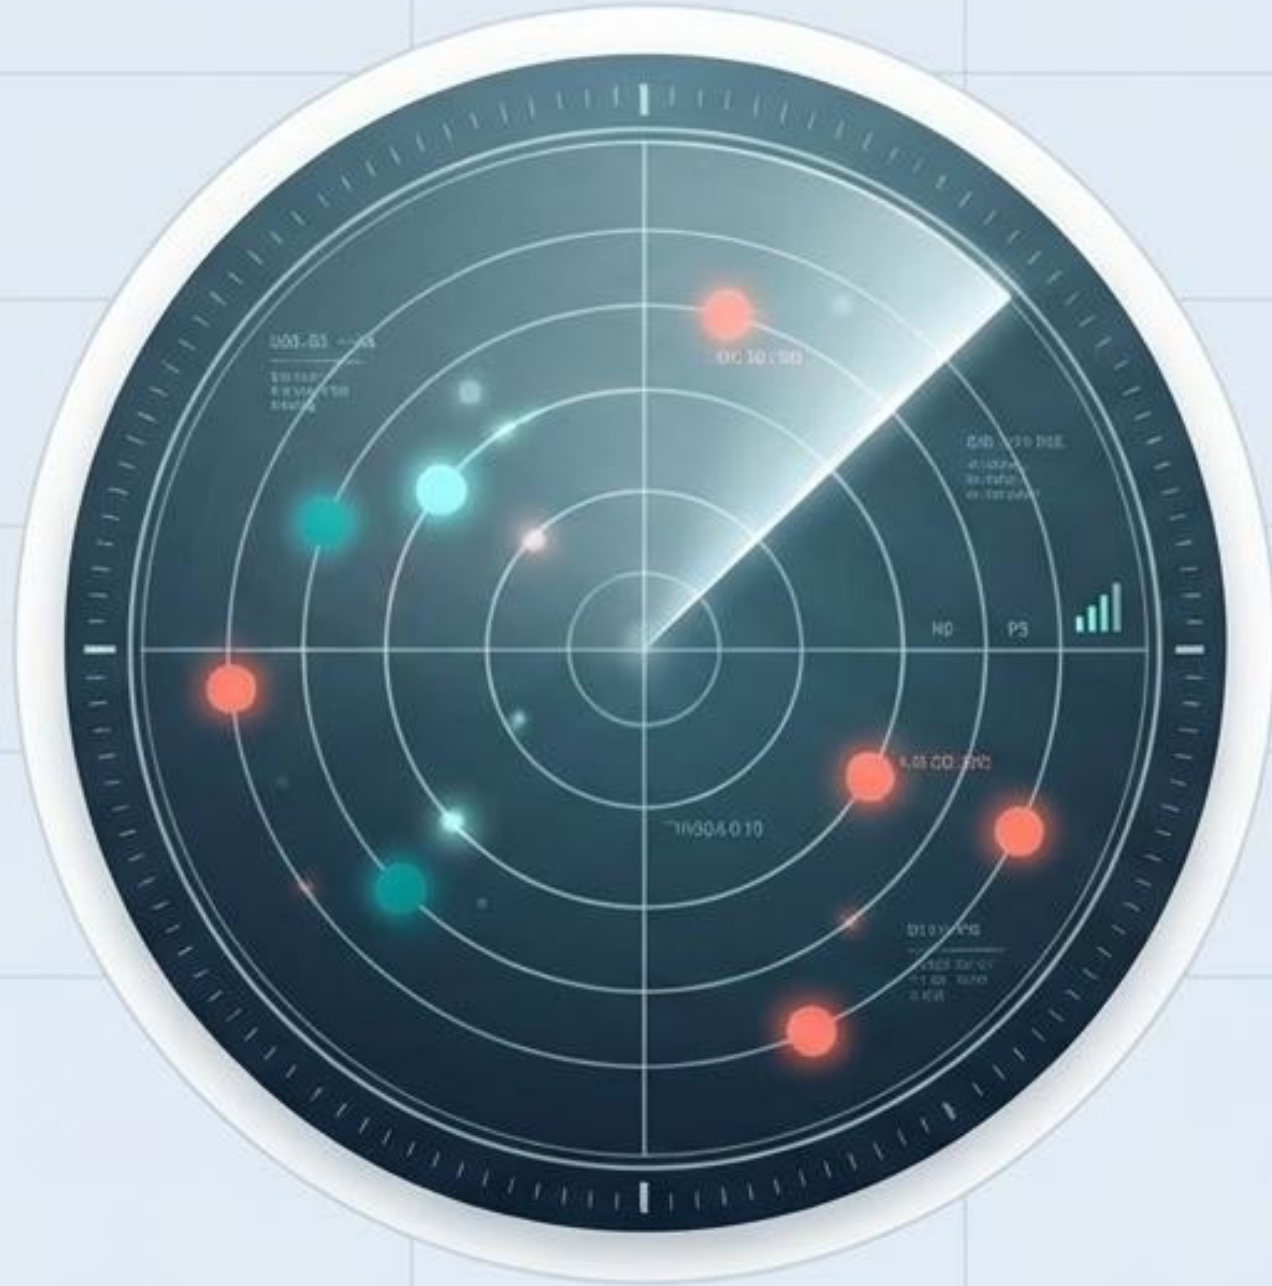

Cel

Znalezienie, rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich potencjalnych zdarzeń ryzykownych oraz ich cech charakterystycznych.

Proces Iteracyjny

Ryzyka pojawiają się i znikają wraz z postępem projektu. Zespół musi nieustannie skanować otoczenie.

Zasada »Wszyscy na pokład«

W identyfikację zaangażowani są członkowie zespołu, interesariusze, eksperci merytoryczni (SME), a nawet użytkownicy końcowi.

Polowanie na Ryzyko: Gdzie szukać wskazówek?

Bazowe Plany



Plan zarządzania kosztami, harmonogramem i jakością. (Zła jakość to generowanie ryzyka).

Dokumentacja Projektowa



Rejestr interesariuszy, Szacunki kosztów i czasu trwania aktywności, Dokumenty zaopatrzeniowe.

Źródła

Zmienne Środowisko




Bazy danych branżowych, badania, rejestry historyczne (EEF i OPA).

Założenia Projektowe



Uwaga: Rzeczy uznawane za prawdziwe dzisiaj mogą ulec zmianie jutro. Każda zmiana założenia to nowe ryzyko!

Cykl Życia Ryzyka: Ciągła Kalibracja

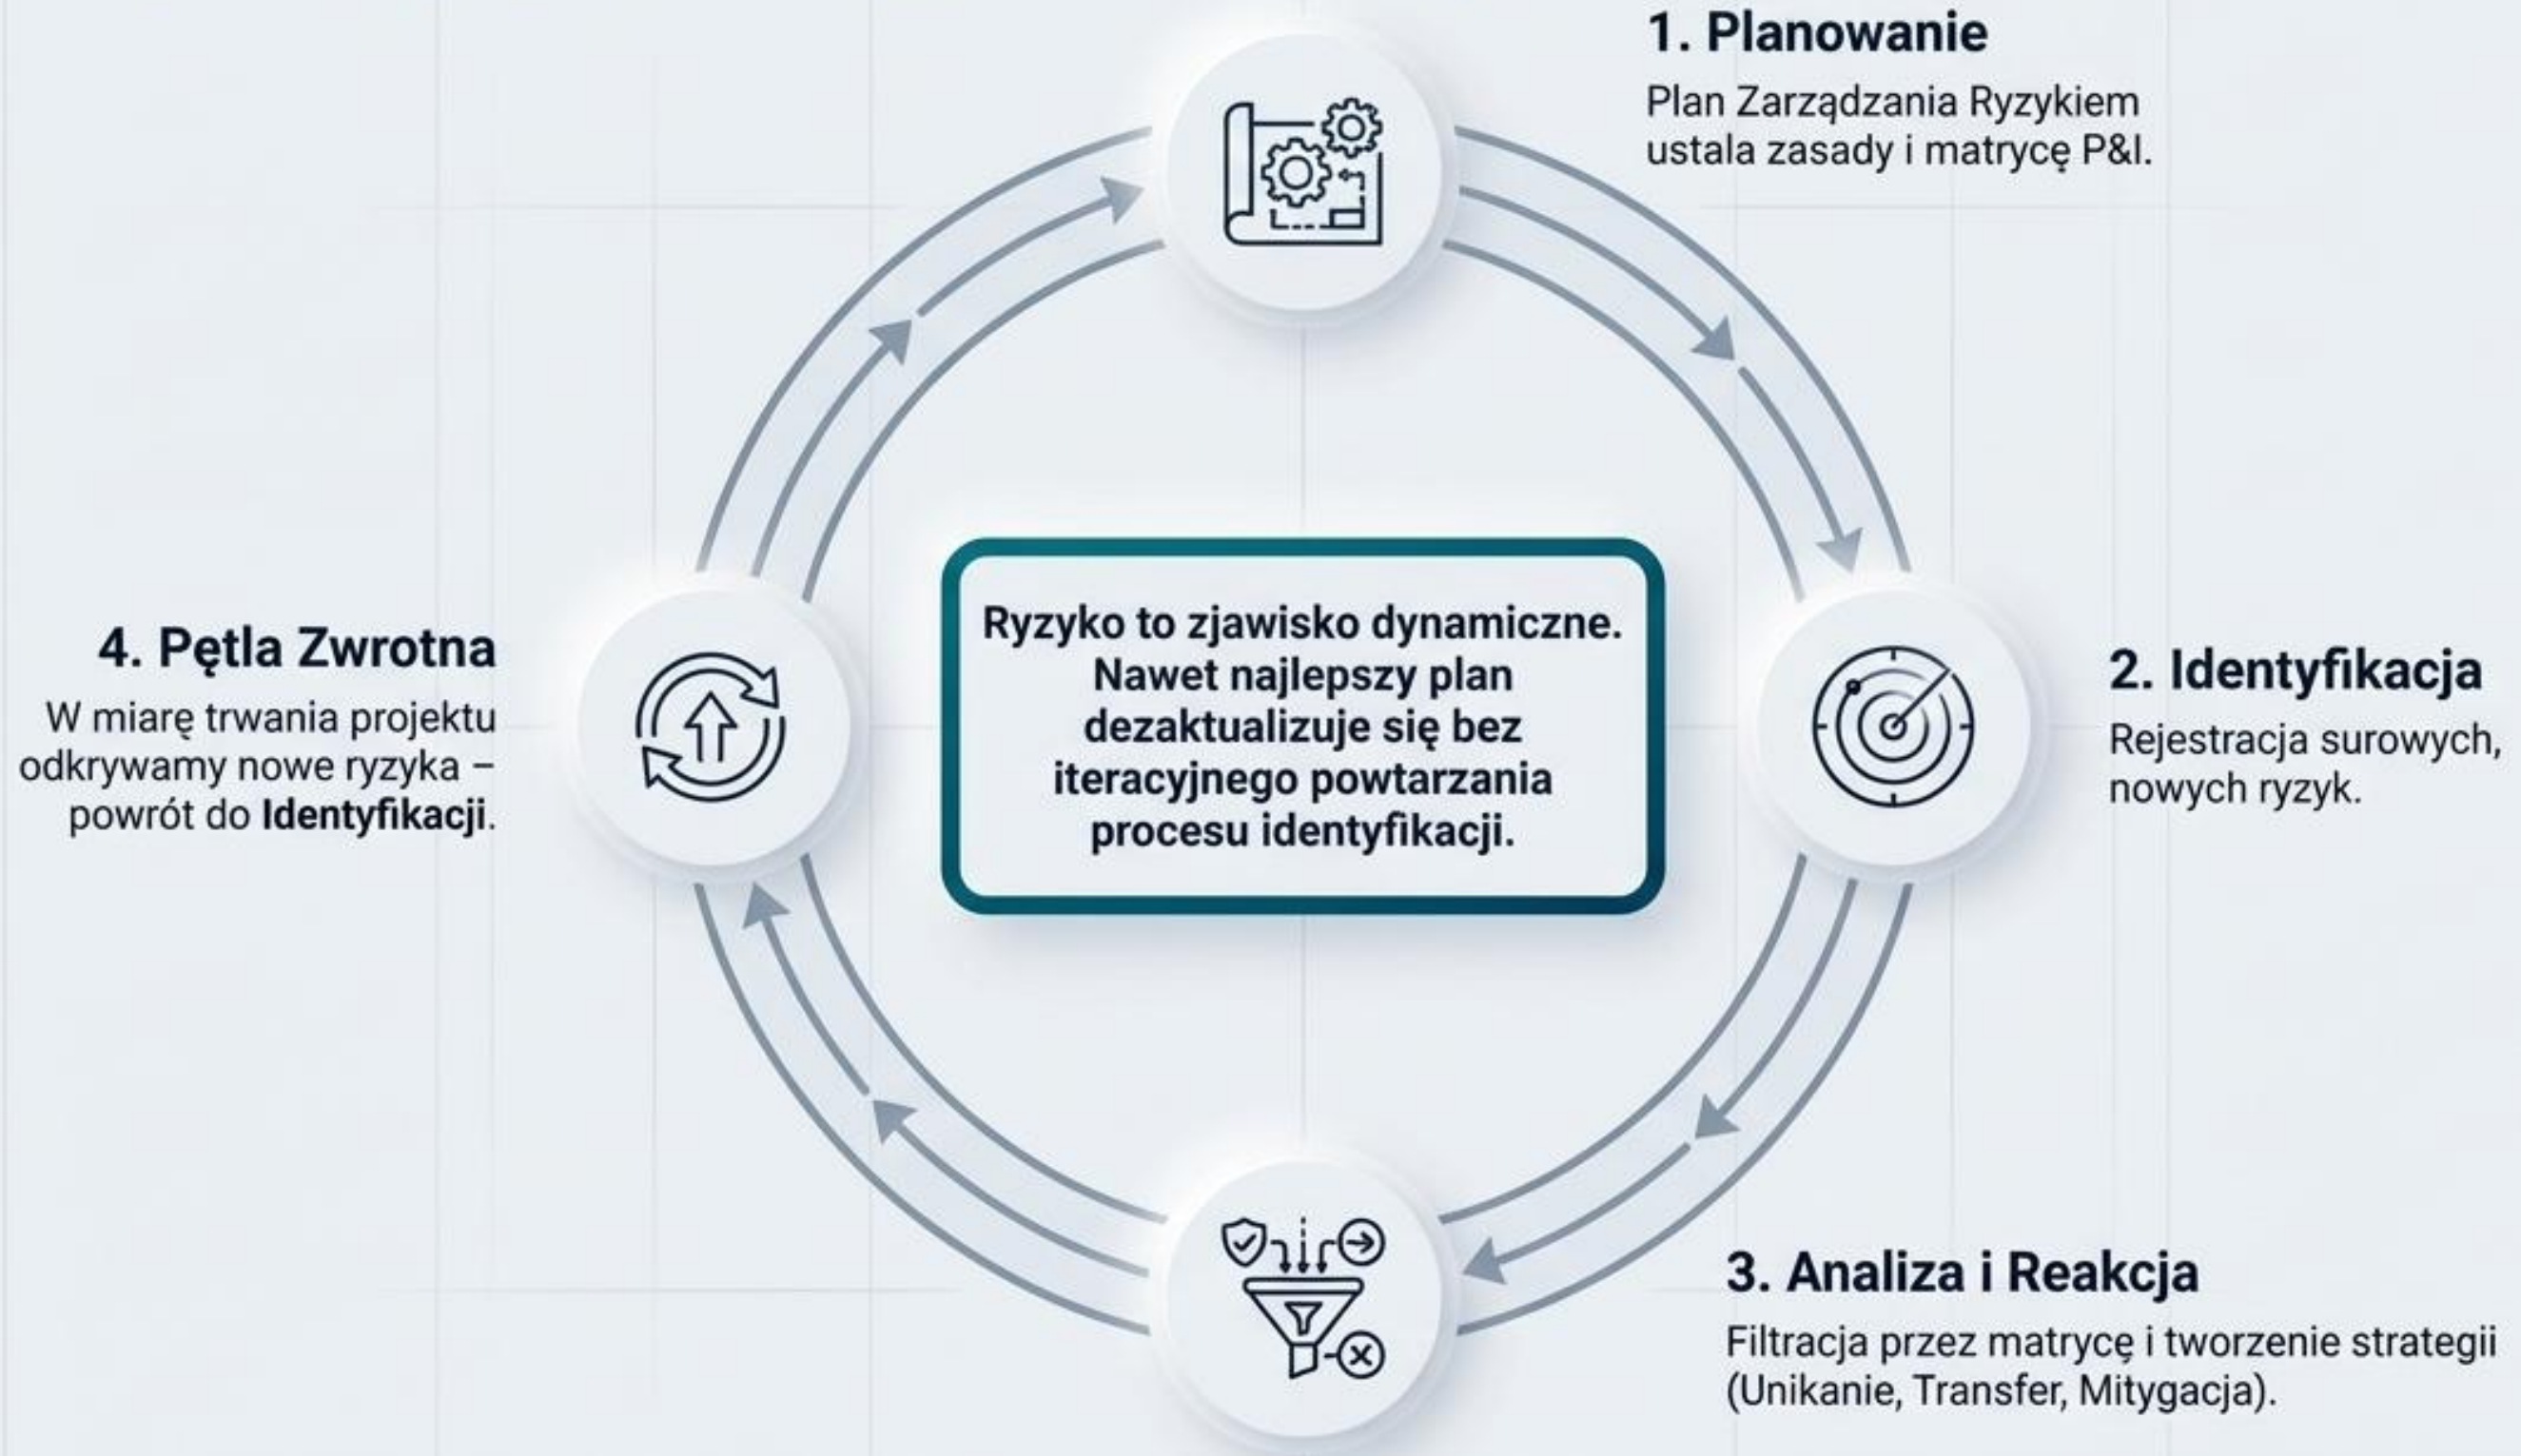

Podsumowanie Stratega



Największym ryzykiem w zarządzaniu projektem jest ignorowanie faktu, że ryzyko istnieje zawsze. Skuteczne planowanie nie eliminuje niepewności – ono daje nam instrumenty, by nią sterować.

Opracowanie:
dr Zbigniew Galar

Zgodność z:
PMBOK® Guide

**Zarządzaj ryzykiem, zanim ono
zacznie zarządzać Twoim projektem.**
