

Certyfikat PMP: Mitygacja ryzyka

Przewodnik po strategiach
reagowania na ryzyko

dr Zbigniew Galar

Kontekst: Miejsce mitygacji w cyklu życia projektu



Reakcja musi być proporcjonalna do zagrożenia. Opracowywanie planów dla ryzyk o niskim wpływie to marnowanie czasu i budżetu zespołu. Nie wydawaj na reakcję więcej, niż kosztowałby sam skutek ryzyka.

Oparte na macierzy prawdopodobieństwa i wpływu oraz liście priorytetów z analizy ilościowej.

Anatomia Rejestru Ryzyk

Zagrożony element WBS:
Konkretny obszar projektu
objęty ryzykiem.

Przyczyna źródłowa:
Fundamentalny powód
wystąpienia ryzyka.

Właściciel ryzyka: Konkretna
osoba odpowiedzialna za
egzekucję planu.

Ustalona strategia:
Wybrana reakcja (np. Unikanie,
Transfer).

Poziom ufności (Confidence
Level): Np. 0.85 – 85%
pewności dotrzymania
terminu lub budżetu
bazowego.

Rezerwy awaryjne:
Budżet lub czas odłożony
na wypadek
materializacji.

Karta Ryzyka #A47 - [Tytuł Ryzyka]

Wskaźnik Zagrożenia

Element WBS:

2.1.3 - [Nazwa Modułu]

Przyczyna:

Złożoność technologiczna integracji

ID Ryzyka:

R-23

Status:

Otwarty

Kategoria:

Techniczne

Postęp Mitygacji:

45%

Właściciel:

J. Kowalski (Kierownik Zespołu)

Strategia:

Unikanie (Zmiana dostawcy)

Wpływ:

Wysoki (Amber)

Prawdopodobieństwo:

Średnie (Amber)

Koszt Szacowany:

50,000 PLN

Poziom Ufności:

0.85 (85%)

Rezerwy Awaryjne:

15,000 PLN / 10 dni

Strategie dla Zagrożeń: Macierz Decyzyjna



Unikanie (Avoid)

Całkowita eliminacja przyczyny lub zmiana planu projektu, aby ominąć zagrożenie.



Transfer

Przeniesienie ryzyka i jego skutków na stronę trzecią.



Łagodzenie (Mitigate)

Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia lub wpływu do akceptowalnego poziomu.



Akceptacja (Accept)

Brak działań prewencyjnych; przyjęcie skutków, jeśli ryzyko wystąpi.

Unikanie vs. Łagodzenie: Gdzie leży różnica?



Unikanie


Zmiana zakresu lub harmonogramu.
Ryzyko jest całkowicie wyeliminowane.
Przykład: Zmiana trasy podróży, aby ominąć znane roboty drogowe.



Łagodzenie

Działania prewencyjne. Ryzyko nadal istnieje, ale jest mniej groźne.
Przykład: Przeprowadzenie dodatkowych testów systemu lub stworzenie prototypu przed pełnym wdrożeniem.

Przeniesienie Ryzyka (Transfer): Kto ponosi koszt?

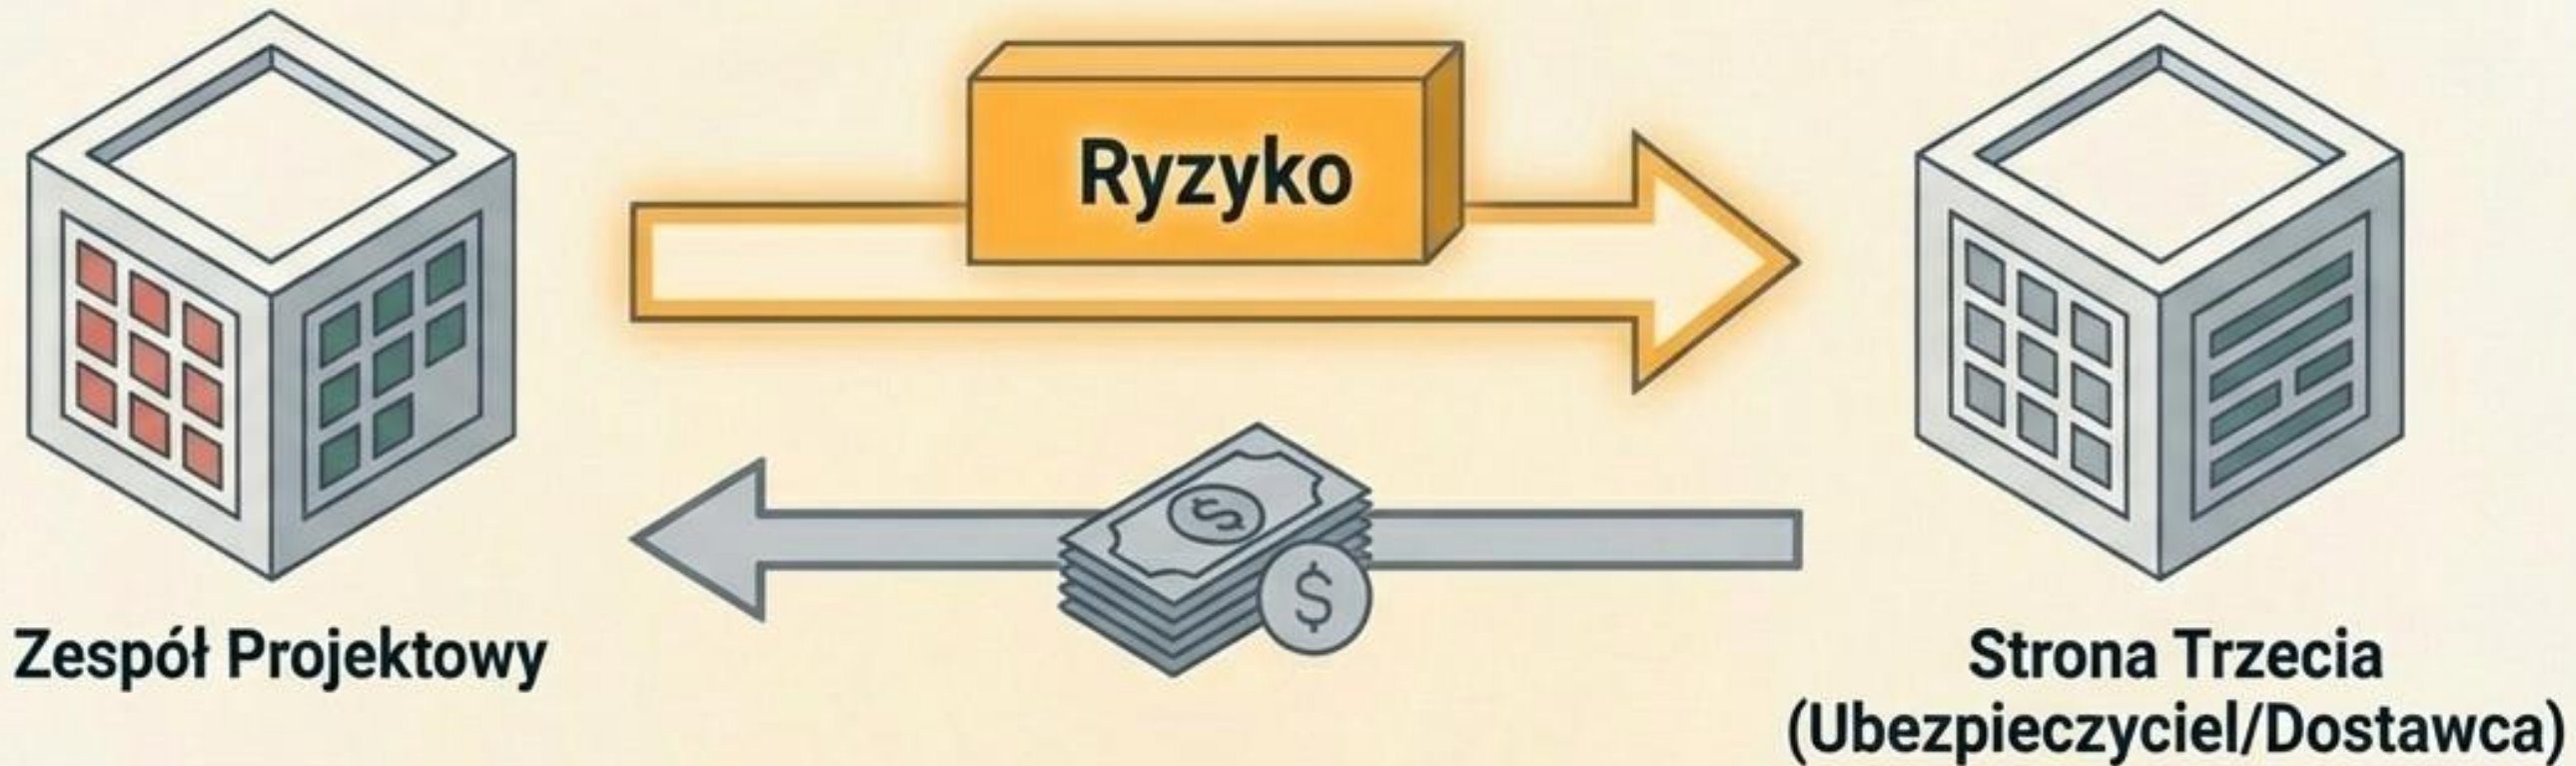

Mechanizm

Ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia lub kontrakty (np. Fixed-Price Contract wymusza wzięcie ryzyka przez dostawcę).

Koszt

Strony trzecie żądają premii za przejęcie ryzyka. Koszt ten musi być uwzględniony w estymacjach budżetowych.


Złota zasada

Transfer nie leczy ryzyka, jedynie zmienia jego właściciela.

Dwie Twarze Akceptacji



Strategie dla Szans: Zarządzanie Pozytywnym Ryzykiem

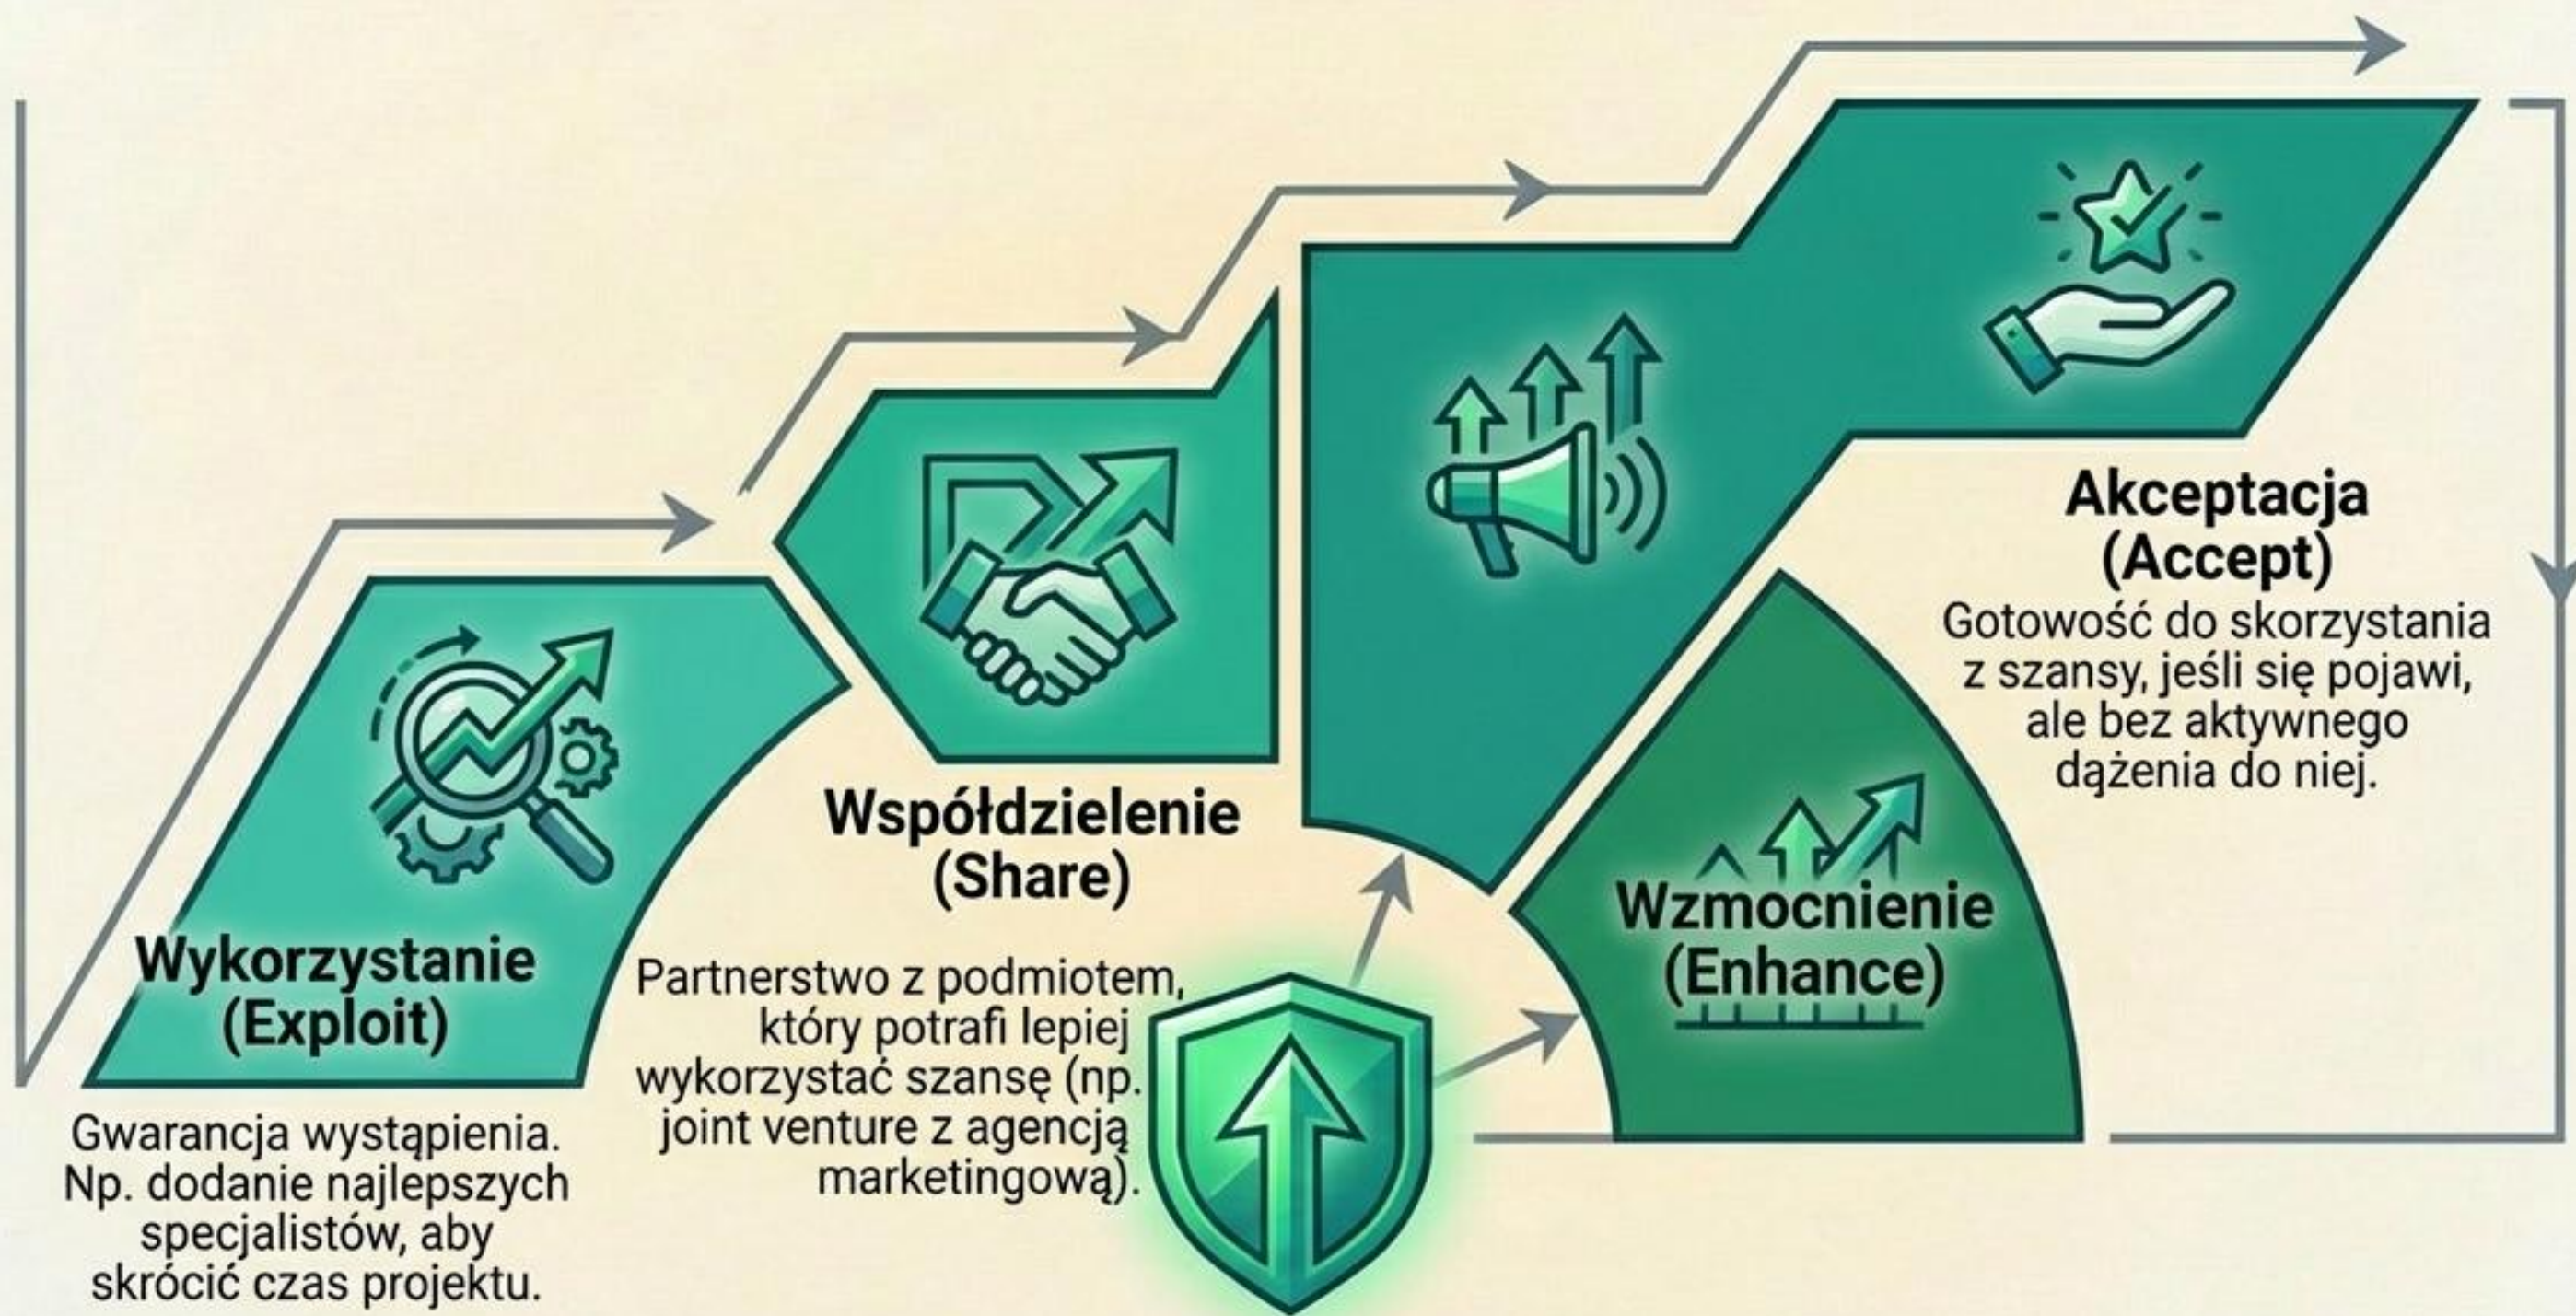

Wzmacnianie a Współdzielenie Szans



Wzmocnienie (Wewnątrz organizacji)


Proaktywne ułatwianie wystąpienia szansy. Skupienie na identyfikacji przyczyn źródłowych i wzmacnianiu wskaźników (*triggerów*), które wyzwalają pozytywne ryzyko.



Współdzielenie (Na zewnątrz)

Oddanie części kontroli (i zysków) ekspertom zewnętrznym, którzy posiadają kompetencje, jakich brakuje zespołowi projektowemu, aby zmaksymalizować korzyści.

Plany Awaryjne (Contingency Planning)

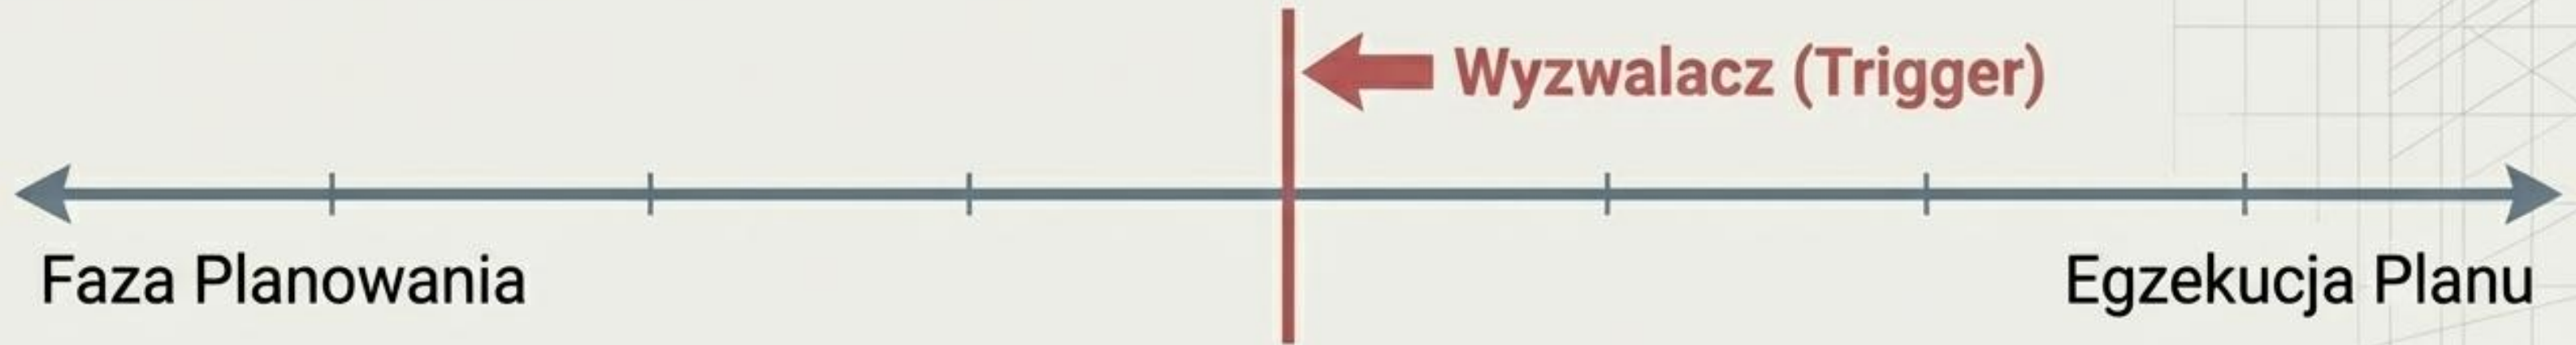

Plany awaryjne są budowane z wyprzedzeniem, ale uruchamiane tylko wtedy, gdy ryzyko się zmaterializuje.

Rezerwy awaryjne (Contingency Reserves)

Zabezpieczone środki finansowe lub bufory czasowe.




Wyzwalacze (Triggers)

Konkretne **zdarzenia** lub wskaźniki, które automatycznie uruchamiają plan awaryjny (np. opóźnienie dostawy przekracza 48 godzin).



Plany Rezerwowe: Siatka pod siatką

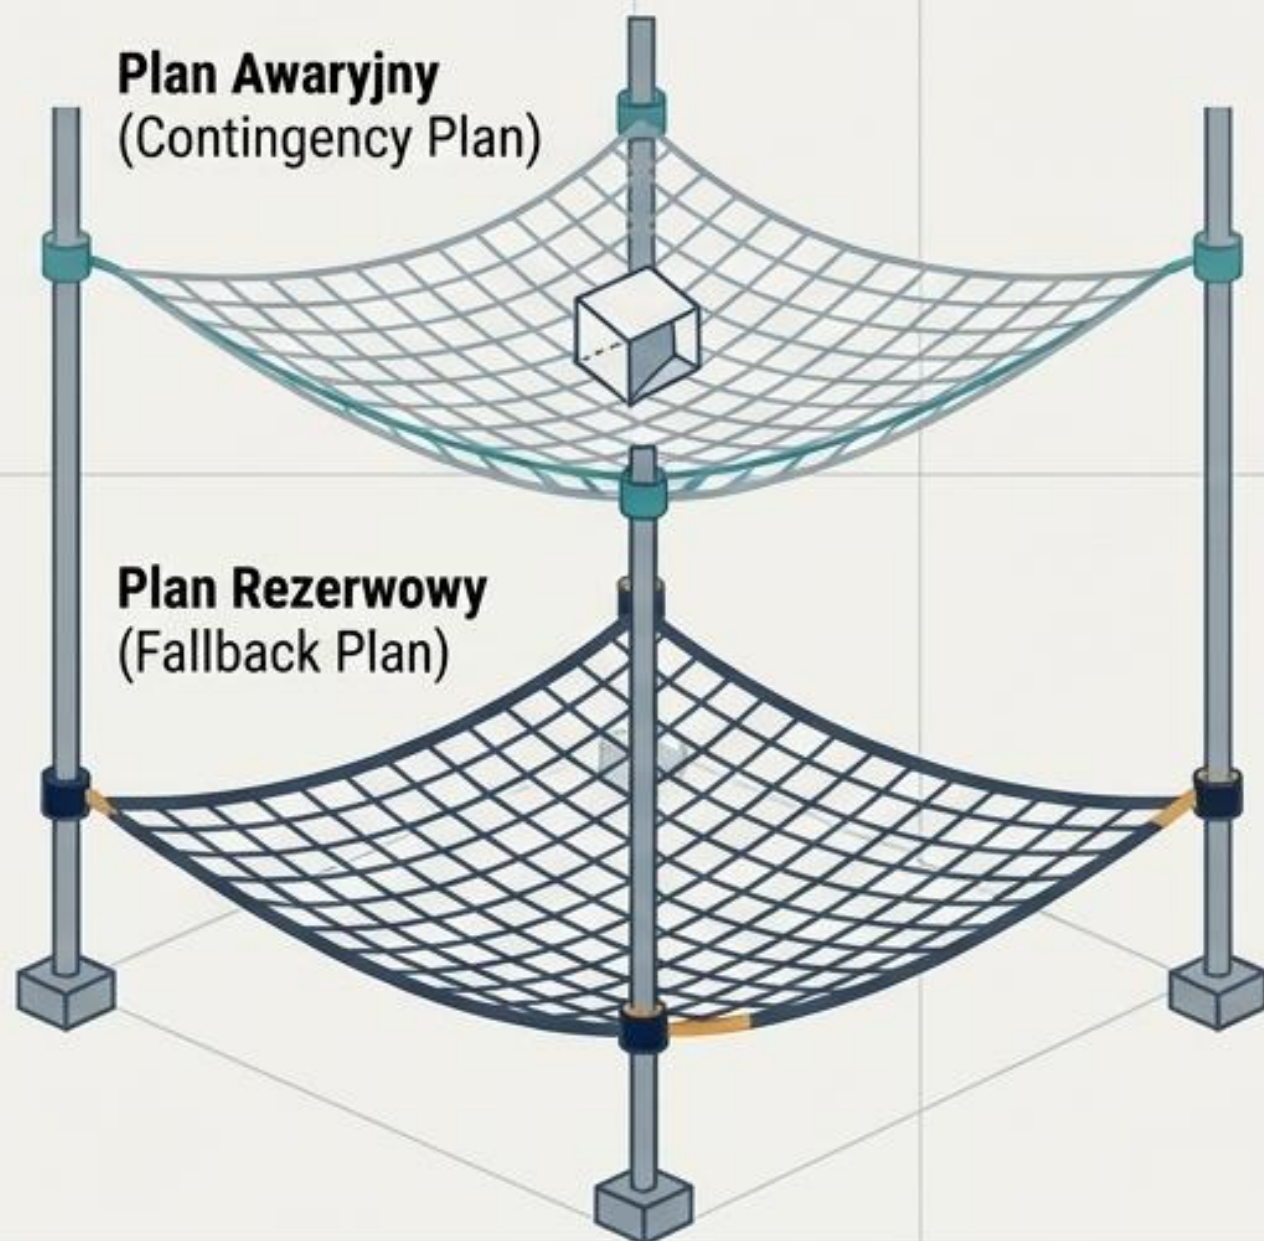

Opracowywane dla ryzyk o gigantycznym wpływie lub na wypadek, gdyby podstawowa strategia reakcji zawiodła.

Przykład z branży IT

- ⚠ - **Zagrożenie:** Awaria podczas aktualizacji systemu.
- ✓ - **Plan awaryjny:** Wezwanie wsparcia technicznego dostawcy w środku nocy.
- ✓ - **Plan rezerwowy:** Całkowite przywrócenie starego systemu (rollback), aby użytkownicy mogli pracować rano, podczas gdy zespół diagnozuje problem.

Efekty Uboczne: Ryzyka Wtórne i Resztkowe



Nowe zagrożenie stworzone bezpośrednio przez samą reakcję na ryzyko pierwotne.
Przykład: Wynajmujesz zewnętrznego kierowcę (Transfer), ale kierowca choruje i opóźnia podróż.



Drobne ryzyko, które "zostaje" po zastosowaniu mitygacji. Zazwyczaj jest objęte akceptacją i pokrywane z rezerw awaryjnych.

Przypadek Praktyczny: Rozbudowa Kitchen Heaven

Zagrożenie	Strategia	Działanie
Dostępność łącza T1	Łagodzenie	Zamówienie instalacji na wiele miesięcy przed terminem otwarcia.
Dostępność terminali POS	Transfer	Wymóg w kontrakcie – jeśli dostawca się spóźni, pokrywa koszty wynajmu sprzętu zastępczego.
Zła lokalizacja sklepu	Akceptacja (EMV: 780 000 USD)	Analiza oczekiwanej wartości pieniężnej wariantu (spadek rocznej sprzedaży z 2,5 mln do 1,2 mln USD); podjęto ryzyko przy 60% prawdopodobieństwie błędu.

Podsumowanie Strategii: Master Matrix

Strategia	Typ Ryzyka	Główny Cel	Mechanizm
Unikanie	Zagrożenie	Eliminacja	Zmiana planu/zakresu
Transfer	Zagrożenie	Przesunięcie	Ubezpieczenie/Kontrakt
Łagodzenie	Zagrożenie	Redukcja	Ograniczenie wpływu/prawdop.
Wykorzystanie	Szansa	Gwarancja	Zmiana planu w celu pewności
Współdzielenie	Szansa	Synergia	Partnerstwo (Joint Venture)
Wzmocnienie	Szansa	Zwiększenie	Monitorowanie i stymulowanie
Akceptacja	Oba	Reakcja	Rezerwy awaryjne (Aktywna) lub brak działań (Pasywna)



Złota Zasada PMBOK

Bądź przygotowany.

(Motto Skautów)

Zarządzanie ryzykiem musi być skalowalne do rozmiaru projektu. Ignorancja i podejście »czego nie wiem, to mnie nie zrani« to największe zagrożenie dla harmonogramu i budżetu. Zwykły akt identyfikacji i planowania natychmiast zmniejsza potencjalny wpływ katastrofy.
