


Certyfikat PMP: Planowanie zasobów projektu

Architektura procesu
zakupowego i zarządzanie
ryzykiem kontraktowym

dr Zbigniew Galar

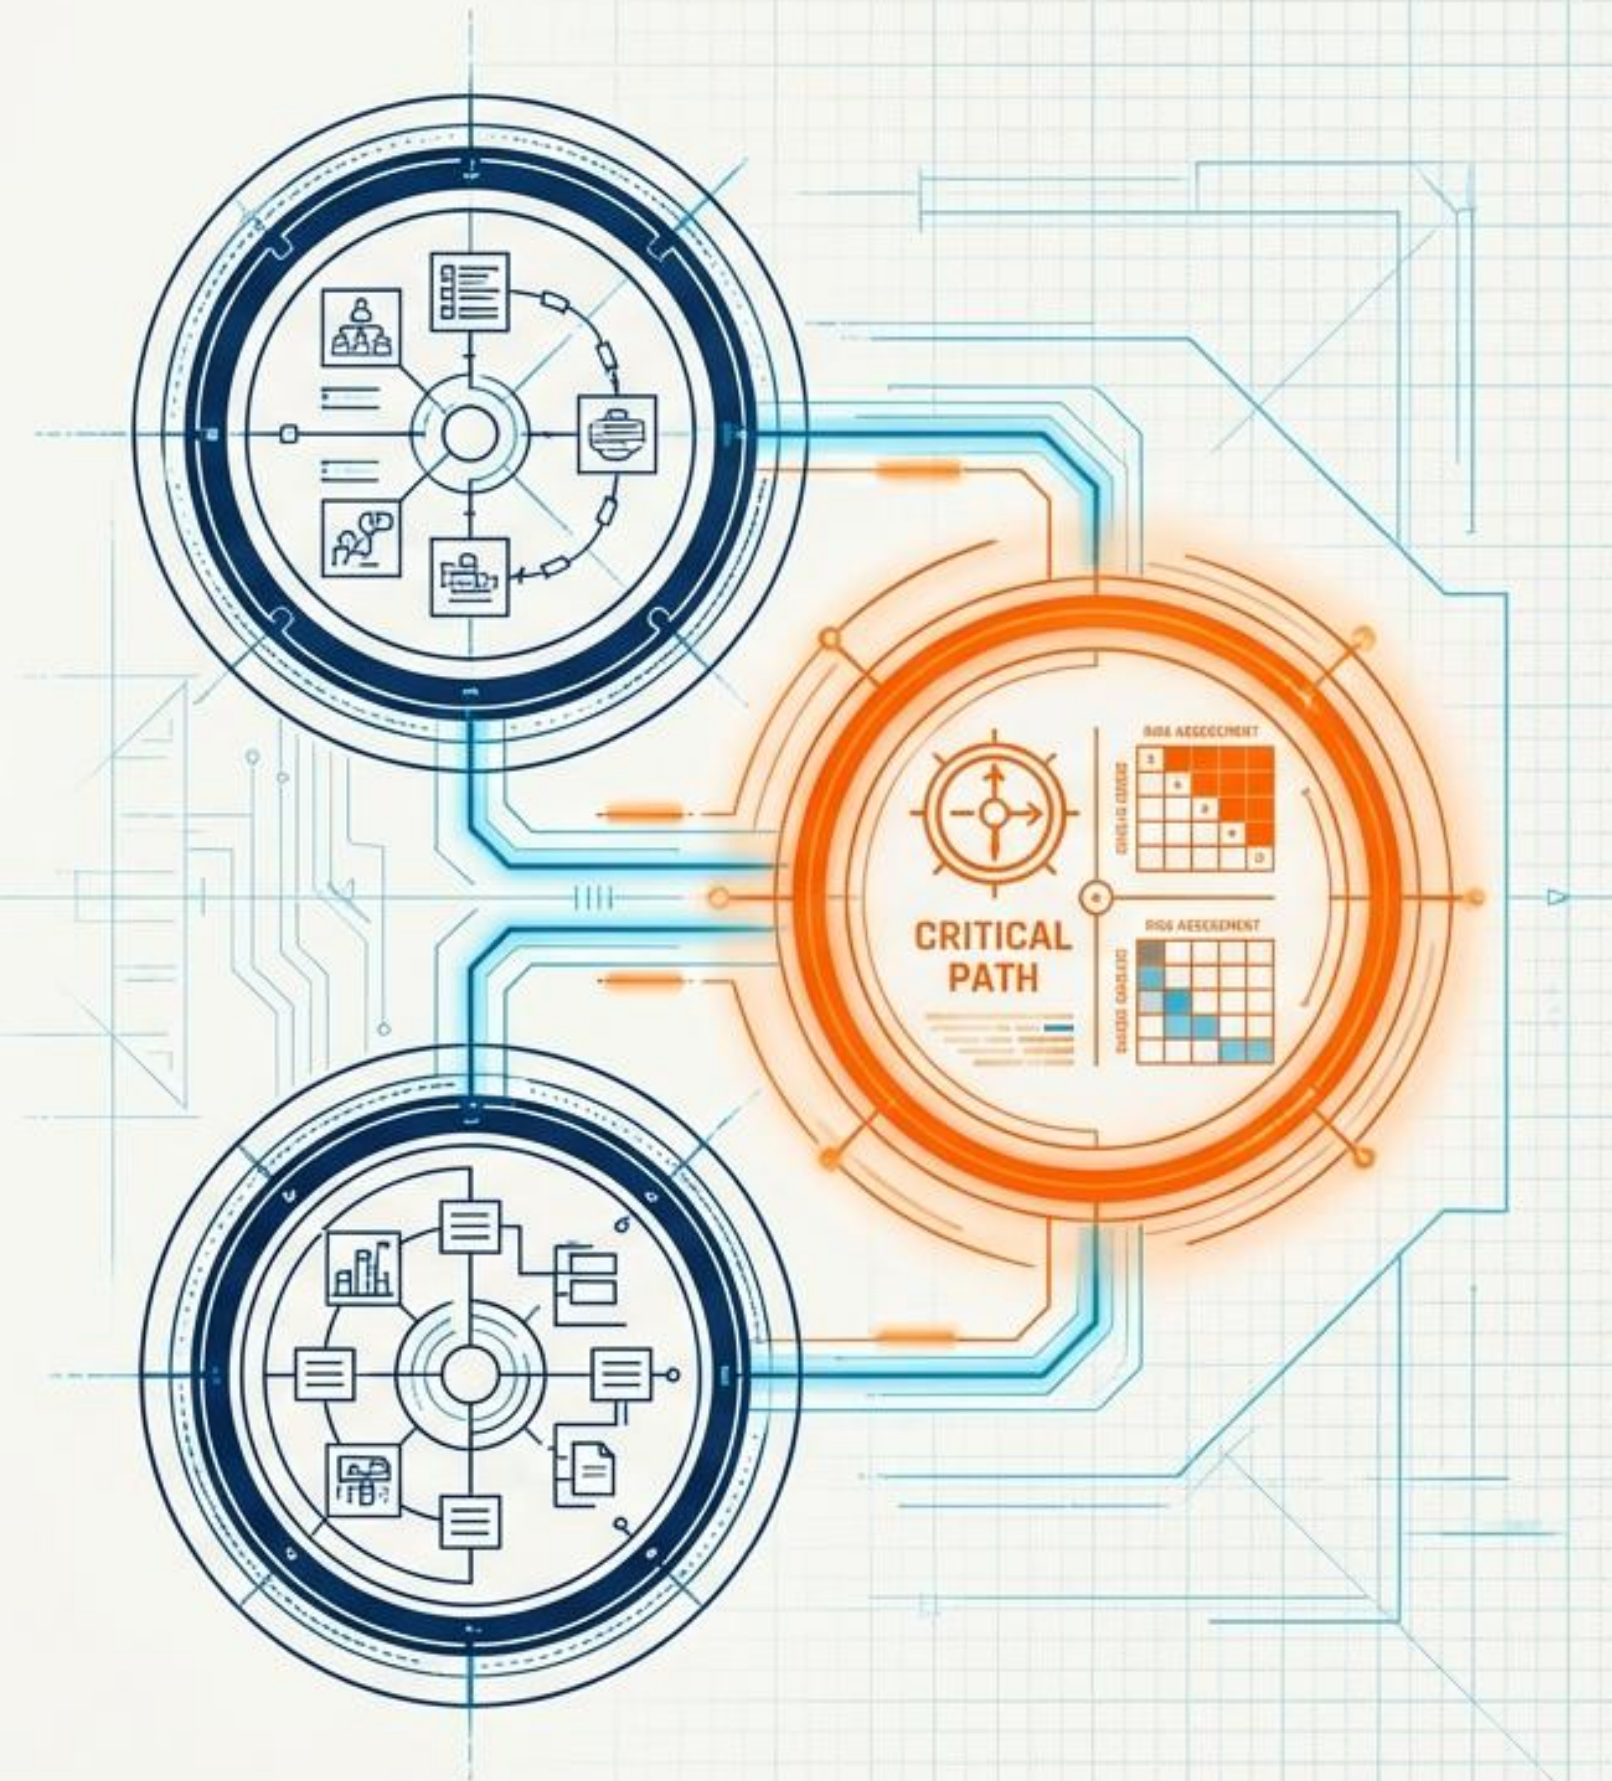

Fundament Planowania: Triada Zasobów Projektu

Przed ustaleniem harmonogramu i budżetu, kierownik projektu (PM) musi zdefiniować trzy kluczowe filary zasobów.



Procesy te są ze sobą powiązane. Dostępność zewnętrznych wykonawców bezpośrednio determinuje strukturę harmonogramu i budżetu.

Architektura Procesu Zakupowego (Plan Procurement Management)



Kategoryzacja Danych Wejściowych: Baza Wiedzy PM-a

Dane Bazowe (Ograniczenia Projektu)



- Plan zarządzania projektem (Scope Baseline - WBS i kryteria akceptacji)
- **Harmonogram** projektu
- **Wymagania** zasobowe
- Szacunki kosztów

Ryzyko i Interesariusze (Ludzie i Zagrożenia)




- **Ryzyktr** ryzyk (np. zakup ubezpieczenia jako strategia transferu ryzyka)
- Rejestr interesariuszy
- Dokumentacja wymagań

Środowisko i Zasady (Reguły Gry)



- **Czynniki środowiskowe** (EEF): warunki rynkowe
- **Aktywa procesów** organizacyjnych (OPA): systemy kwalifikacji dostawców, polityki zakupowe

Nawigacja po Polityce Organizacyjnej: **Czynnik Krytyczny** (OPA/EEF)

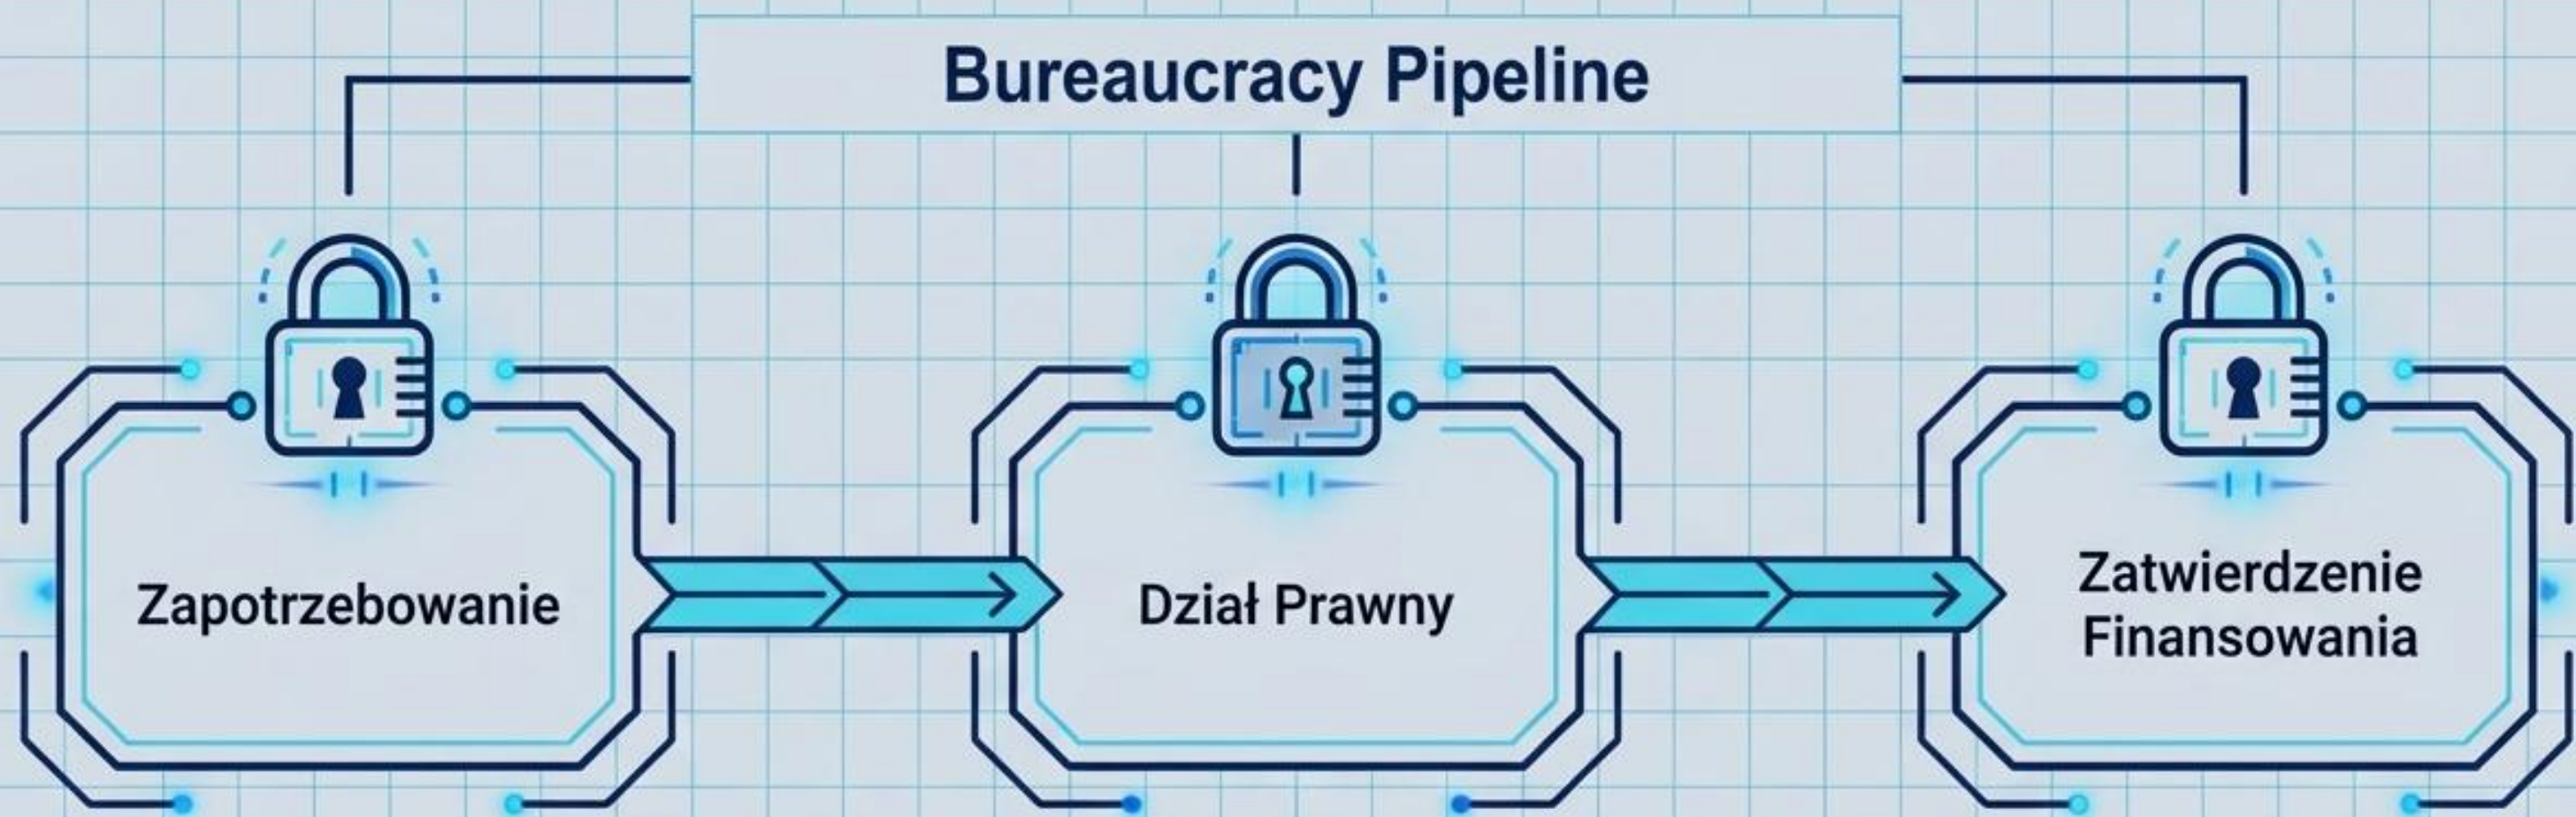


Złożoność Akceptacji: Wiele organizacji wymaga zgód dyrektorów finansowych, działów prawnych i zakupów. Błędy w formularzach mogą opóźnić projekt nawet o 1-2 lata.

Bramki Finansowania: Pieniądze często nie są przyznawane z góry (lump sum). Finansowanie uwalniane jest etapami po osiągnięciu kamieni milowych (milestones).

Ostrzeżenie PMBOK: Technika "Grzesz teraz, proś o wybaczenie później" w nagłych wypadkach nie jest autoryzowana przez PMI. Brak znajomości procedur gwarantuje opóźnienia harmonogramu.

Wyjątek Strukturalny: Umowy o Współpracy (Teaming Agreements)

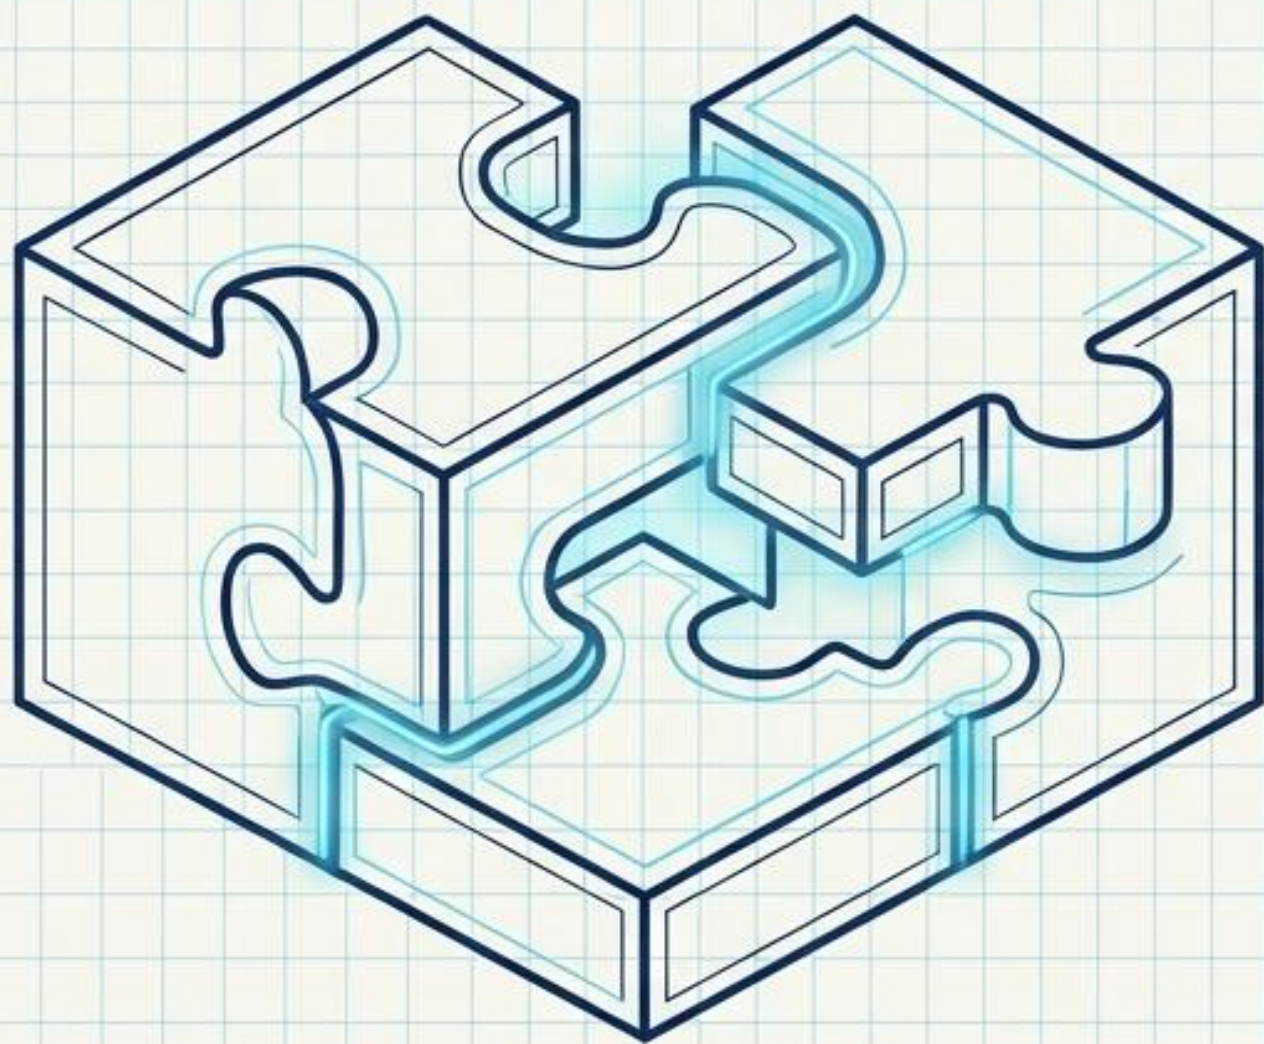


Definition Panel



Teaming agreements to umowy między stronami tworzącymi partnerstwo lub joint venture w celu wspólnej pracy nad projektem (np. konsorcjum dostawców).


Impact Box



- **Uwaga:** Nie są to oficjalne dane wejściowe (inputs) dla żadnego pojedynczego procesu, ale stanowią **wejście dla całej grupy procesów planowania** (Planning Process Group).
- **Skutek:** Z góry definiują zakres prac (scope of work), role kupującego i sprzedającego oraz wymogi konkurencji. Drastycznie zmieniają harmonogram, budżet i decyzje HR, zanim planowanie w ogóle się rozpocznie.

Narzędzie #1: Diagnostyka Make-or-Buy (Zrób to sam czy kup?)

Analiza efektywności kosztowej decydująca o strategii realizacji.

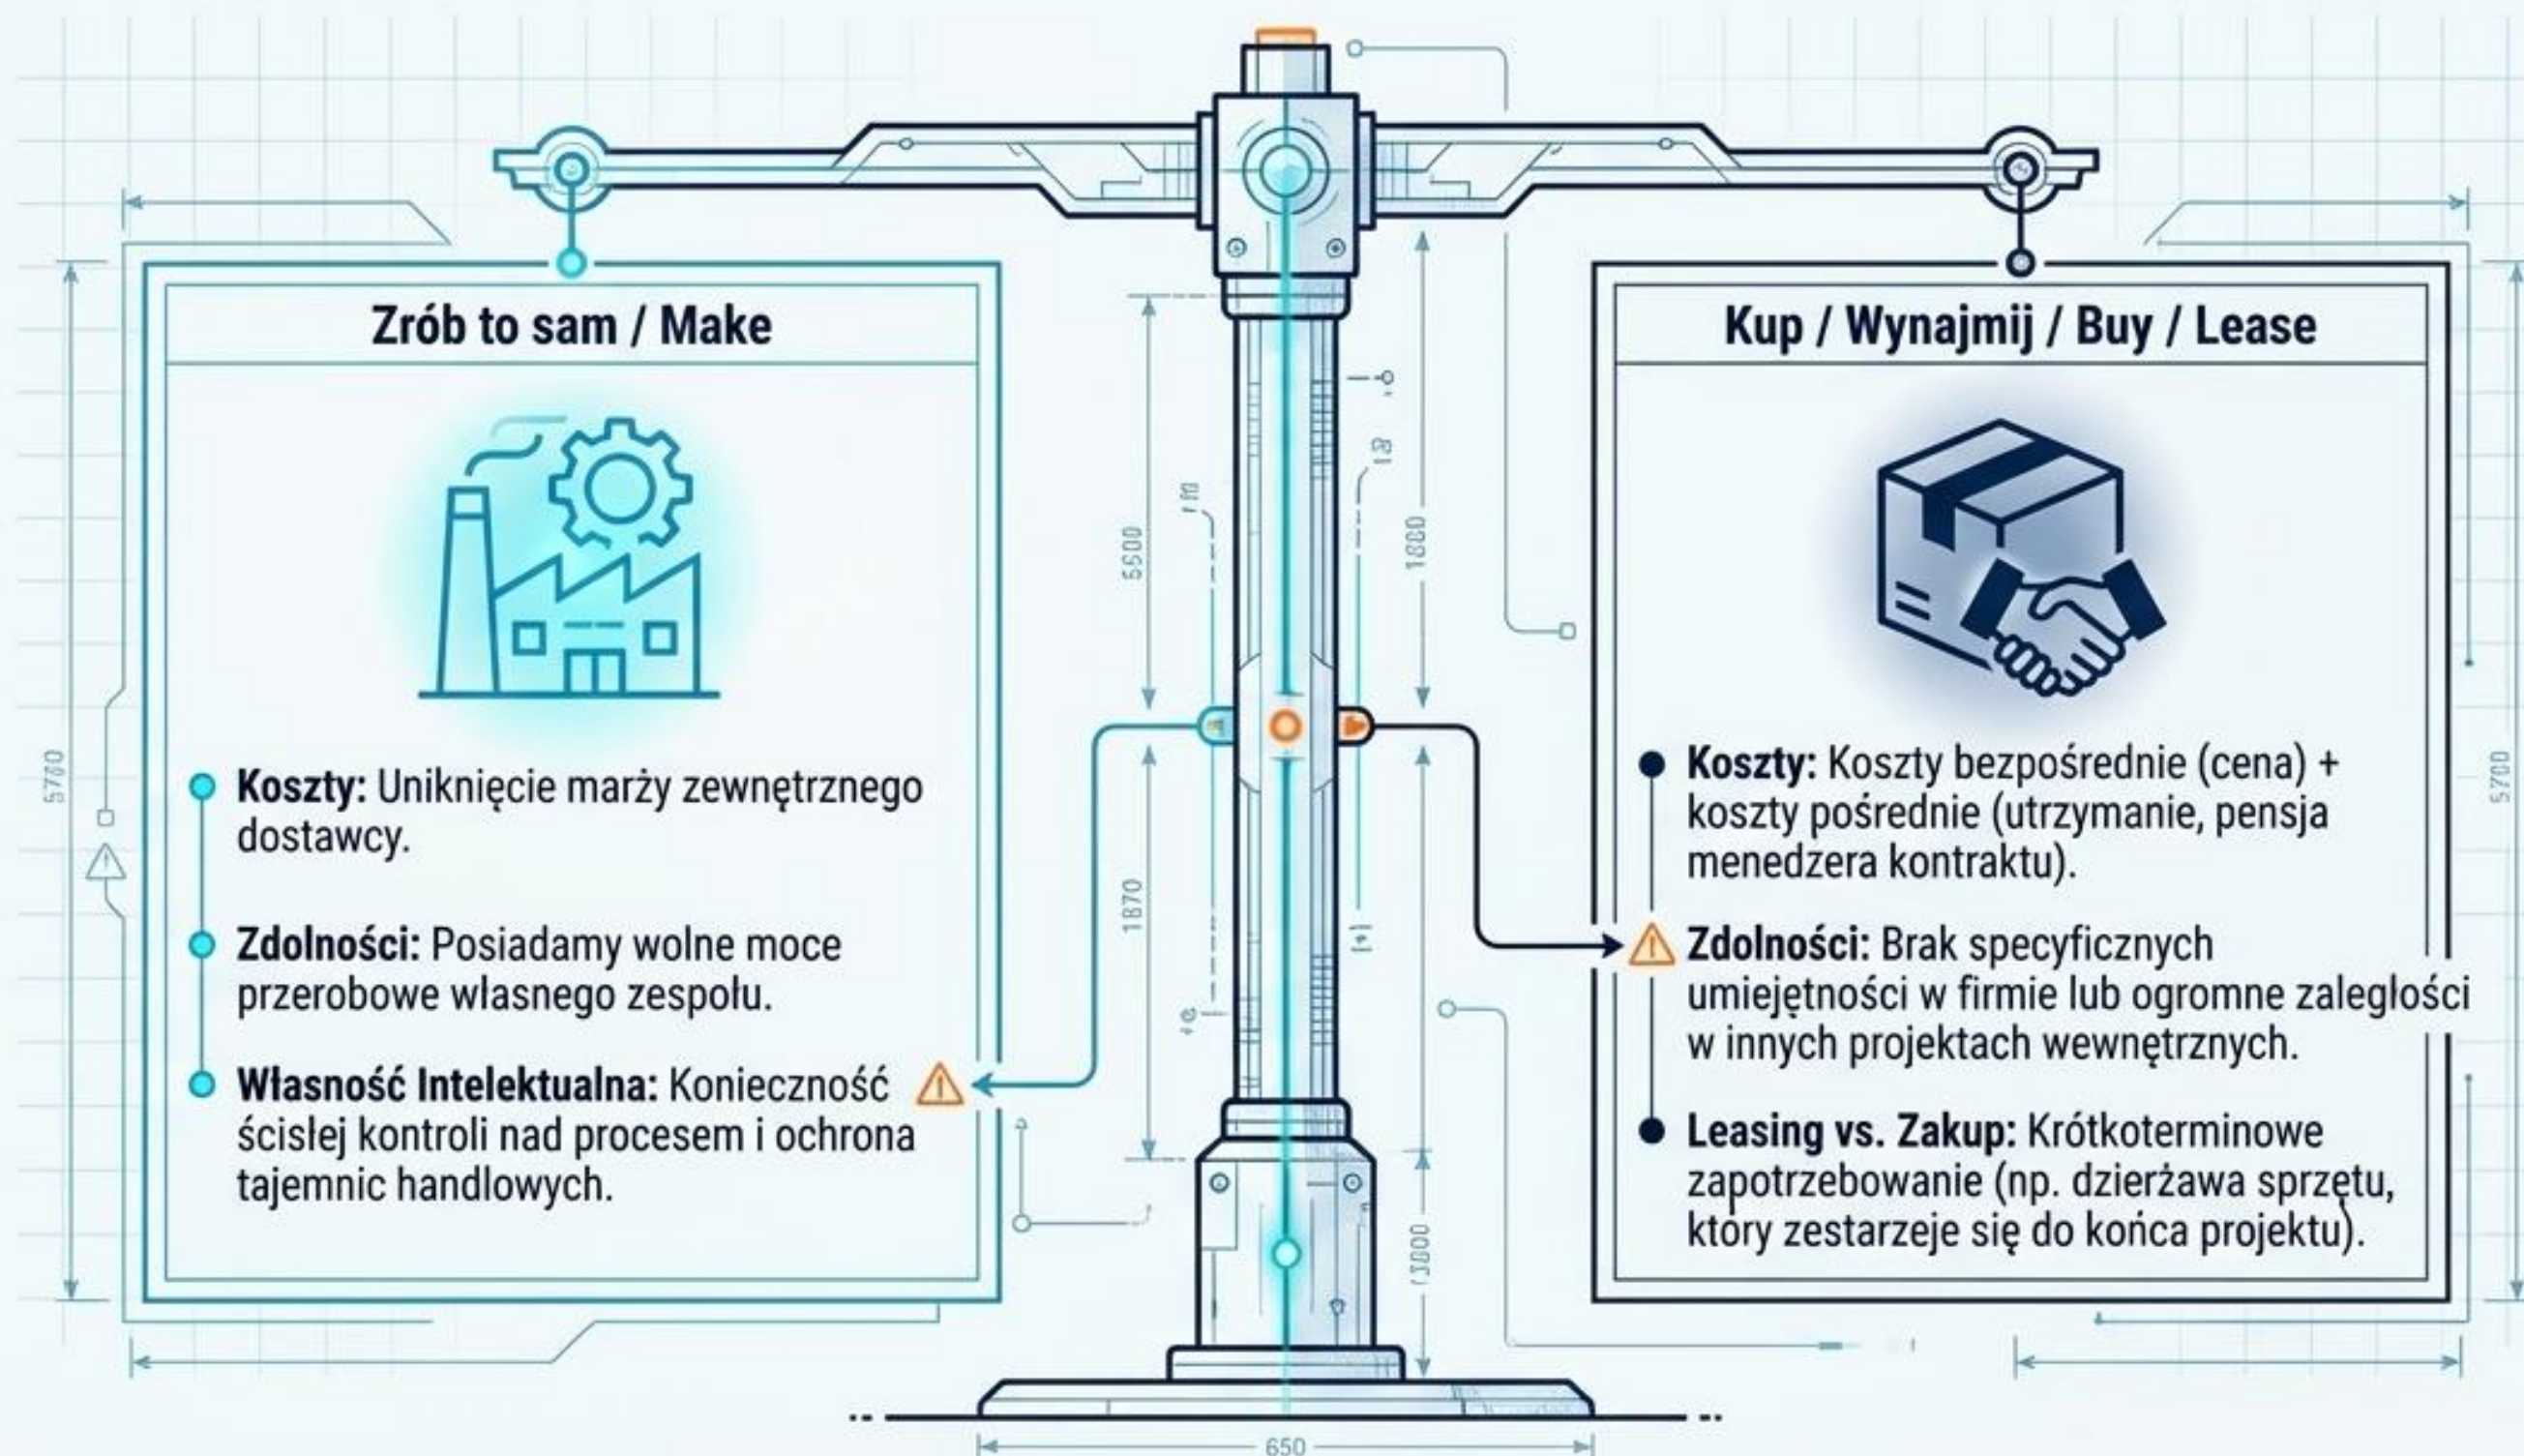

Narzędzie #2: Strategie Badań Rynkowych (Market Research)

Doświadczenie Branżowe

Weryfikacja udokumentowanych sukcesów w konkretnym typie projektu lub branży (np. przez wyszukiwarki i recenzje).



Kompetencje Zespołu

Ocena głębokości i szerokości wiedzy proponowanych przez dostawcę członków zespołu.



Stabilność Finansowa




Kondycja finansowa firmy jako zabezpieczenie przed upadłością w trakcie projektu (wymaga weryfikacji/wywiadów).



Obecność na Rynku

Wyszukiwanie nowych dostawców lub innowacyjnych usług (np. poprzez udział w konferencjach branżowych).

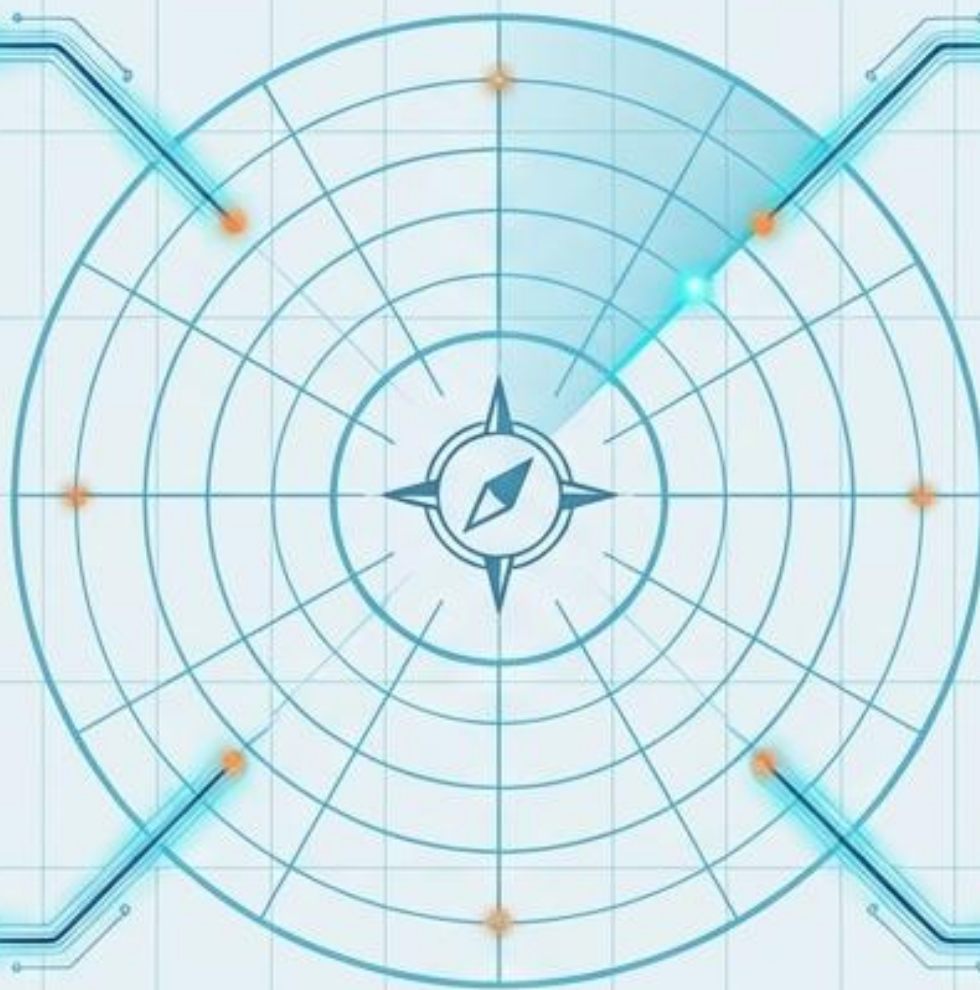

Ekosystem Kontraktów: Spektrum Alokacji Ryzyka

Głównym celem wyboru typu umowy jest dystrybucja ryzyka między Kupującym (Buyer) a Sprzedającym (Seller).



Dekonstrukcja: Kontrakty o Stałej Cenie (Fixed-Price)

Stosowane przy stabilnym, niezmiennym zakresie prac. Sprzedawca wlicza margines błędu w cenę, chroniąc się przed stratą.

FFP (Firm Fixed-Price)

Zasada: Jedna, z góry ustalona kwota. Cena nigdy nie rośnie.

Zagrożenie: Jeśli zakres nie jest jasny, kupujący płaci za kosztowne **Change Orders (Zlecenia Zmian)**. Najczęstszy typ kontraktu.



FPIF (Fixed-Price Incentive Fee)

Zasada: Stała cena + **Premia (Incentive)**.

Mechanika: Kupujący przejmuje **minimalne ryzyko**, oferując **bonus finansowy** za wcześniejsze ukończenie, niższe koszty lub lepsze parametry techniczne.



FP-EPA (Fixed-Price with Economic Price Adjustment)

Zasada: Projekty wieloletnie chronione przed **czynnikami zewnętrznymi**.

Mechanika: Koszty są waloryzowane o znany **indeks finansowy** (np. **wskaźnik inflacji**). Chroni obie strony kontraktu.



Dekonstrukcja: Kontrakty Kosztowe i T&M

Kontrakty Kosztowe (Cost-Reimbursable)

Zwracane są wszystkie udokumentowane koszty + opłata za wykonanie. Zmiany zakresu są łatwe, ale kosztowne.

⚠ Ryzyko Kupującego



Czas i Materiały (T&M - Time and Materials)

Hybryda. Stawki jednostkowe (np. 150\$/h programisty) są z góry ustalone, ale całkowity czas/ilość nie są znane na początku. Idealne dla szybkiego uruchomienia specyficznych ról HR.



Wyjście (Output): Plan Zarządzania Zakupami

Context Box

Przypadek użycia:
Firma deweloperska.

PM tworzy
ustandaryzowany szablon
Planu Zakupów dla
kierowników budów,
eliminując powtarzalną
pracę.

Procurement Management Plan

- **Reguły Kontraktowe:** Materiały budowlane = **FFP**.
Zewnętrzny personel = **T&M** (z limitem '**not to exceed**').



- **Autoryzacja:** Kto ma uprawnienia do zatwierdzania zakupów.



- **Integracja z Harmonogramem:** Synchronizacja czasów dostaw
z planem całego projektu.



- **Zarządzanie Zewnętrzne:** Jak koordynować wielu dostawców
jednocześnie.



- **Standaryzacja:** Lokalizacja firmowych szablonów umów i listy
prekwalifikowanych dostawców.



Plan Zarządzania Zakupami staje się kluczowym komponentem nadrzędnego Planu Zarządzania Projektem.
