



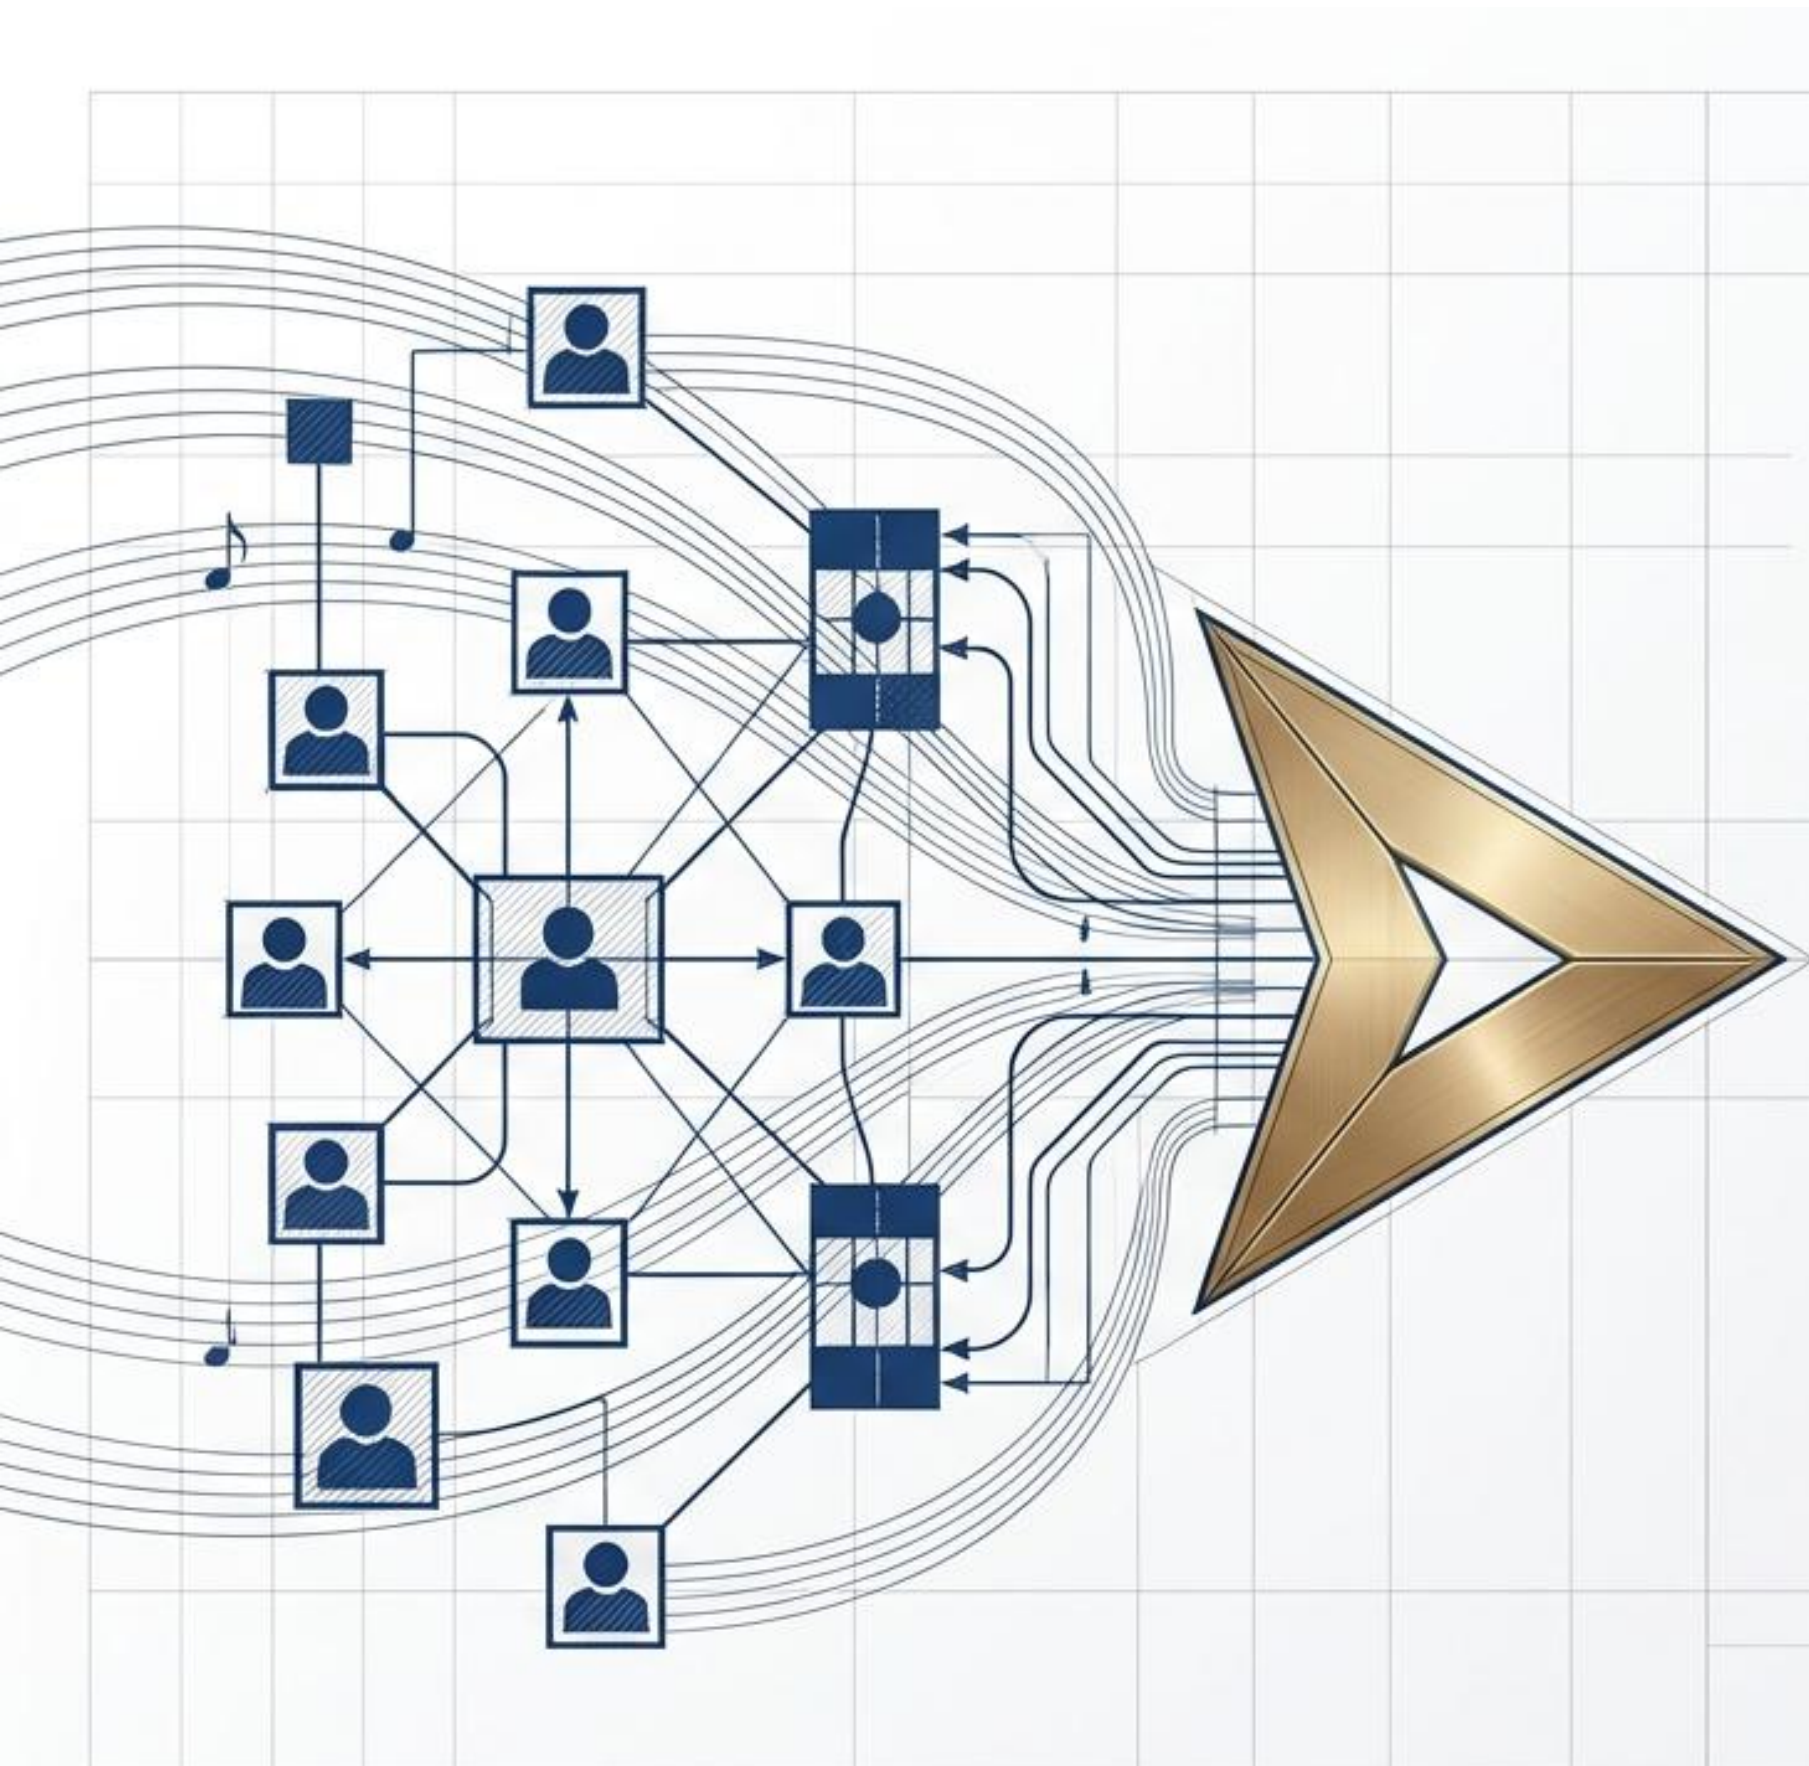


Certyfikat PMP: Zespół projektowy

Zarządzanie i budowanie
zespołu w fazie realizacji
(Executing Process Group)


dr Zbigniew Galar

Kontekst operacyjny: Faza Realizacji

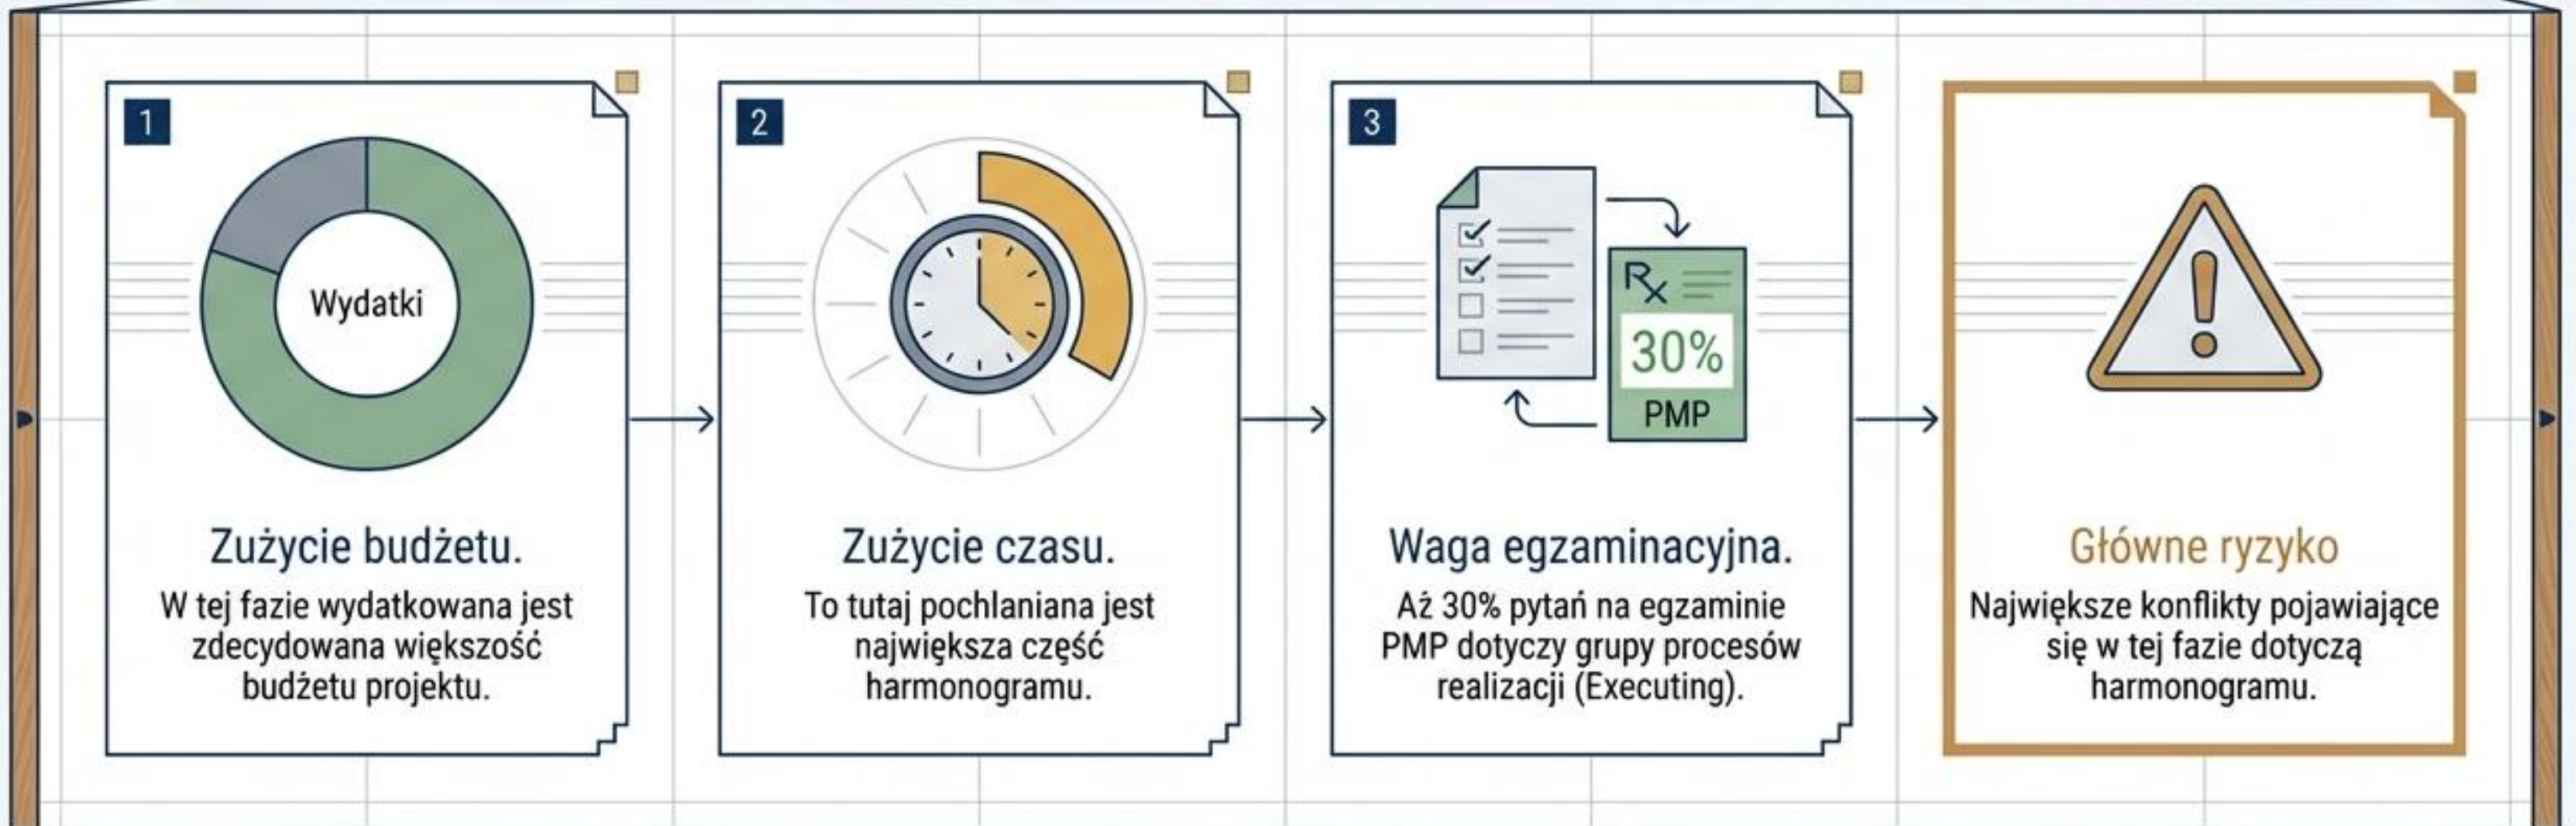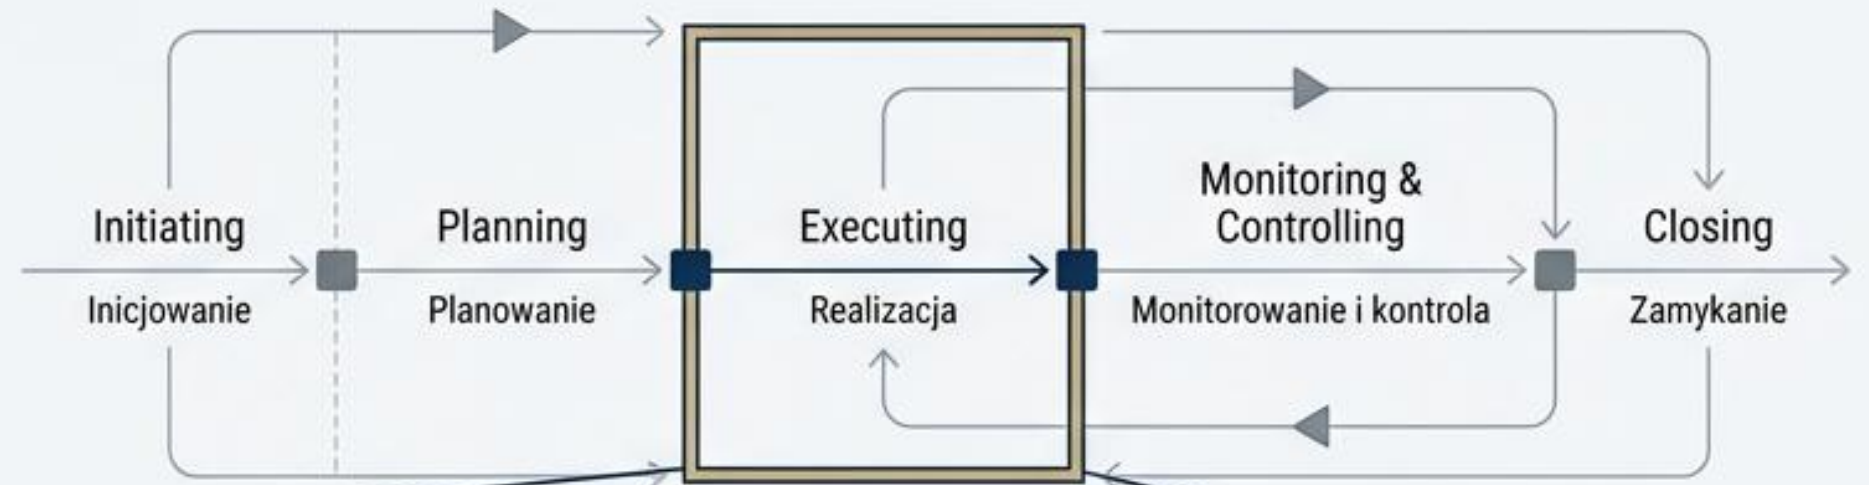


Dyrygent Projektu: Kierowanie i zarządzanie pracą (Direct & Manage Project Work)

Proces, w którym plan zamienia się w działanie ("Where the rubber meets the road").

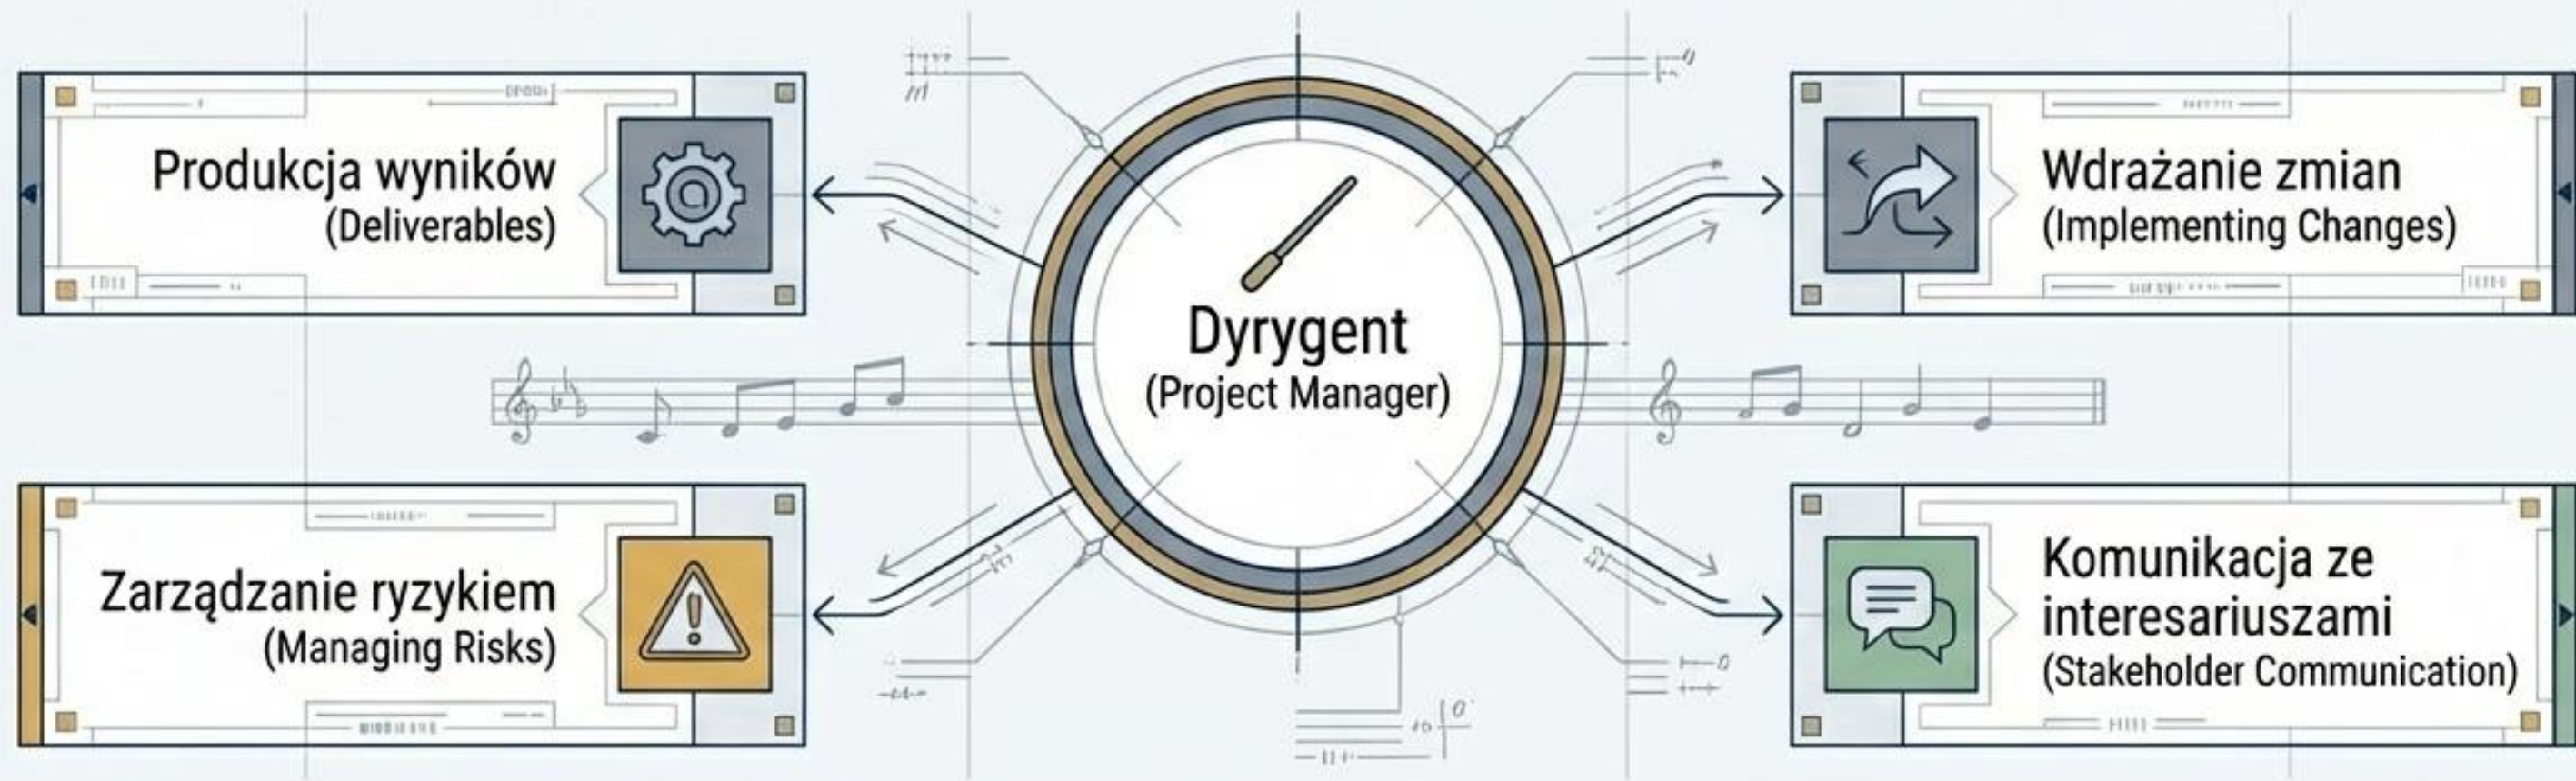


PM nie tylko obserwuje. Aktywnie integruje wszystkie elementy, aby utrzymać projekt w zgodzie z bazowym planem (Baseline), jednocześnie zarządzając dziesiątkami interfejsów organizacyjnych i technicznych.

Fundamenty działania (Wejścia procesu)

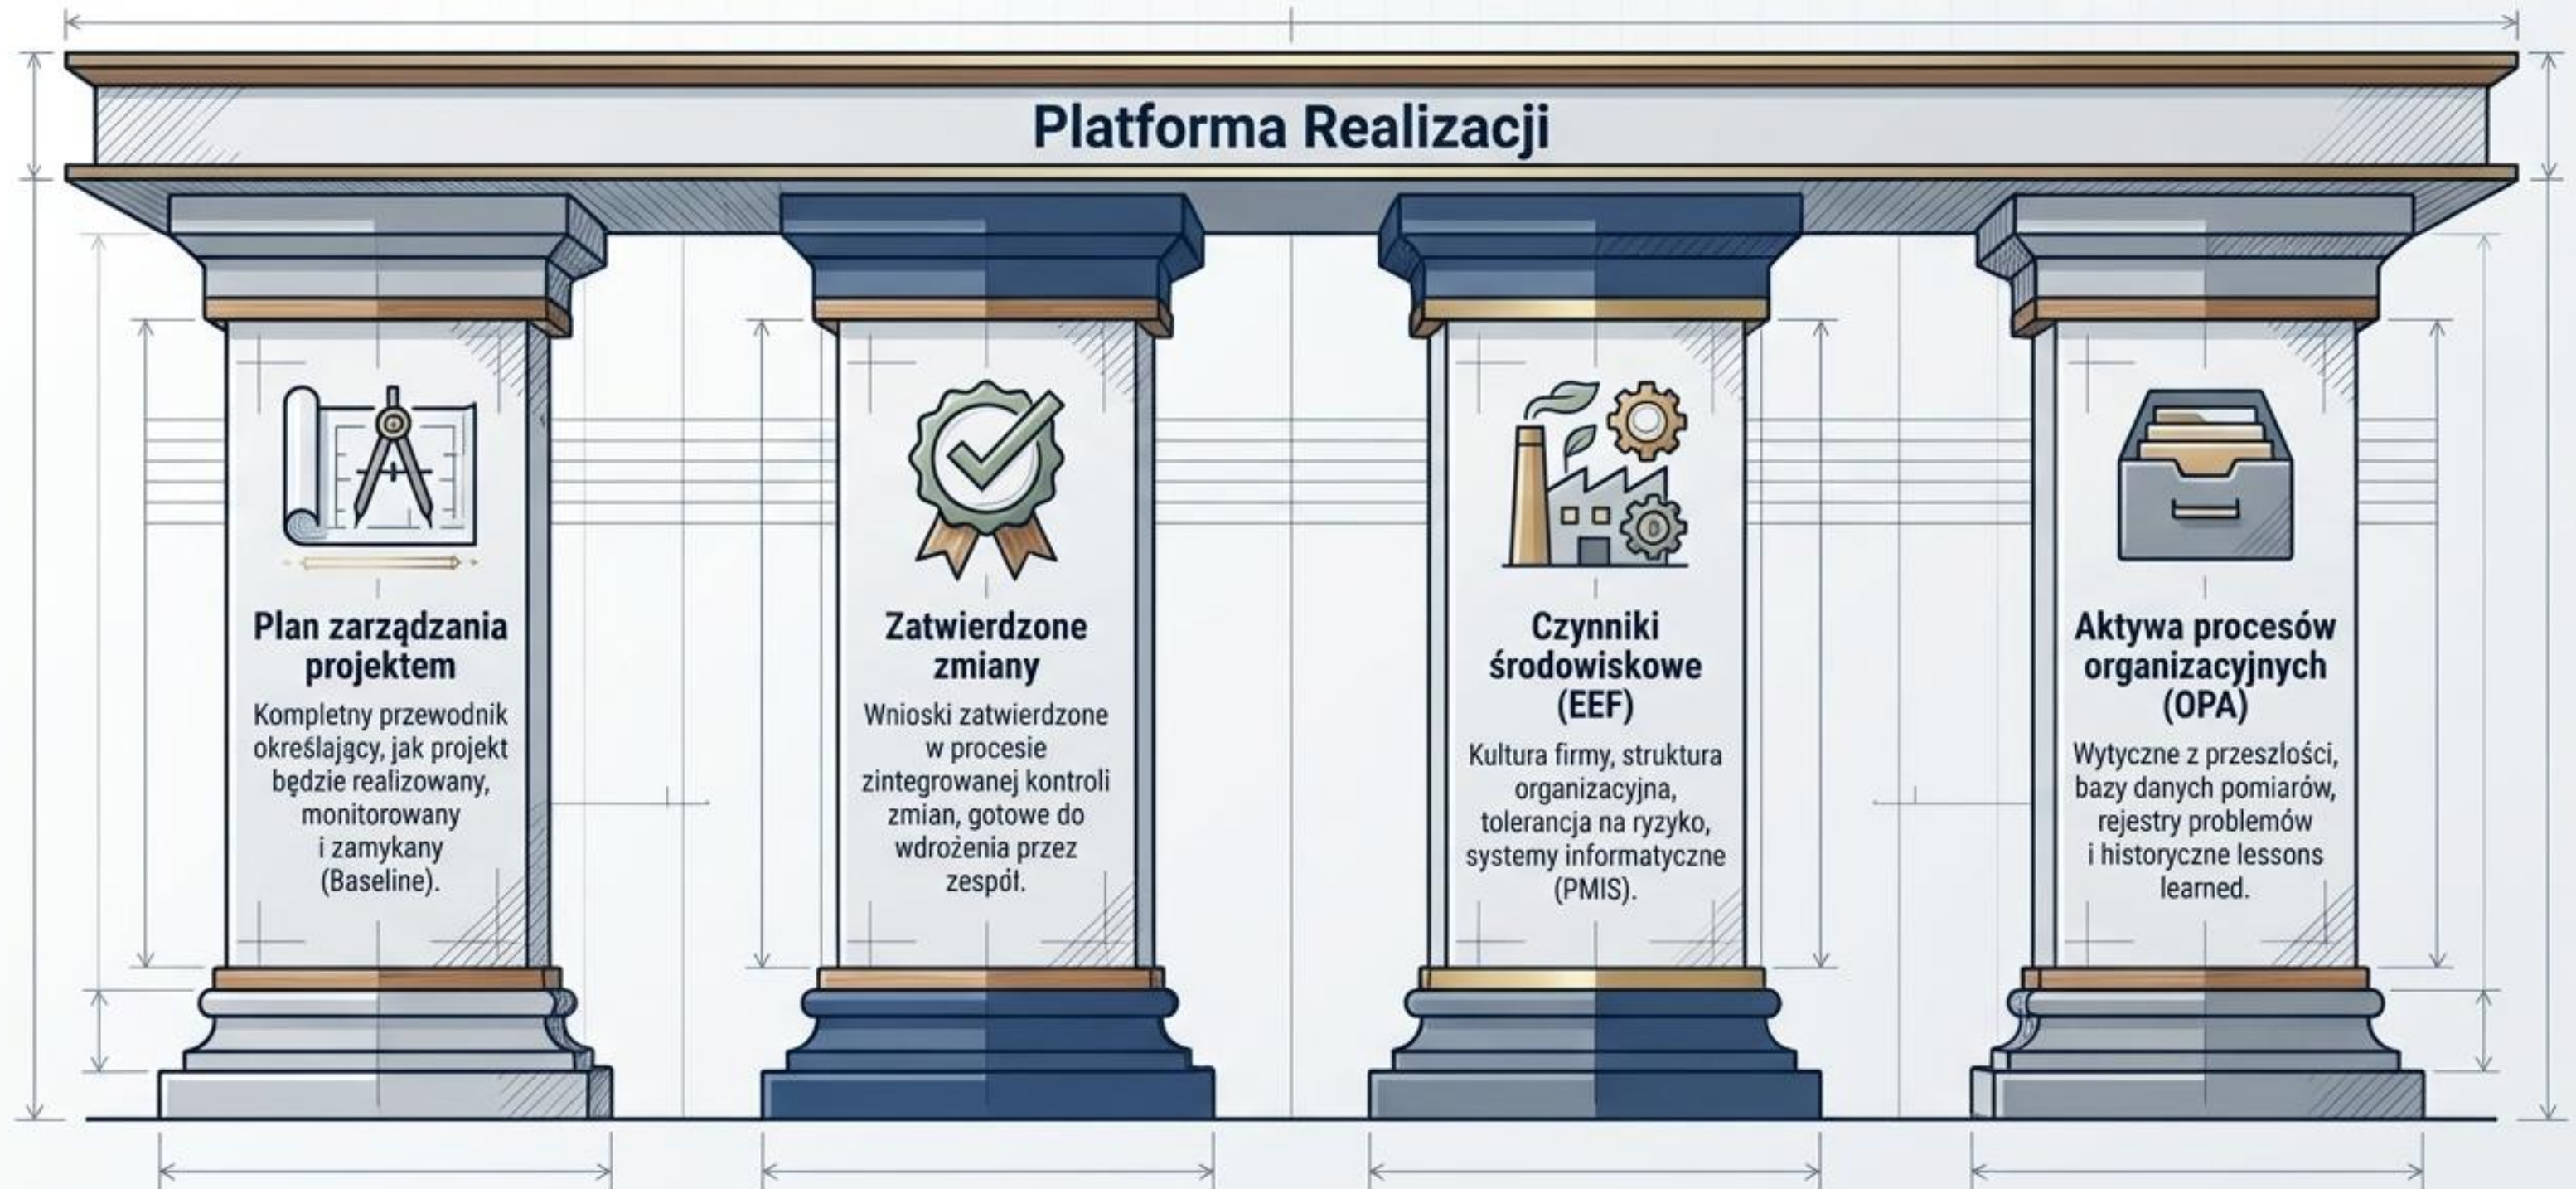

Owoce pracy (Kluczowe wyjścia)

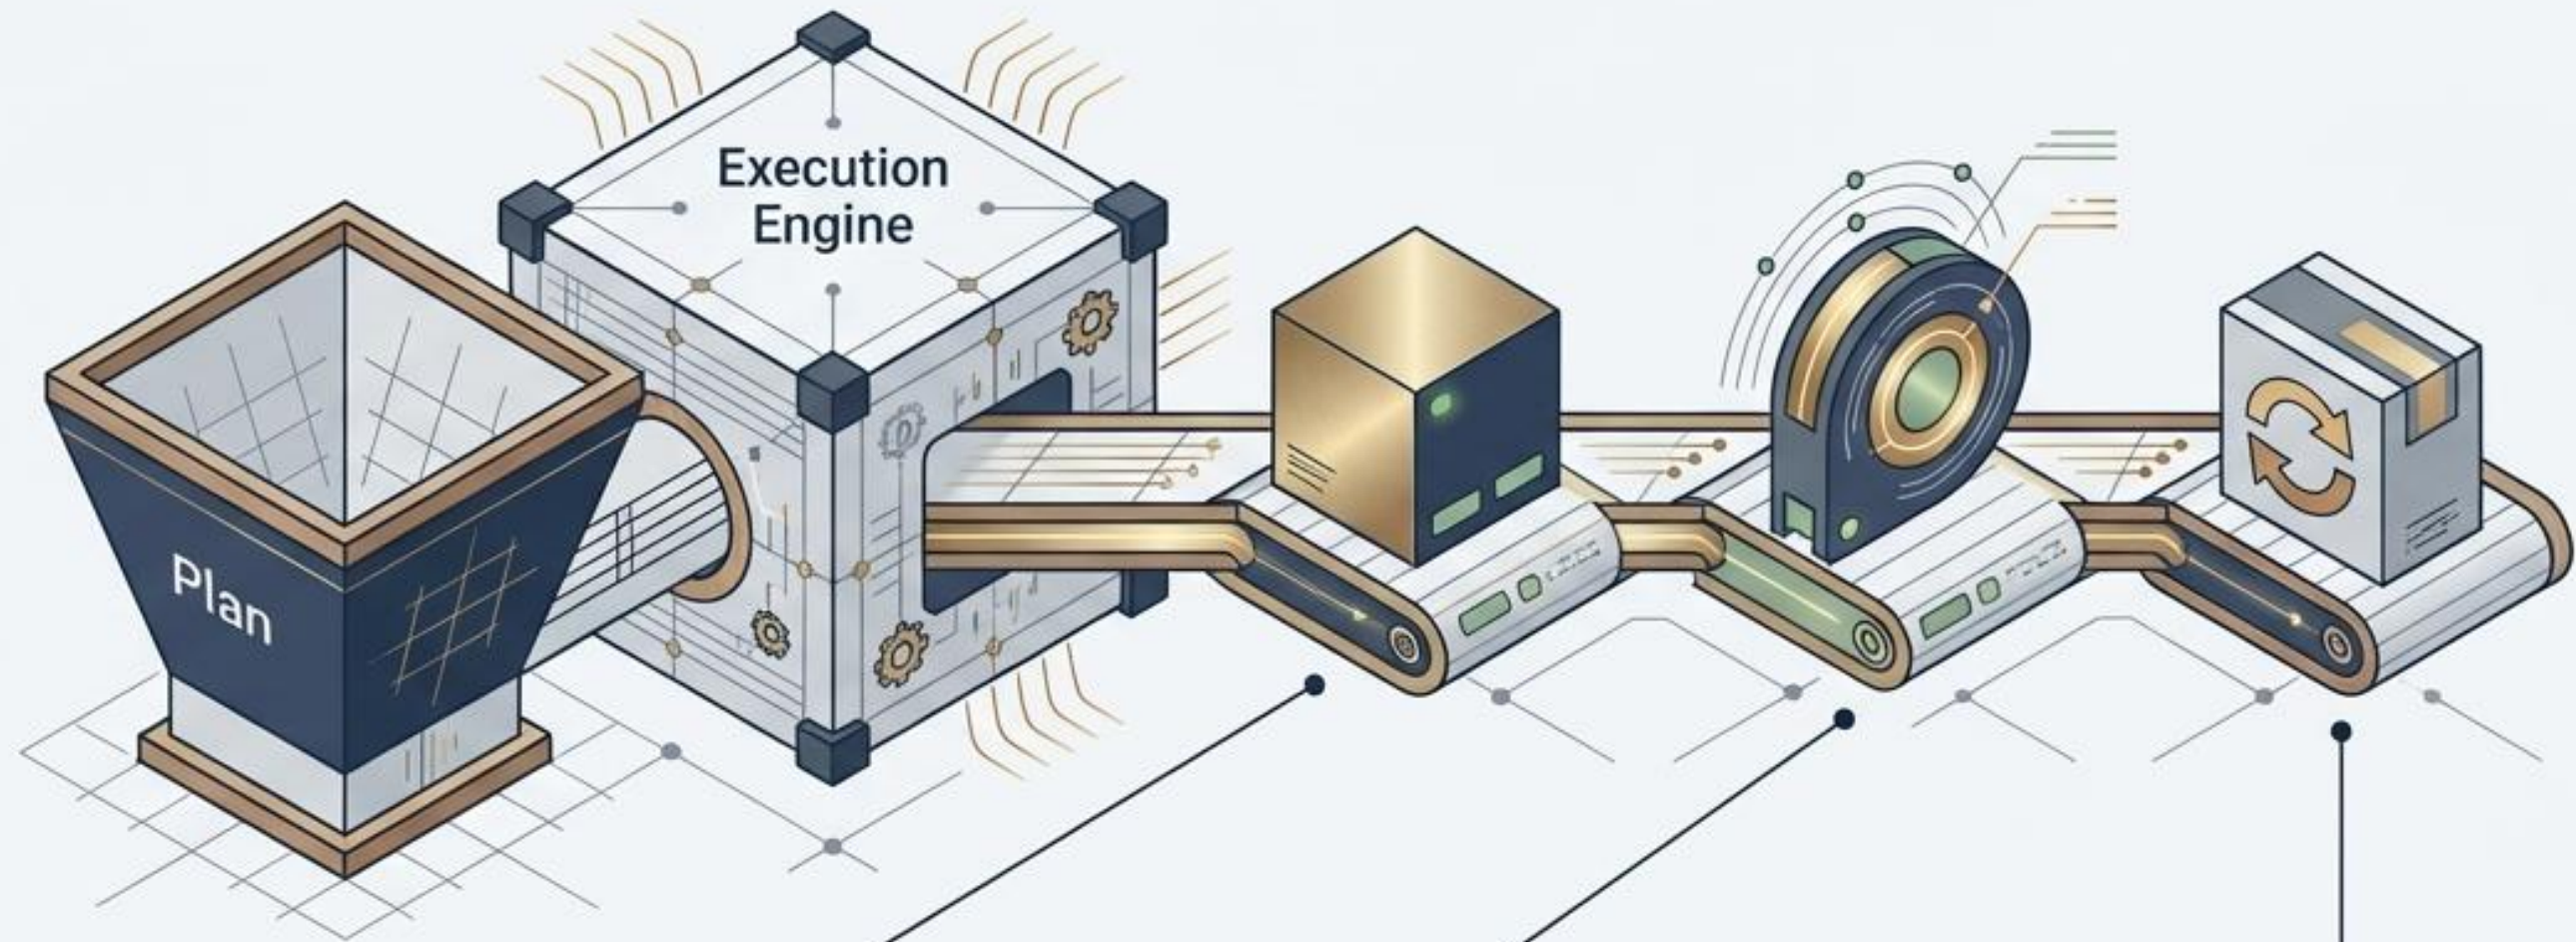

Produkty cząstkowe (Deliverables)

Unikalne, weryfikowalne rezultaty. Mogą być materialne (np. sprzęt) lub niematerialne (np. ukończone szkolenie personelu).


Dane o wydajności pracy (Work Performance Data)

Surowe dane i metryki zbierane bezpośrednio z linii frontu.

Wnioski o zmianę (Change Requests)

Nieuniknione prośby o modyfikacje wynikające ze zderzenia planu z rzeczywistością, błędów lub nowych wymagań technologicznych.

Telemetria Projektu (Dane o wydajności pracy)



Postęp harmonogramu i % ukończenia prac.



Status kosztów (autoryzowane vs poniesione).

- ✓ Wymagania Jakościowe
- ! Testy Funkcjonalne
- ✓ Dokumentacja Produktu
- ✓ Integracja Podsystemów
- ! Walidacja Końcowa

Zgodność ze standardami jakości oraz status ukończenia produktów cząstkowych.



Liczba zgłoszonych wniosków o zmianę (Change Requests).

Te surowe dane (Data) stoją się wejściem dla procesów Monitorowania i Kontrolowania, gdzie zostaną przekształcone w informacje (Information).


Macierz diagnostyczna działań (Change Requests)

	Działania korygujące (Corrective Actions)	Działania zapobiegawcze (Preventive Actions)	Naprawa wad (Defect Repair)
Wyzwalacz	Odchylenie od planu bazowego.	Identyfikacja ryzyka.	Komponent nie spełnia specyfikacji lub wymagań.
Skupienie	Wyrównanie przyszłych wyników prac z planem zarządzania projektem.	Przyszłość. Zmniejszenie prawdopodobieństwa lub wpływu negatywnych konsekwencji (np. plany awaryjne).	Przeszłość/Teraźniejszość. Naprawa wadliwego produktu. (Uwaga egzaminacyjna: Zatwierdzona naprawa wady oznacza ponowną inspekcję tej naprawy).


Zderzenie z rzeczywistością (Studium przypadku)



PLAN

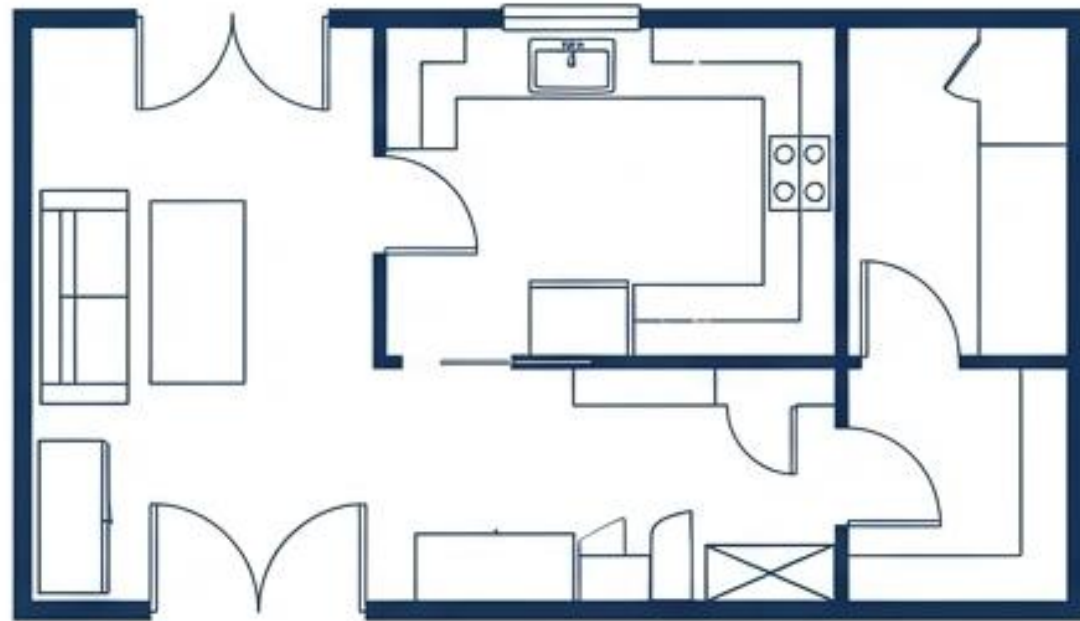

RZECZYWISTOŚĆ

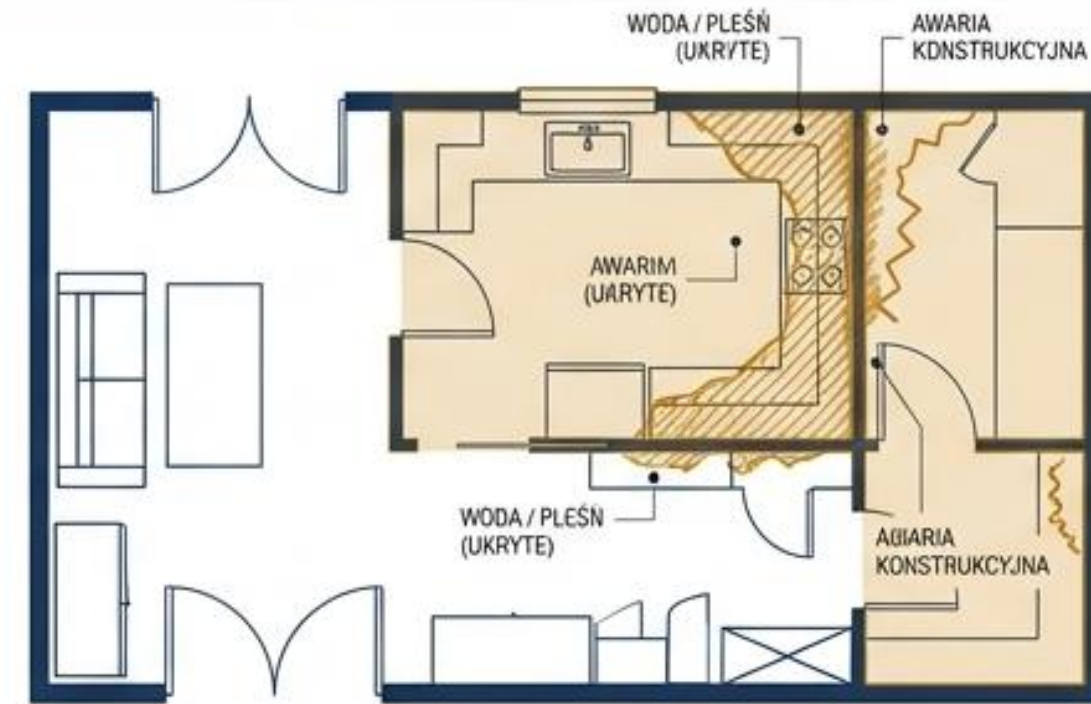

- Lodziarnia Heather. Idealny plan remontu (Plan) napotyka ukryty problem – wodę i pleśń w magazynie (Rzeczywistość).
- Wymagało to usunięcia płyt kartonowo-gipsowych, izolacji i dodatkowego malowania.
- Konieczne było zgłoszenie zatwierdzonych zmian (Change Requests). Wymusiło to powrót do procesów planowania (Planning) w celu modyfikacji budżetu, udowadniając, że faza Realizacji i Kontroli działają w ciągłej pętli.

Pozyskiwanie Zespołu Projektowego (Acquire Project Team)

Definicja


Proces pozyskiwania i przypisywania zasobów ludzkich do projektu. Niezależnie od tego, czy zespół pochodzi z wewnątrz, czy z zewnątrz organizacji.

⚠ Trudna Prawda

PM rzadko ma absolutną kontrolę nad tym, kto zostanie przypisany do projektu (np. w strukturach macierzowych). Często musi ocenić narzuconych z góry kandydatów i optymalnie dopasować ich do zadań.



Anatomia kandydata (Czynniki środowiskowe - EEF)

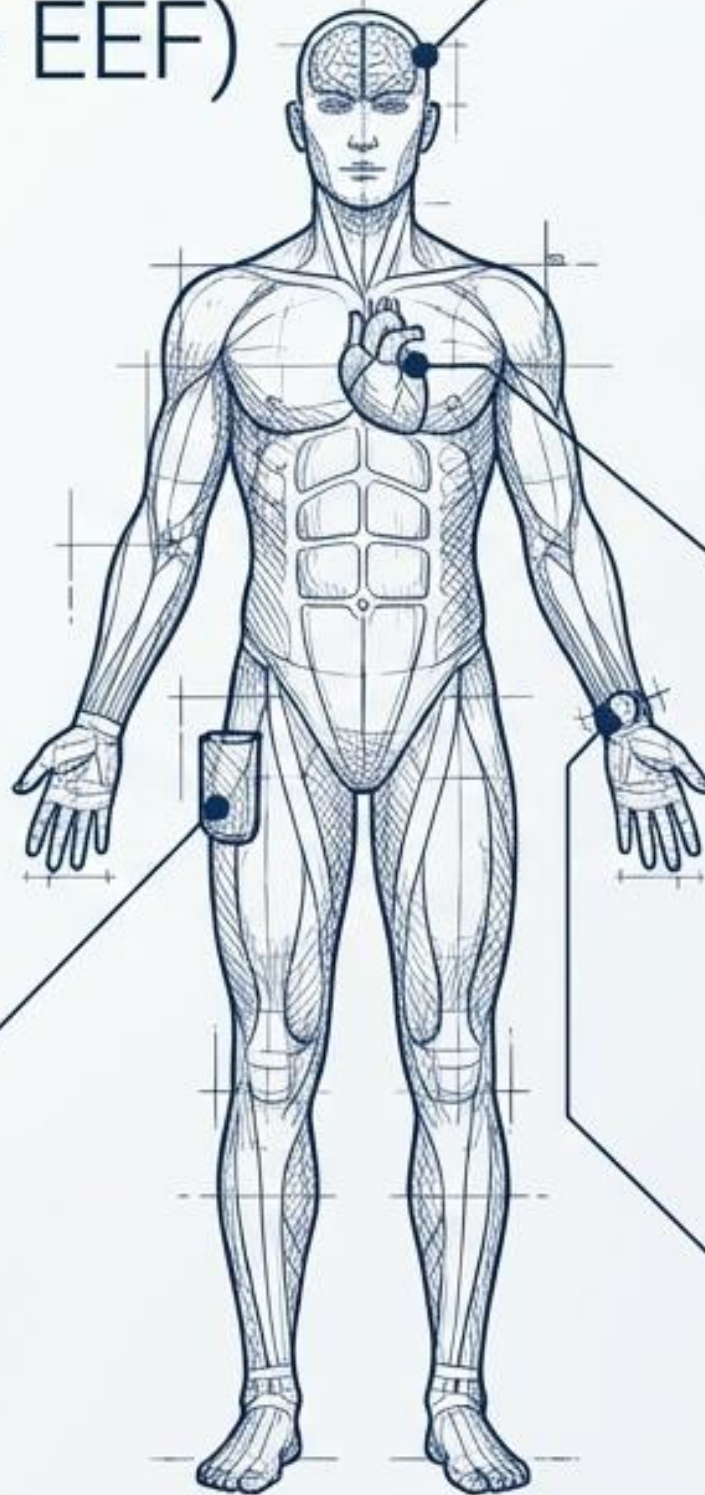

Kompetencje

Doświadczenie i umiejętności. Czy radzili sobie wcześniej z taką złożonością?



Zainteresowania

Osobiste preferencje. Brak zainteresowania projektem drastycznie obniża wydajność. Czy potrafią współpracować z resztą grupy?



Dostępność

Czy kluczowy pracownik nie zaplanował urlopu w najbardziej krytycznym momencie harmonogramu?

Koszt

Stawki godzinowe. Czy mieszczą się w budżecie projektu?

Zestaw Narzędzi Rekrutacyjnych (Tools & Techniques)



Negocjacje.

Kluczowa umiejętność PM-a. Walka o najlepszych ludzi z menedżerami funkcjonalnymi w organizacjach macierzowych.




Wstępne przypisanie (Preassignment).

Zasoby obiecane i zdefiniowane już na etapie karty projektu (Project Charter) lub w ofercie przetargowej.



Pozyskiwanie (Acquisition).

Zatrudnianie zewnętrznych wykonawców (Procurement), gdy wewnątrz organizacji brakuje wymaganych kompetencji.



Analiza wielokryterialna.

Obiektywne punktowanie i ocenianie kandydatów na podstawie twardych kryteriów (doświadczenie, koszt, edukacja).

Architektura Zespołów Wirtualnych



Zaleta

Dostęp do globalnych talentów, włączenie osób z ograniczeniami ruchowymi, praca w różnych strefach czasowych.



Protokół

Wymaga rygorystycznych protokołów komunikacyjnych (email, wideokonferencje). Oczekiwania i procesy decyzyjne muszą być absolutnie jasne.



Rola PM

PM musi proaktywnie doceniać indywidualne wysiłki. W zespołach rozproszonych współpracownicy nie widzą wzajemnie swojego zaangażowania, dlatego uznanie staje się kluczowym narzędziem utrzymania spójności.

Punkt Krytyczny: Dostępność to nie umiejętność




Wyzwanie organizacyjne

Podczas negocjacji z menedżerami funkcjonalnymi największym zagrożeniem jest akceptacja personelu na podstawie samej dostępności ("weź go, jest wolny").

Złota zasada PM

Udane negocjacje muszą zawsze równoważyć czas (kiedy pracownik jest dostępny) z rygorystyczną oceną jego rzeczywistych kompetencji i cech osobistych. "Dostępność to nie jest zestaw umiejętności".

Finalizacja Zespołu (Kluczowe Wyjścia)

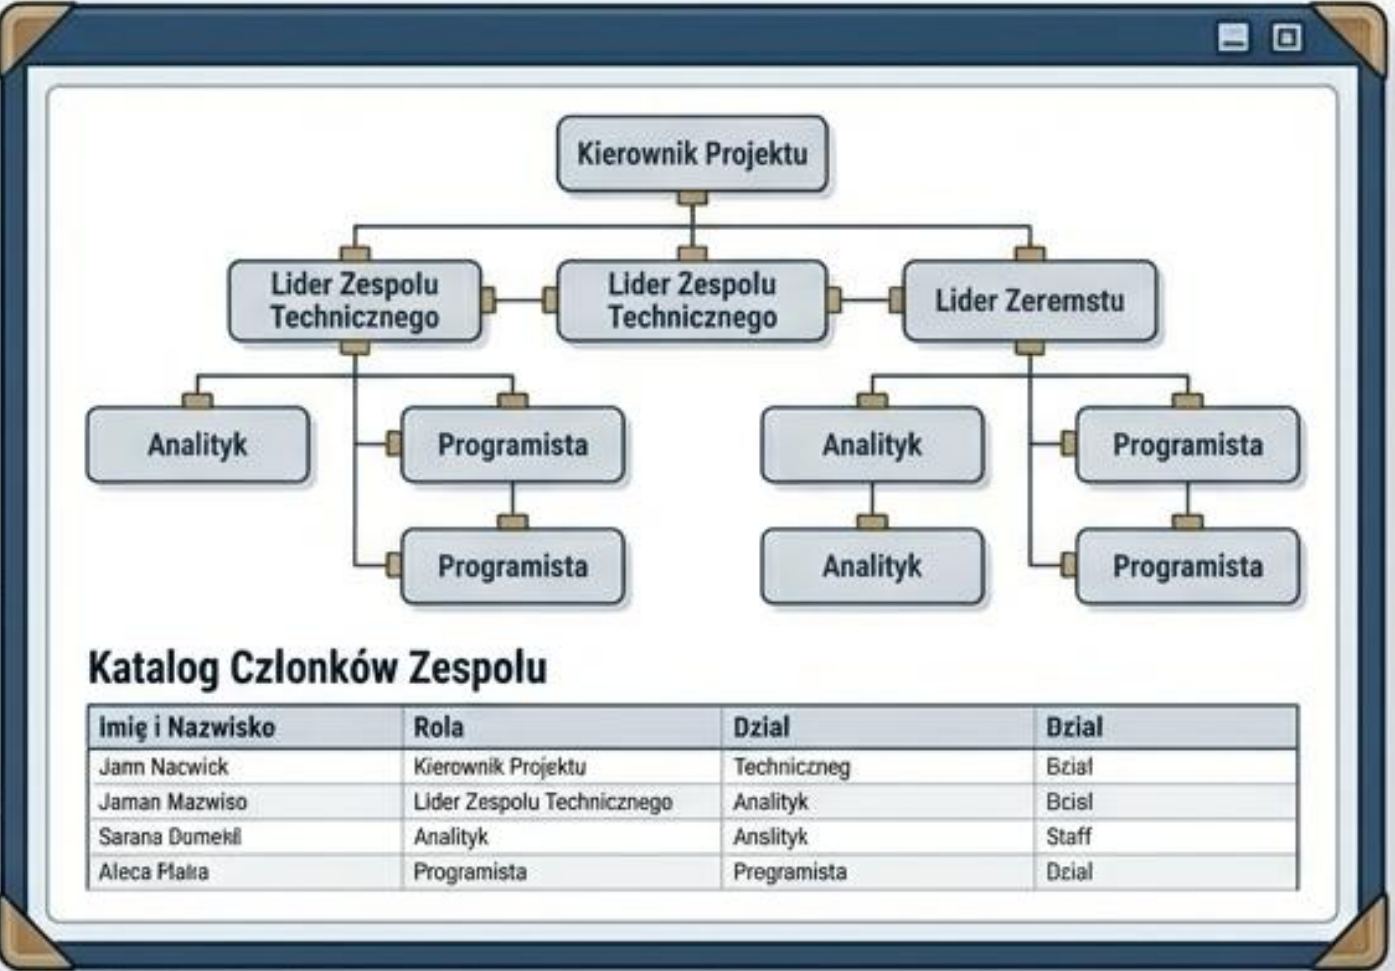


Przypisanie personelu (Project Staff Assignments).
Zaktualizowane schematy organizacyjne projektu, zaktualizowane macierze RAM (Responsibility Assignment Matrix) oraz opublikowany katalog członków zespołu.



Kalendarze zasobów (Resource Calendars).
Precyzyjna dokumentacja dostępności i urlopów poszczególnych członków zespołu. (Krytyczne wejście dla późniejszego procesu Szacowania Zasobów Działania).

Architektura Sukcesu Projektu (Synteza)

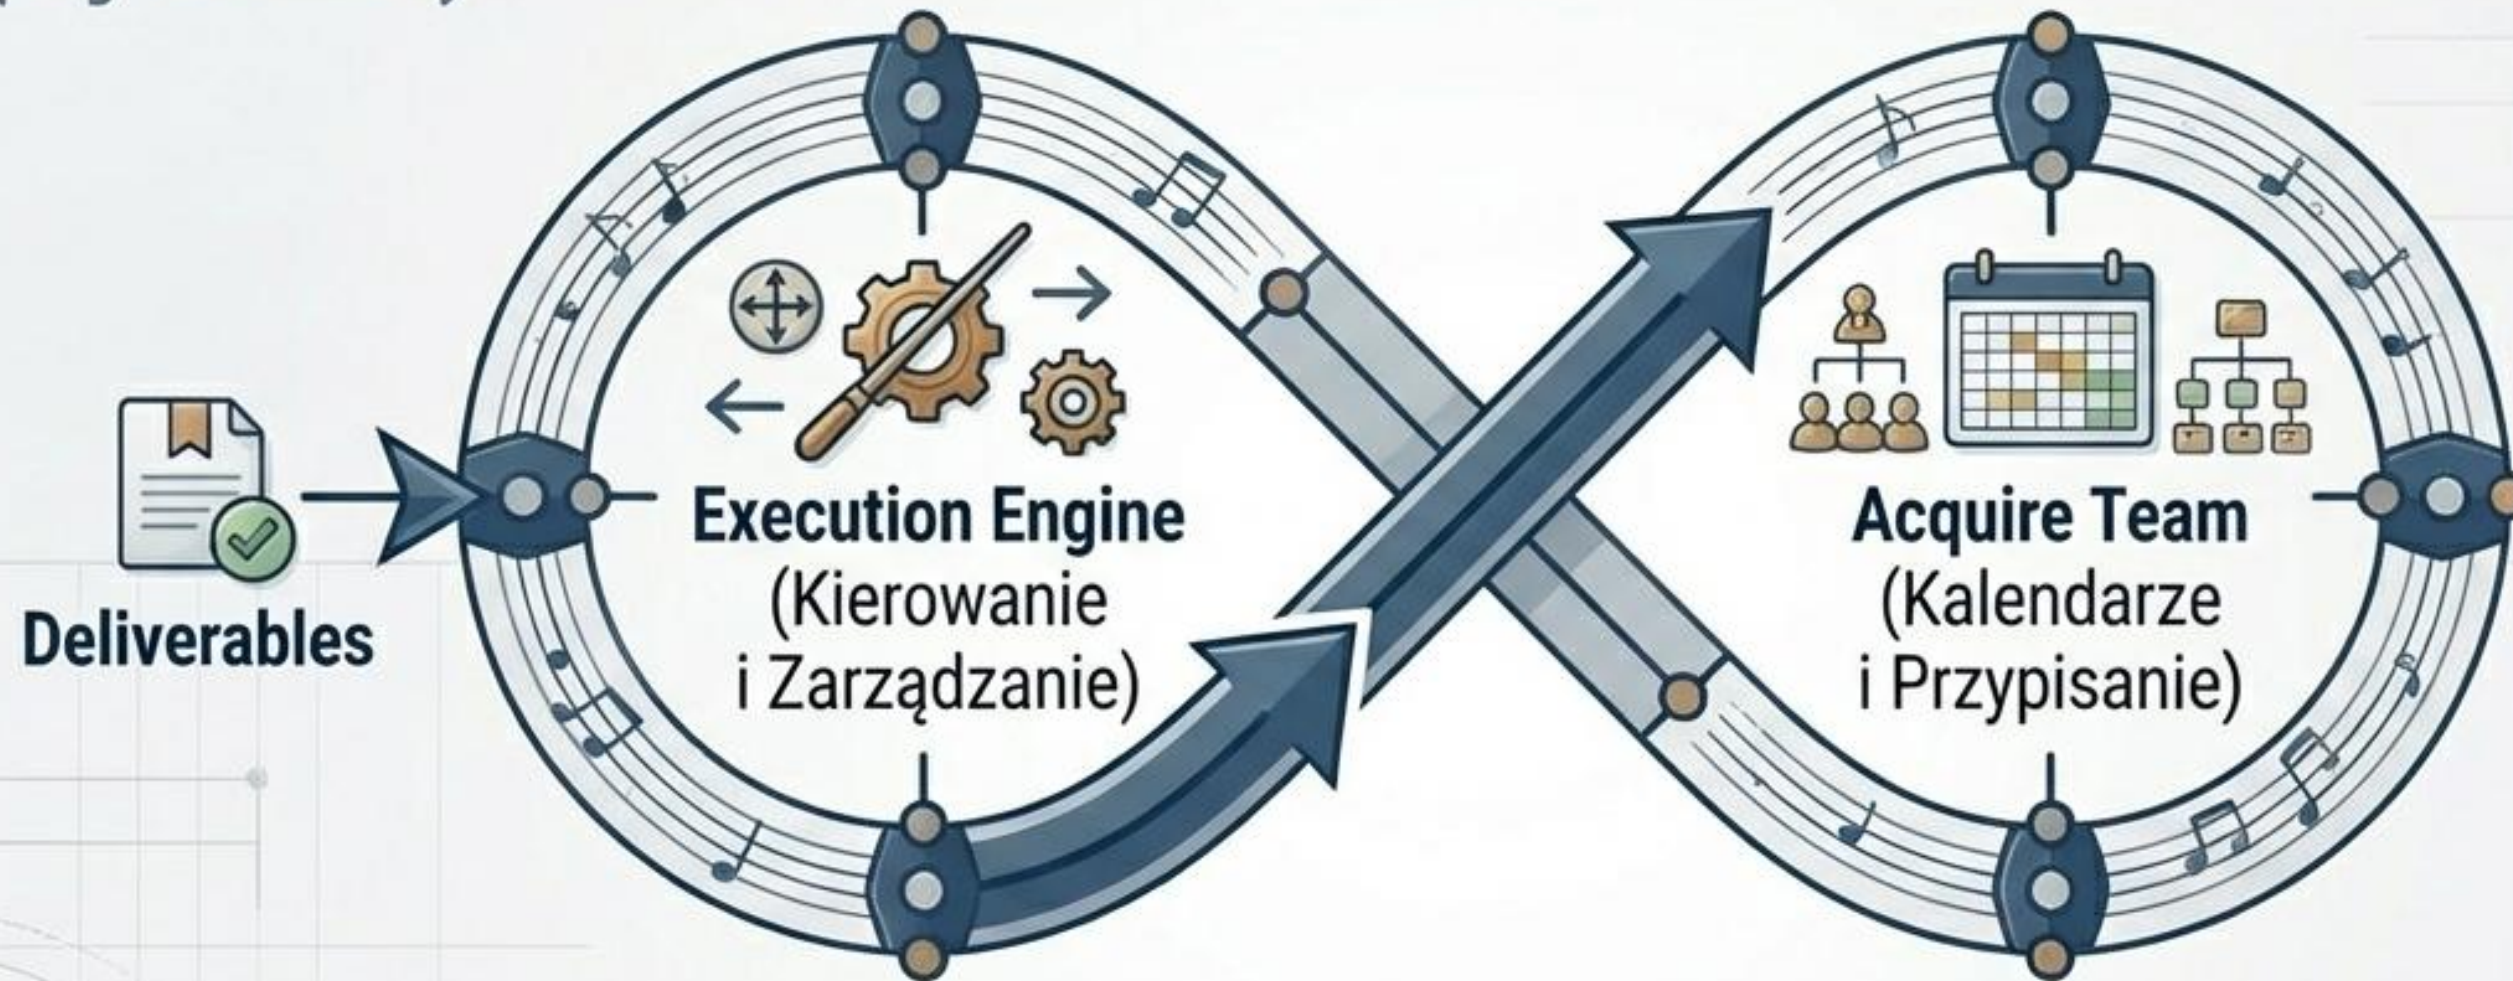

Wniosek końcowy: Doskonały plan (Project Management Plan) pozostaje martwym dokumentem, dopóki precyzyjnie pozyskany zespół (Acquire Project Team) nie zostanie zintegrowany i poprowadzony przez aktywnego dyrygenta (Direct and Manage Project Work).

Ludzie zasilają proces. Proces tworzy wyniki. Odchylenia generują zmiany, które wracają do planu, zamykając architekturę realizacji.
