




Certyfikat PMP: Zarządzanie informacjami projektu

Narzędzia, modele komunikacji
i zapewnienie jakości danych


Autor: dr Zbigniew Galar

Cykl Życia Informacji w Projekcie


Zapewnienie jakości i zarządzanie komunikacją to naczynia połączone. Sukces zależy od tego, jak surowe dane są przetwarzane w użyteczną wiedzę.

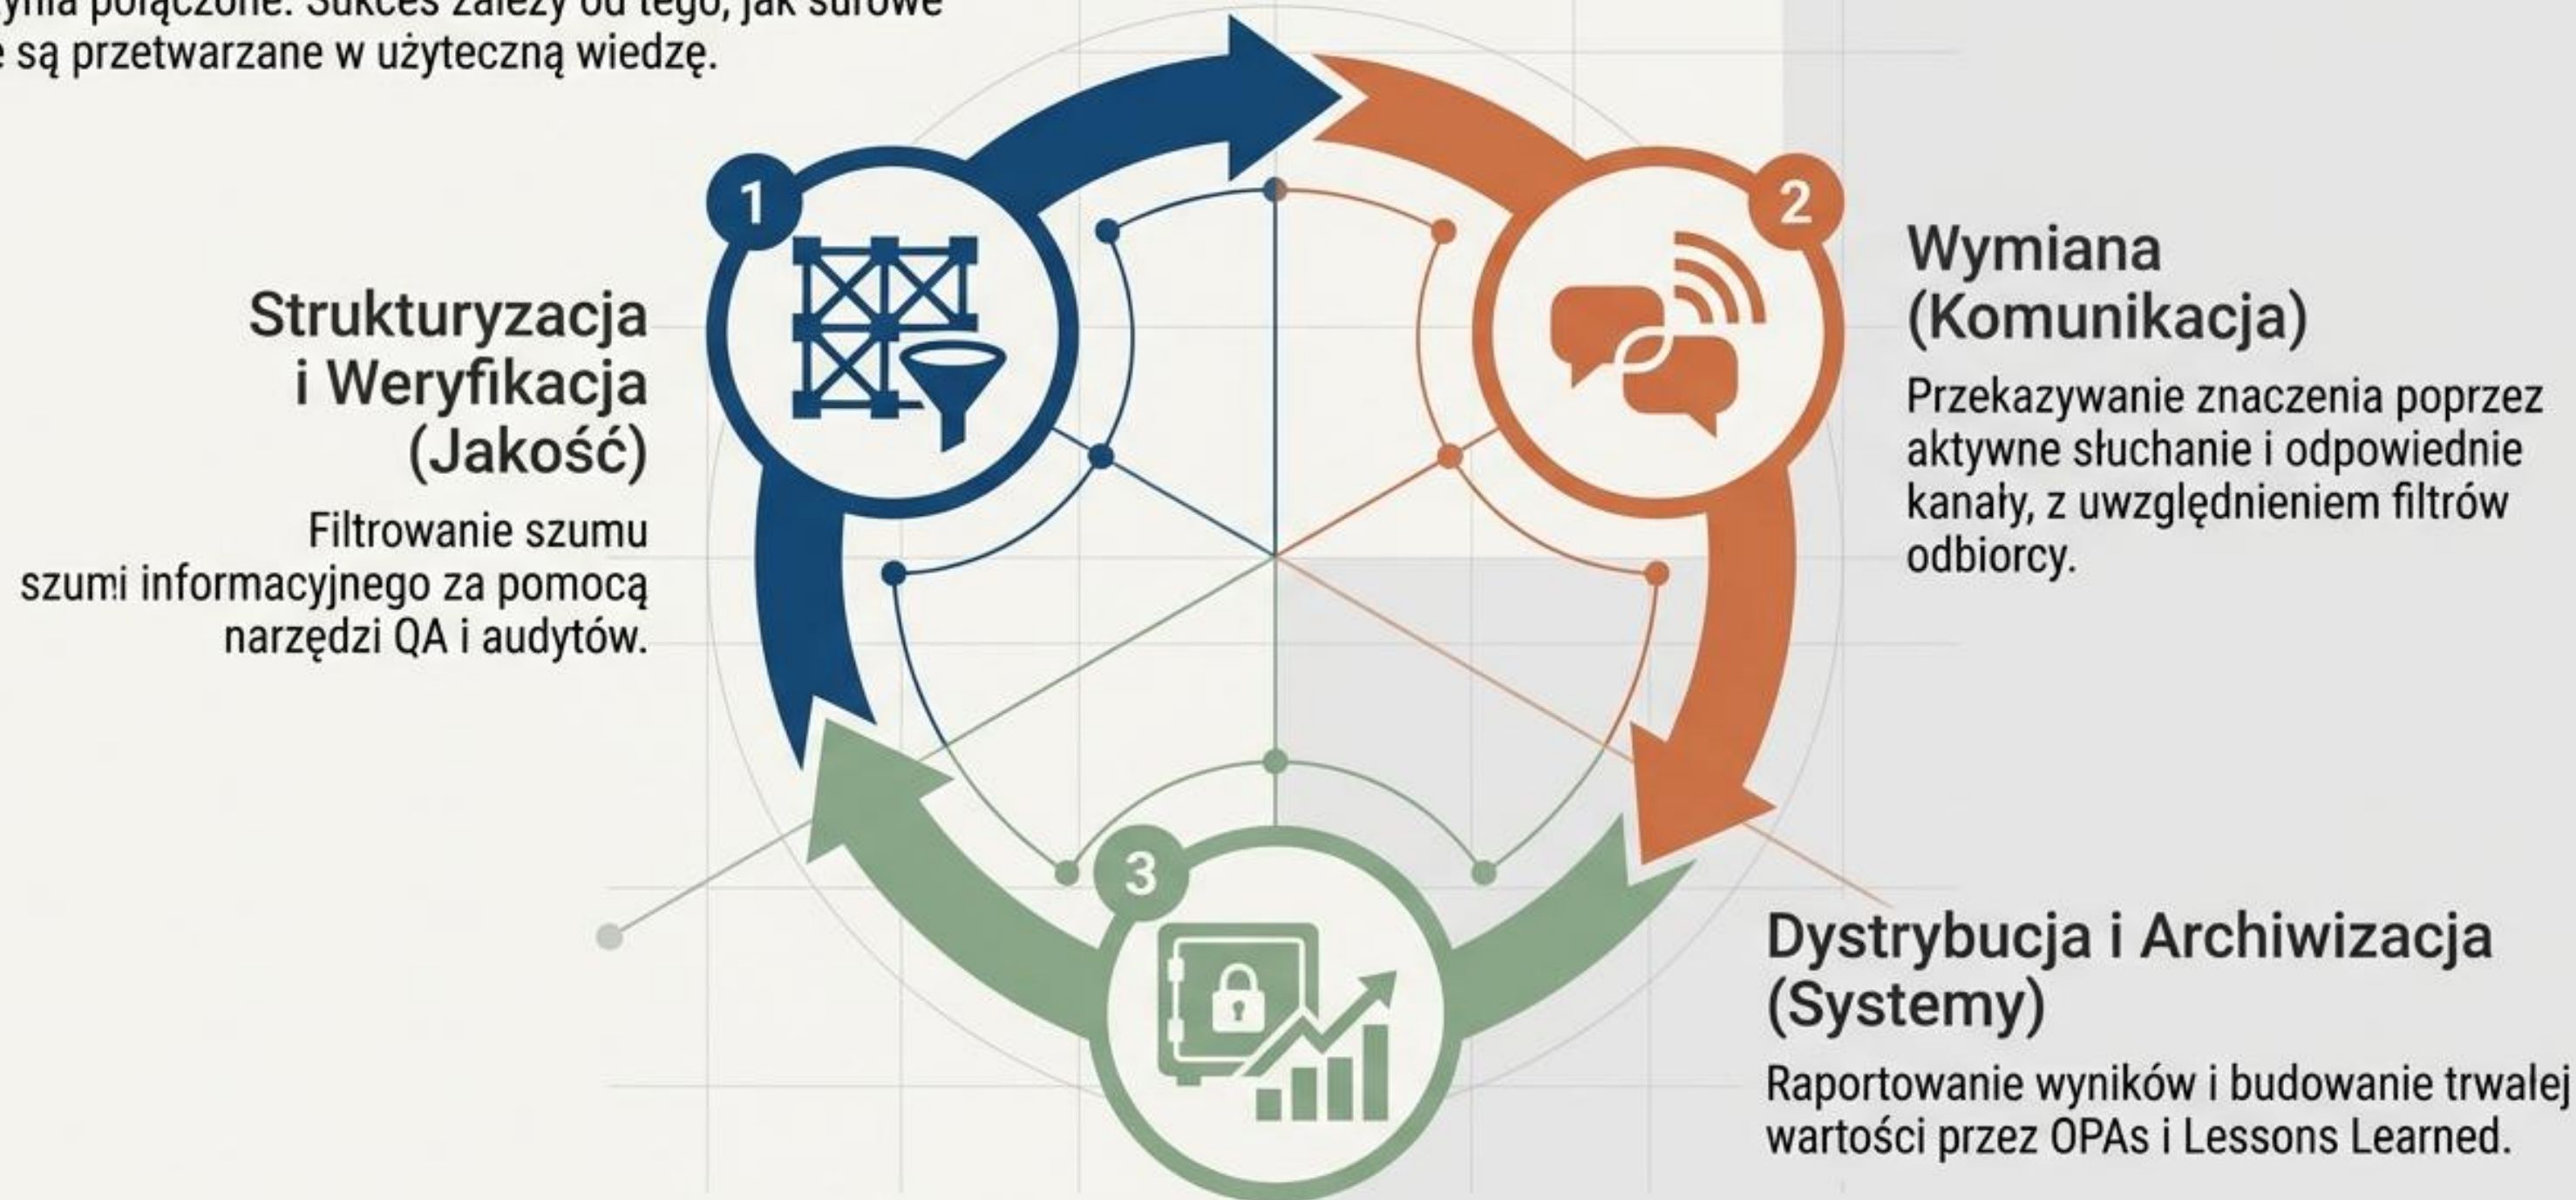

Jak uporządkować chaos danych? Narzędzia Zapewnienia Jakości

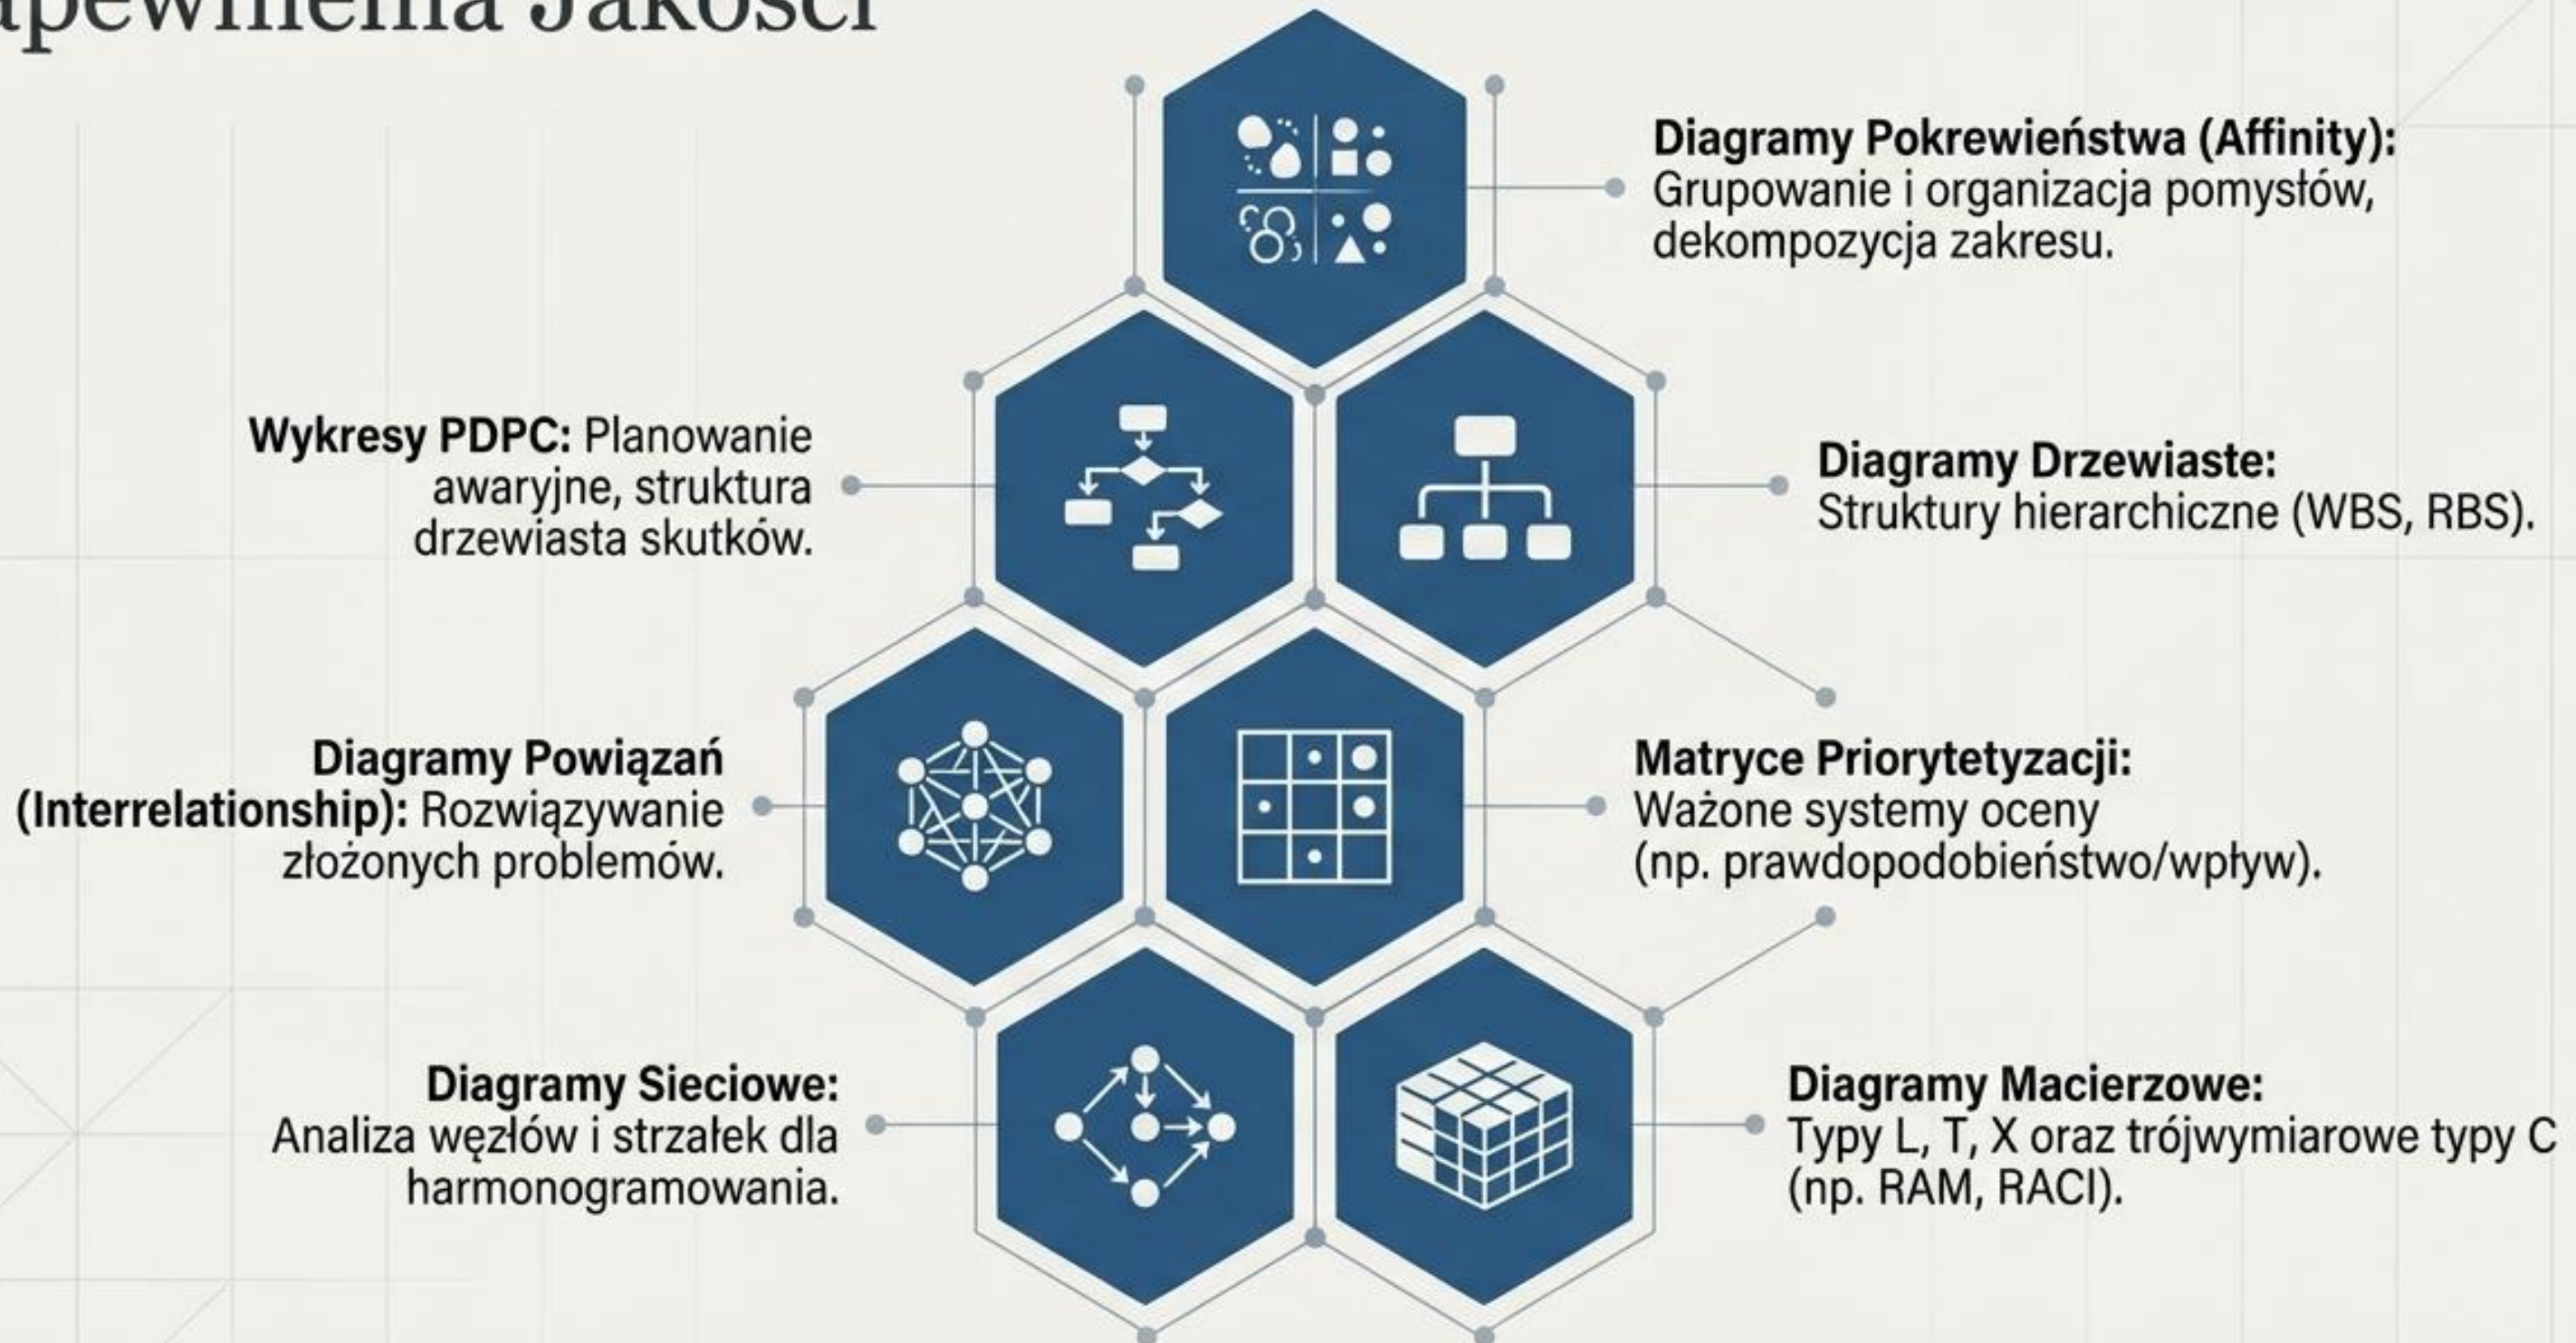


Narzędzia analityczne w praktyce: Mapowanie Złożoności

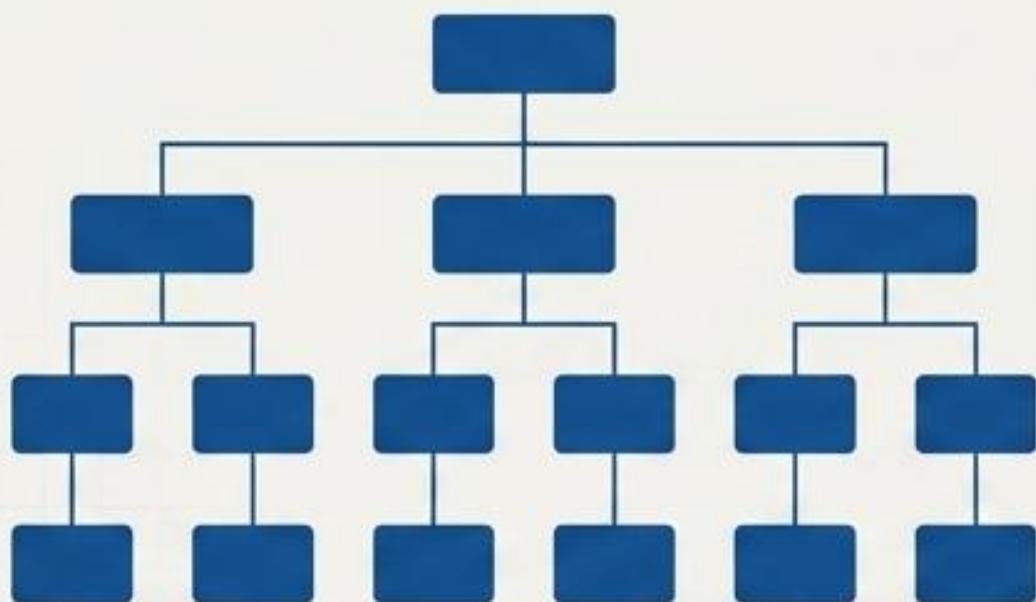

Diagramy Drzewiaste

- **Cel:** Ukazywanie prostej hierarchii i relacji rodzic-dziecko.
- **Zastosowanie:** WBS (Work Breakdown Structure). Pozwalają łatwo określić wartości oczekiwane dla każdego poziomu struktury.

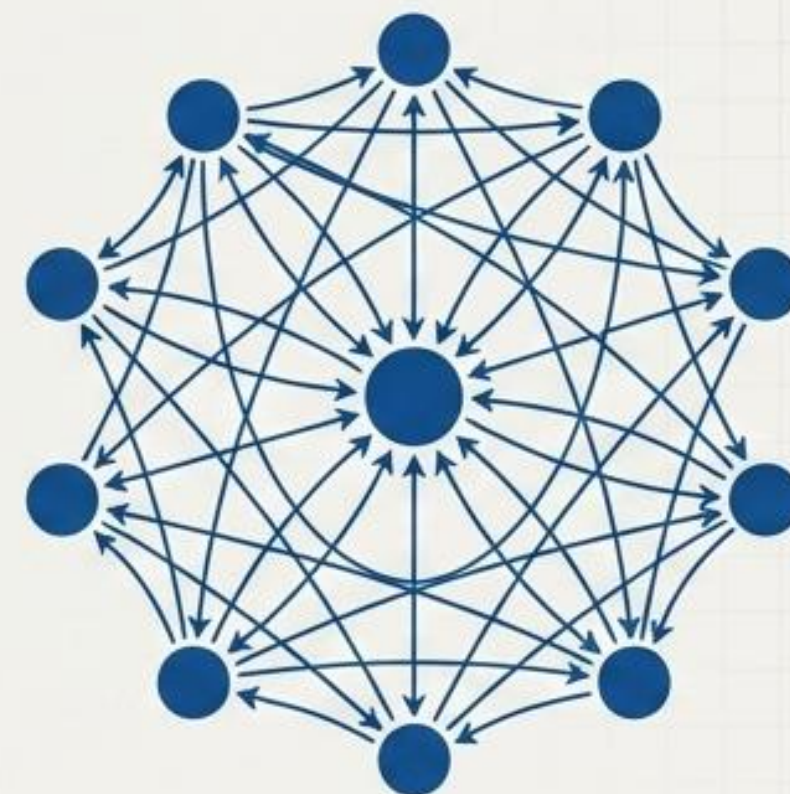


Diagramy Powiązań

- **Cel:** Analiza nawet 50 wzajemnie powiązanych czynników.
- **Zastosowanie:** Złożone problemy. Węzły z największą liczbą połączeń (linii) to elementy o największym wpływie na projekt.

Weryfikacja Informacji: Niezależne Audyty Jakości

Kontekst: Audyty to niezależne przeglądy (często realizowane przez ekspertów zewnętrznych), których celem jest identyfikacja nieefektywnych działań.

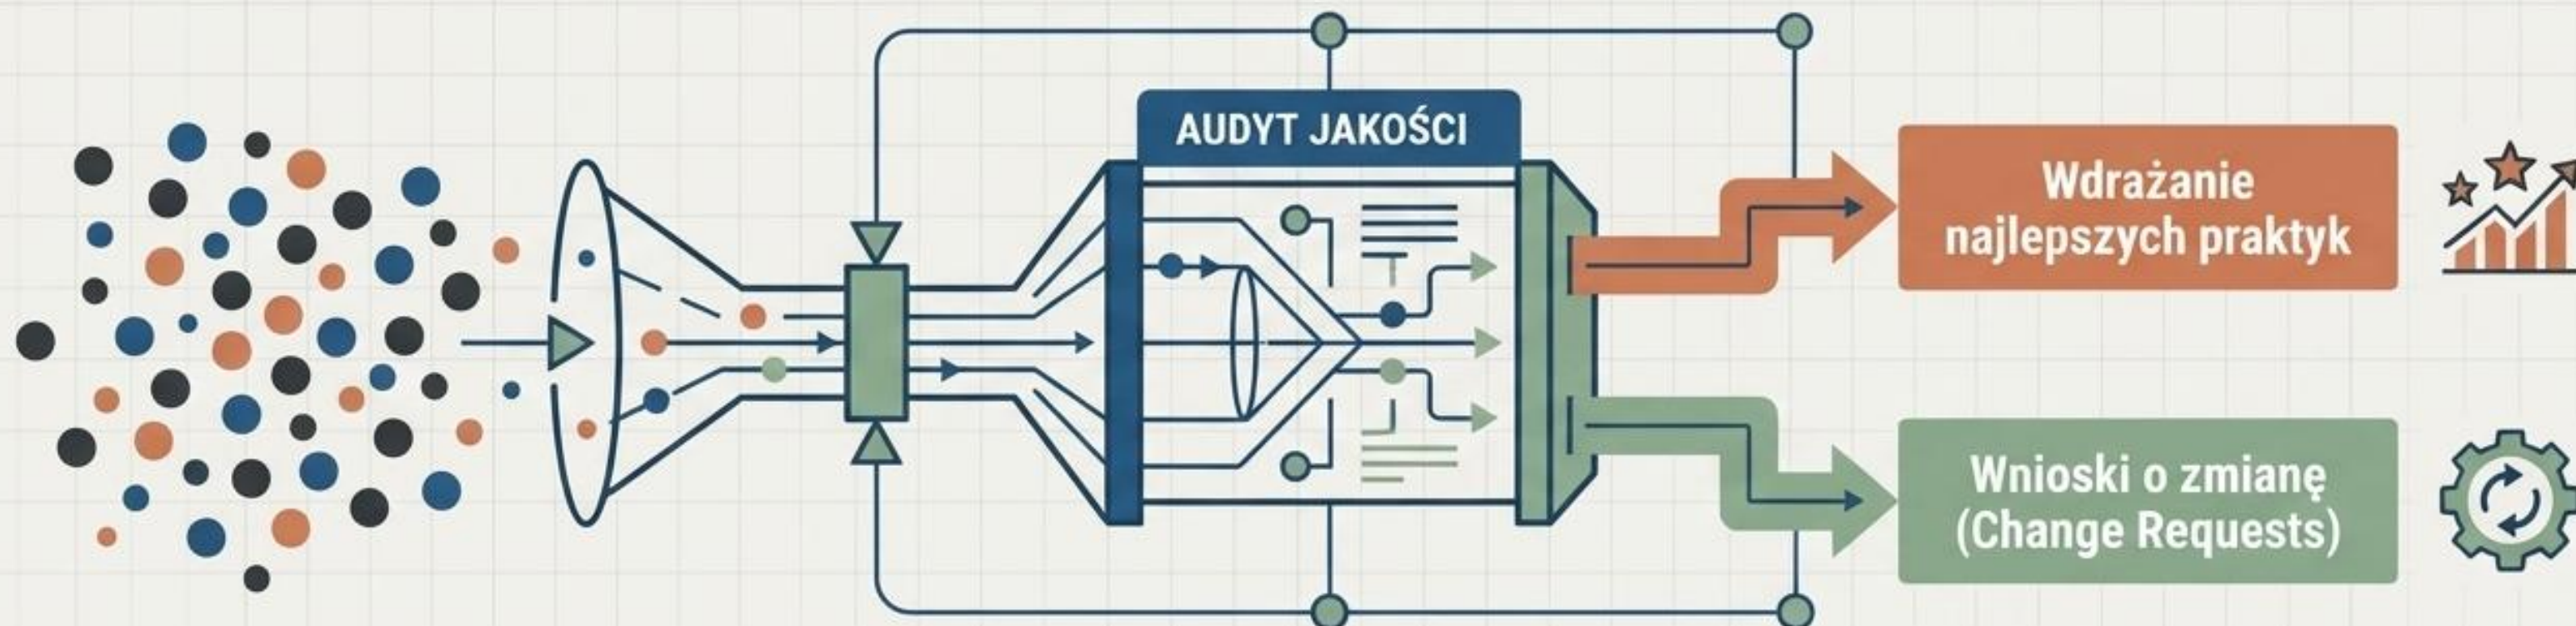

Korzyści z Audytu


- ✓ Identyfikacja luk i niedociągnięć.
- ✓ Wdrażanie i dzielenie się najlepszymi praktykami.
- ✓ Potwierdzanie wdrożenia zatwierdzonych zmian i naprawy defektów.



Exam Spotlight


Kluczowy cel to weryfikacja, czy procesy spełniają standardy określone w planie zarządzania jakością, co prowadzi do ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement) poprzez natychmiastowe wdrażanie wniosków o zmianę (Change Requests).

Analiza Procesów: Dotarcie do sedna problemu

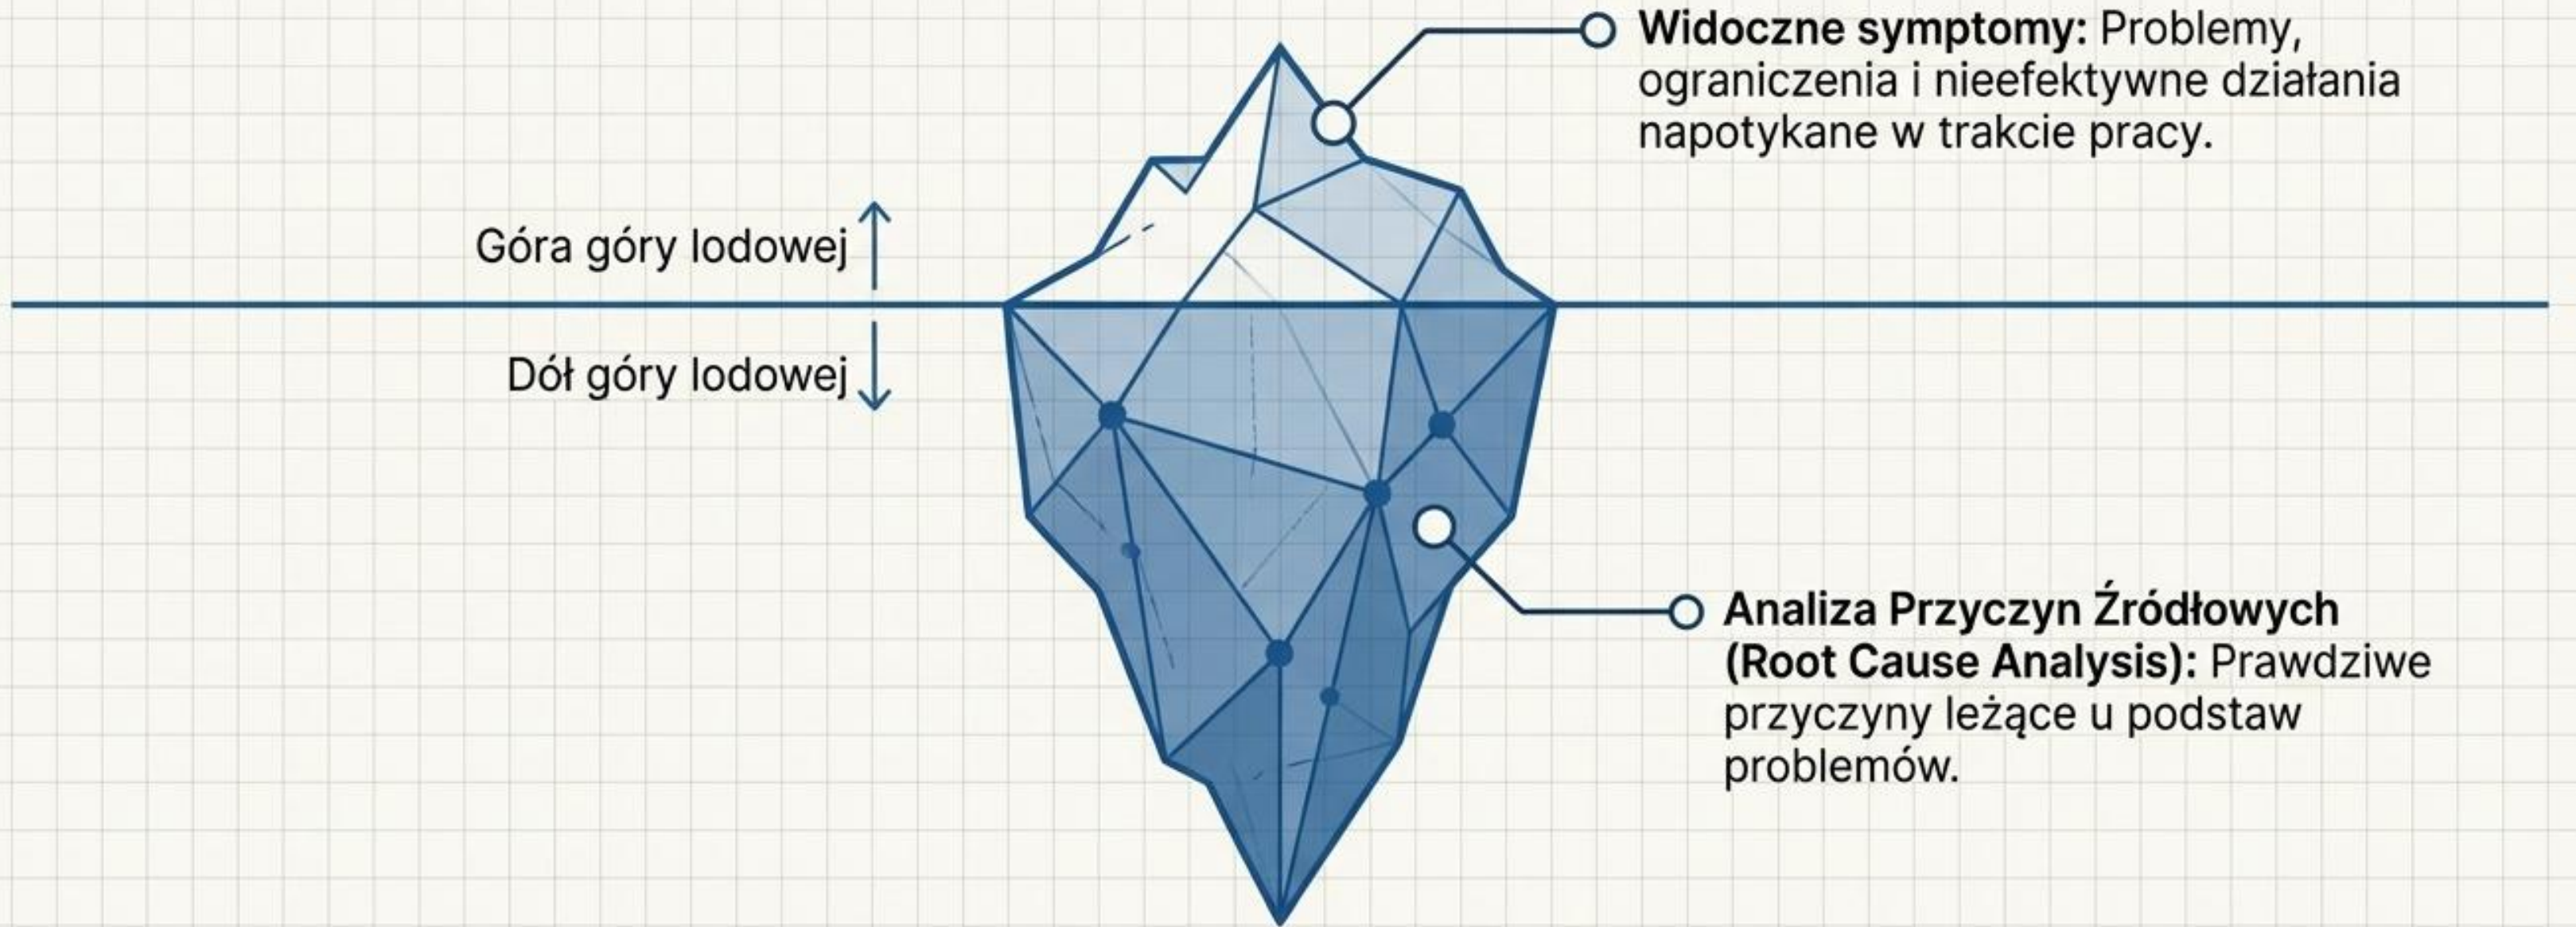


Wniosek: Zrozumienie przyczyn źródłowych jest niezbędne do opracowania skutecznych działań zapobiegawczych, co stanowi fundament ciągłego doskonalenia procesów.

Anatomia Przekazu Informacji (Model Komunikacji)

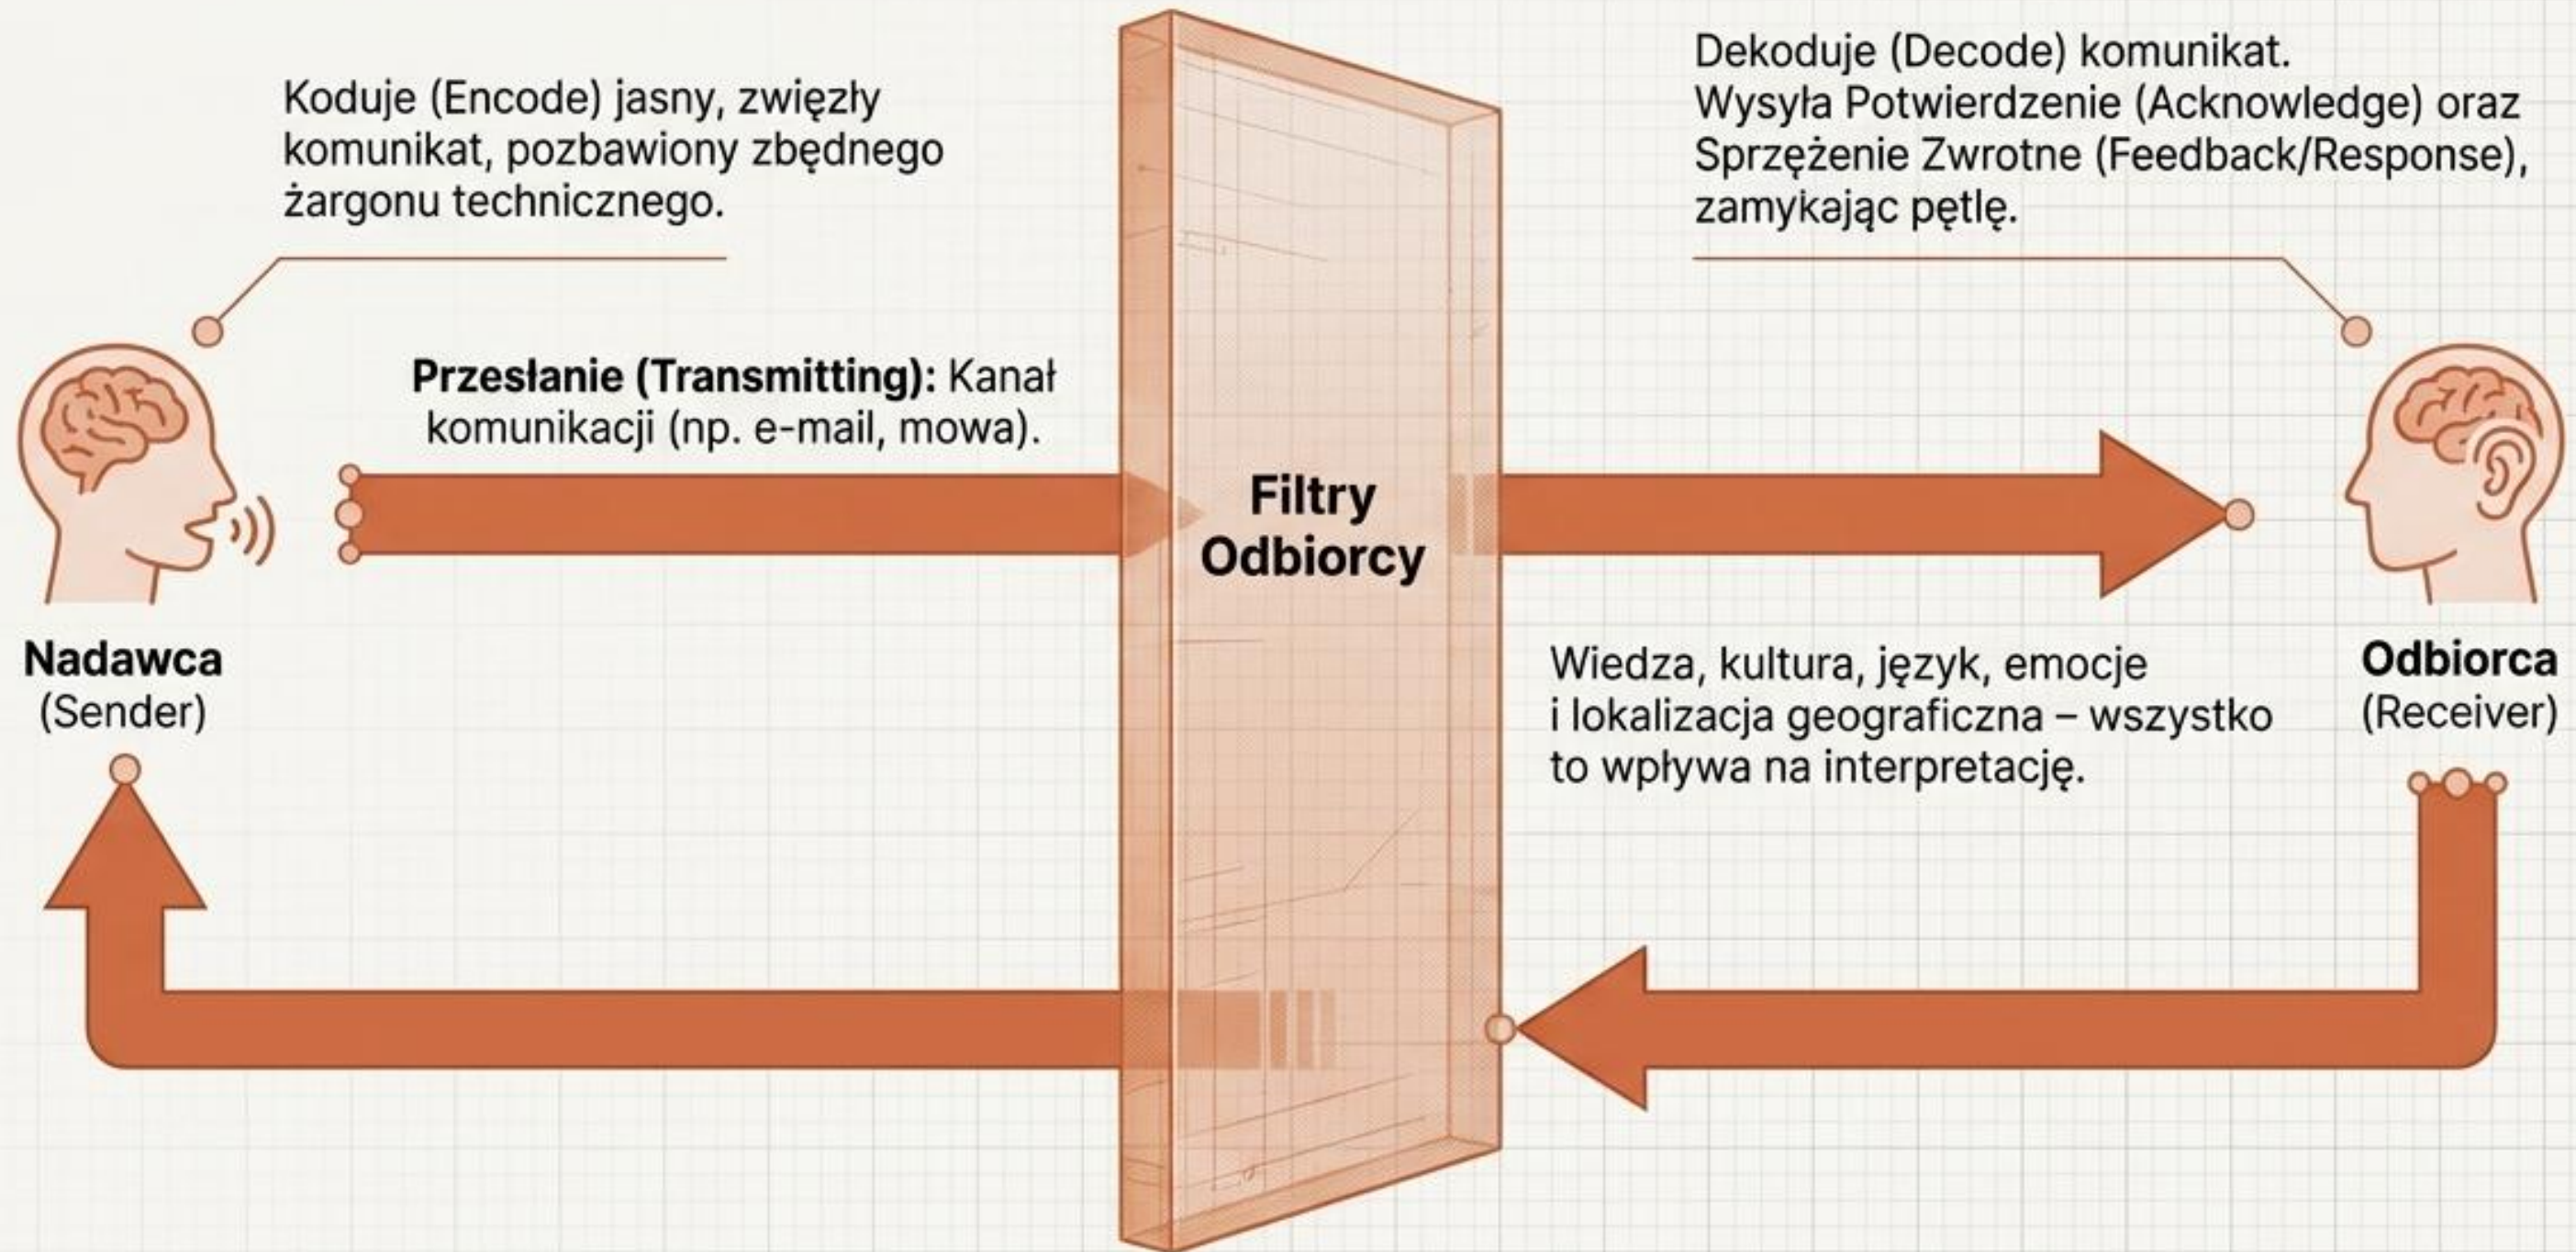

Dobór optymalnego kanału komunikacji

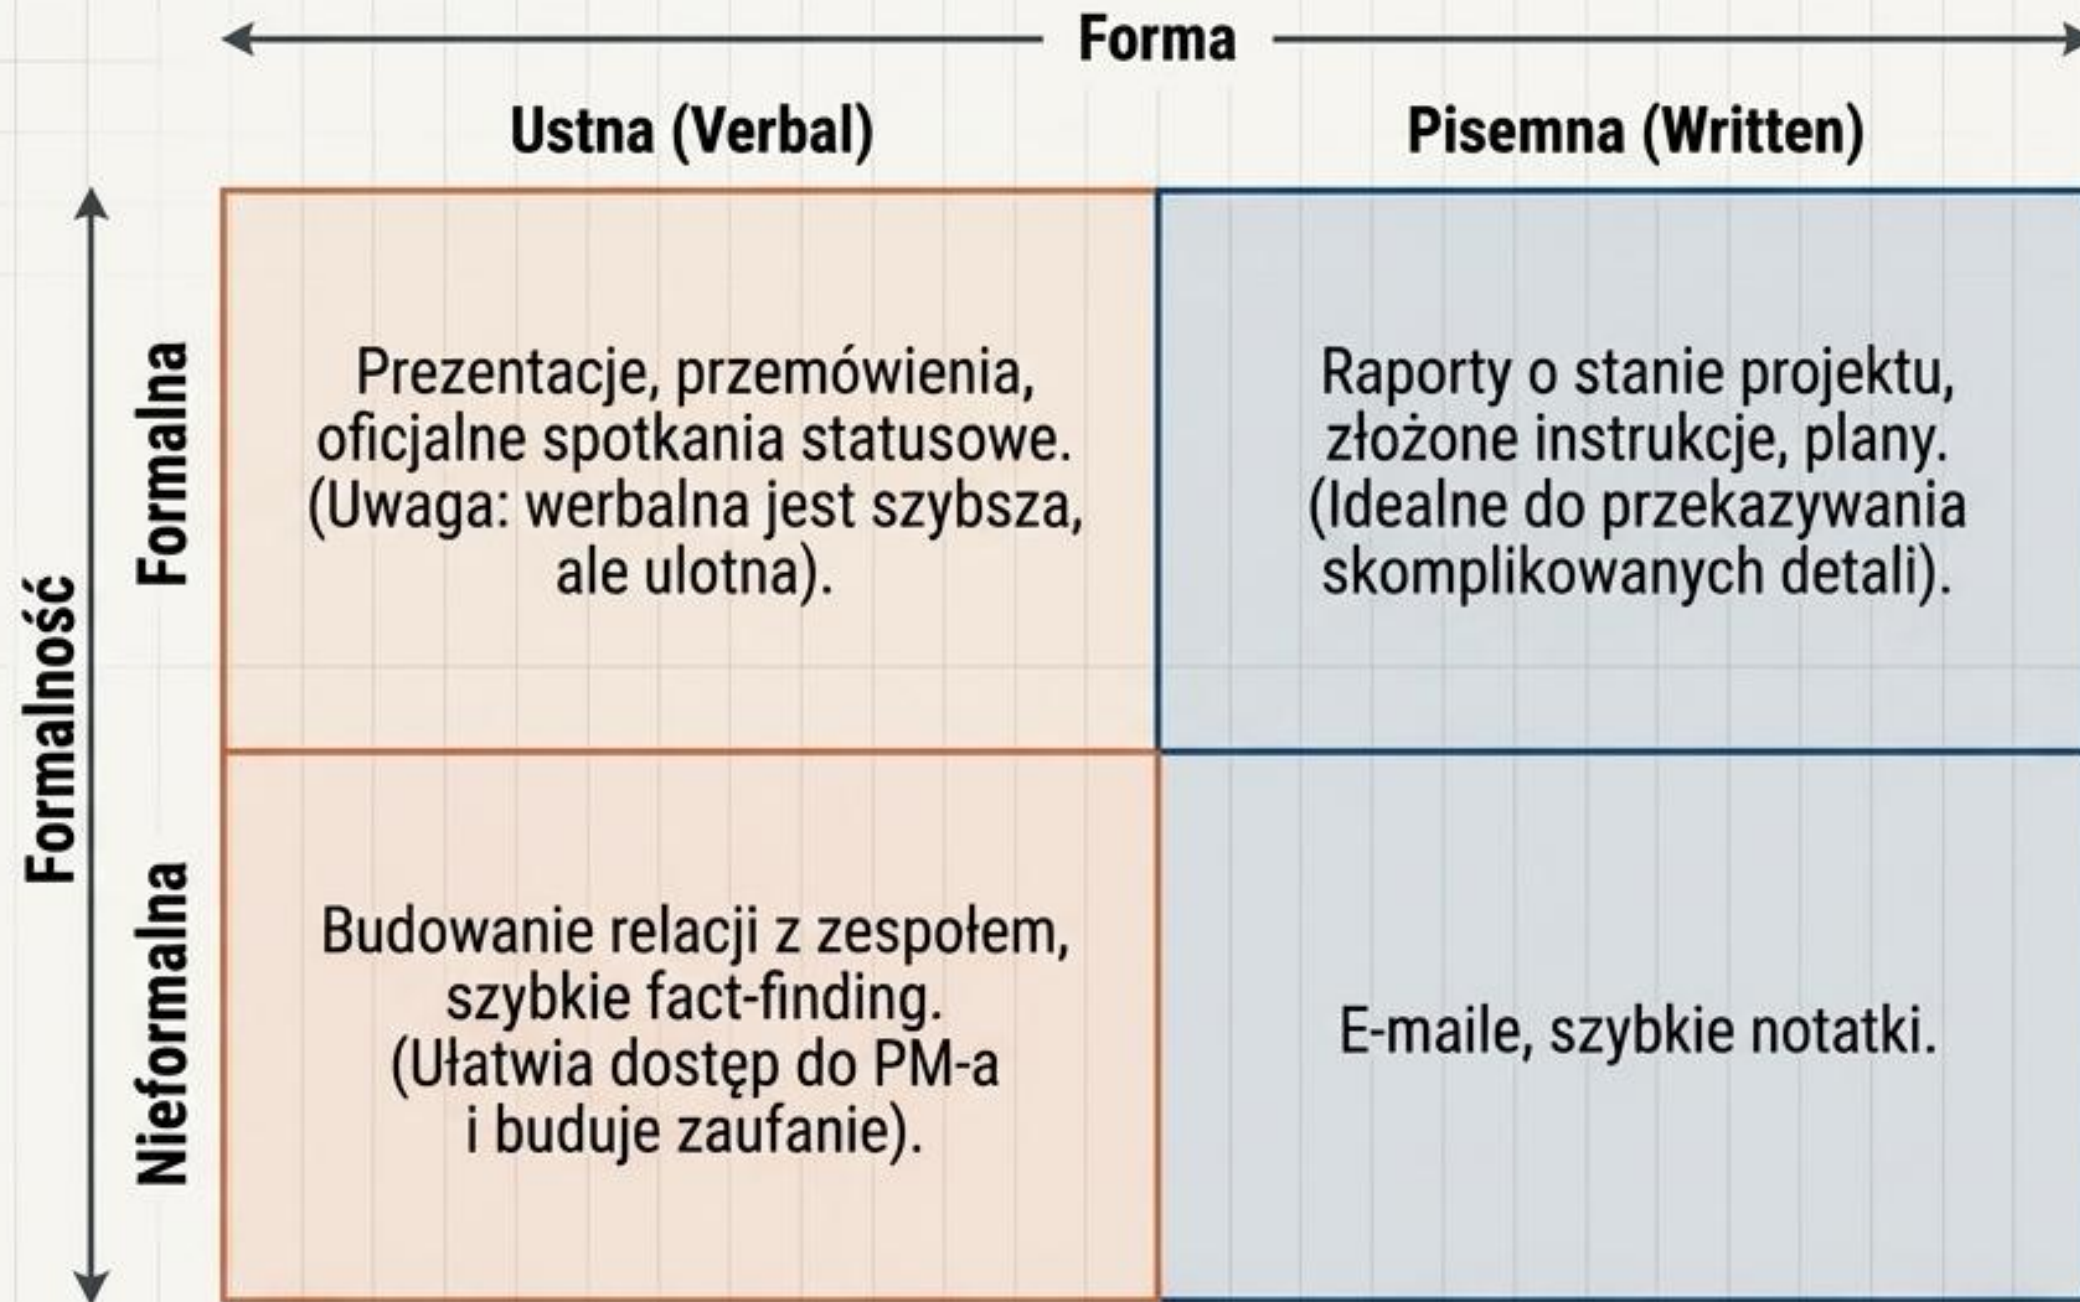

Złota Zasada PM-a: Aby komunikat został zapamiętany:
powiedz, o czym będziesz mówić -> powiedz to -> podsumuj, co właśnie powiedziałeś.

Złota Reguła PM-a: Aktywne Słuchanie

Ponad 90% czasu Project Managera to komunikacja.
Słuchanie jest ważniejsze niż umiejętności techniczne.



Zaangażowanie

Utrzymuj kontakt wzrokowy i otwartą postawę. Pokaż, że jesteś zainteresowany.



Parafrazowanie

„Jeśli dobrze rozumiem, masz na myśli...” – powtarzaj kluczowe informacje własnymi słowami.



Weryfikacja


Zrozum filtry nadawcy, potakuj i zadawaj pytania doprecyzowujące.



Brak przerw

Nie przerywaj mówcy. Wyjątek: ratowanie agendy oficjalnego spotkania (przenieś temat do trybu offline).

Zarządzanie Konfliktem Informacyjnym

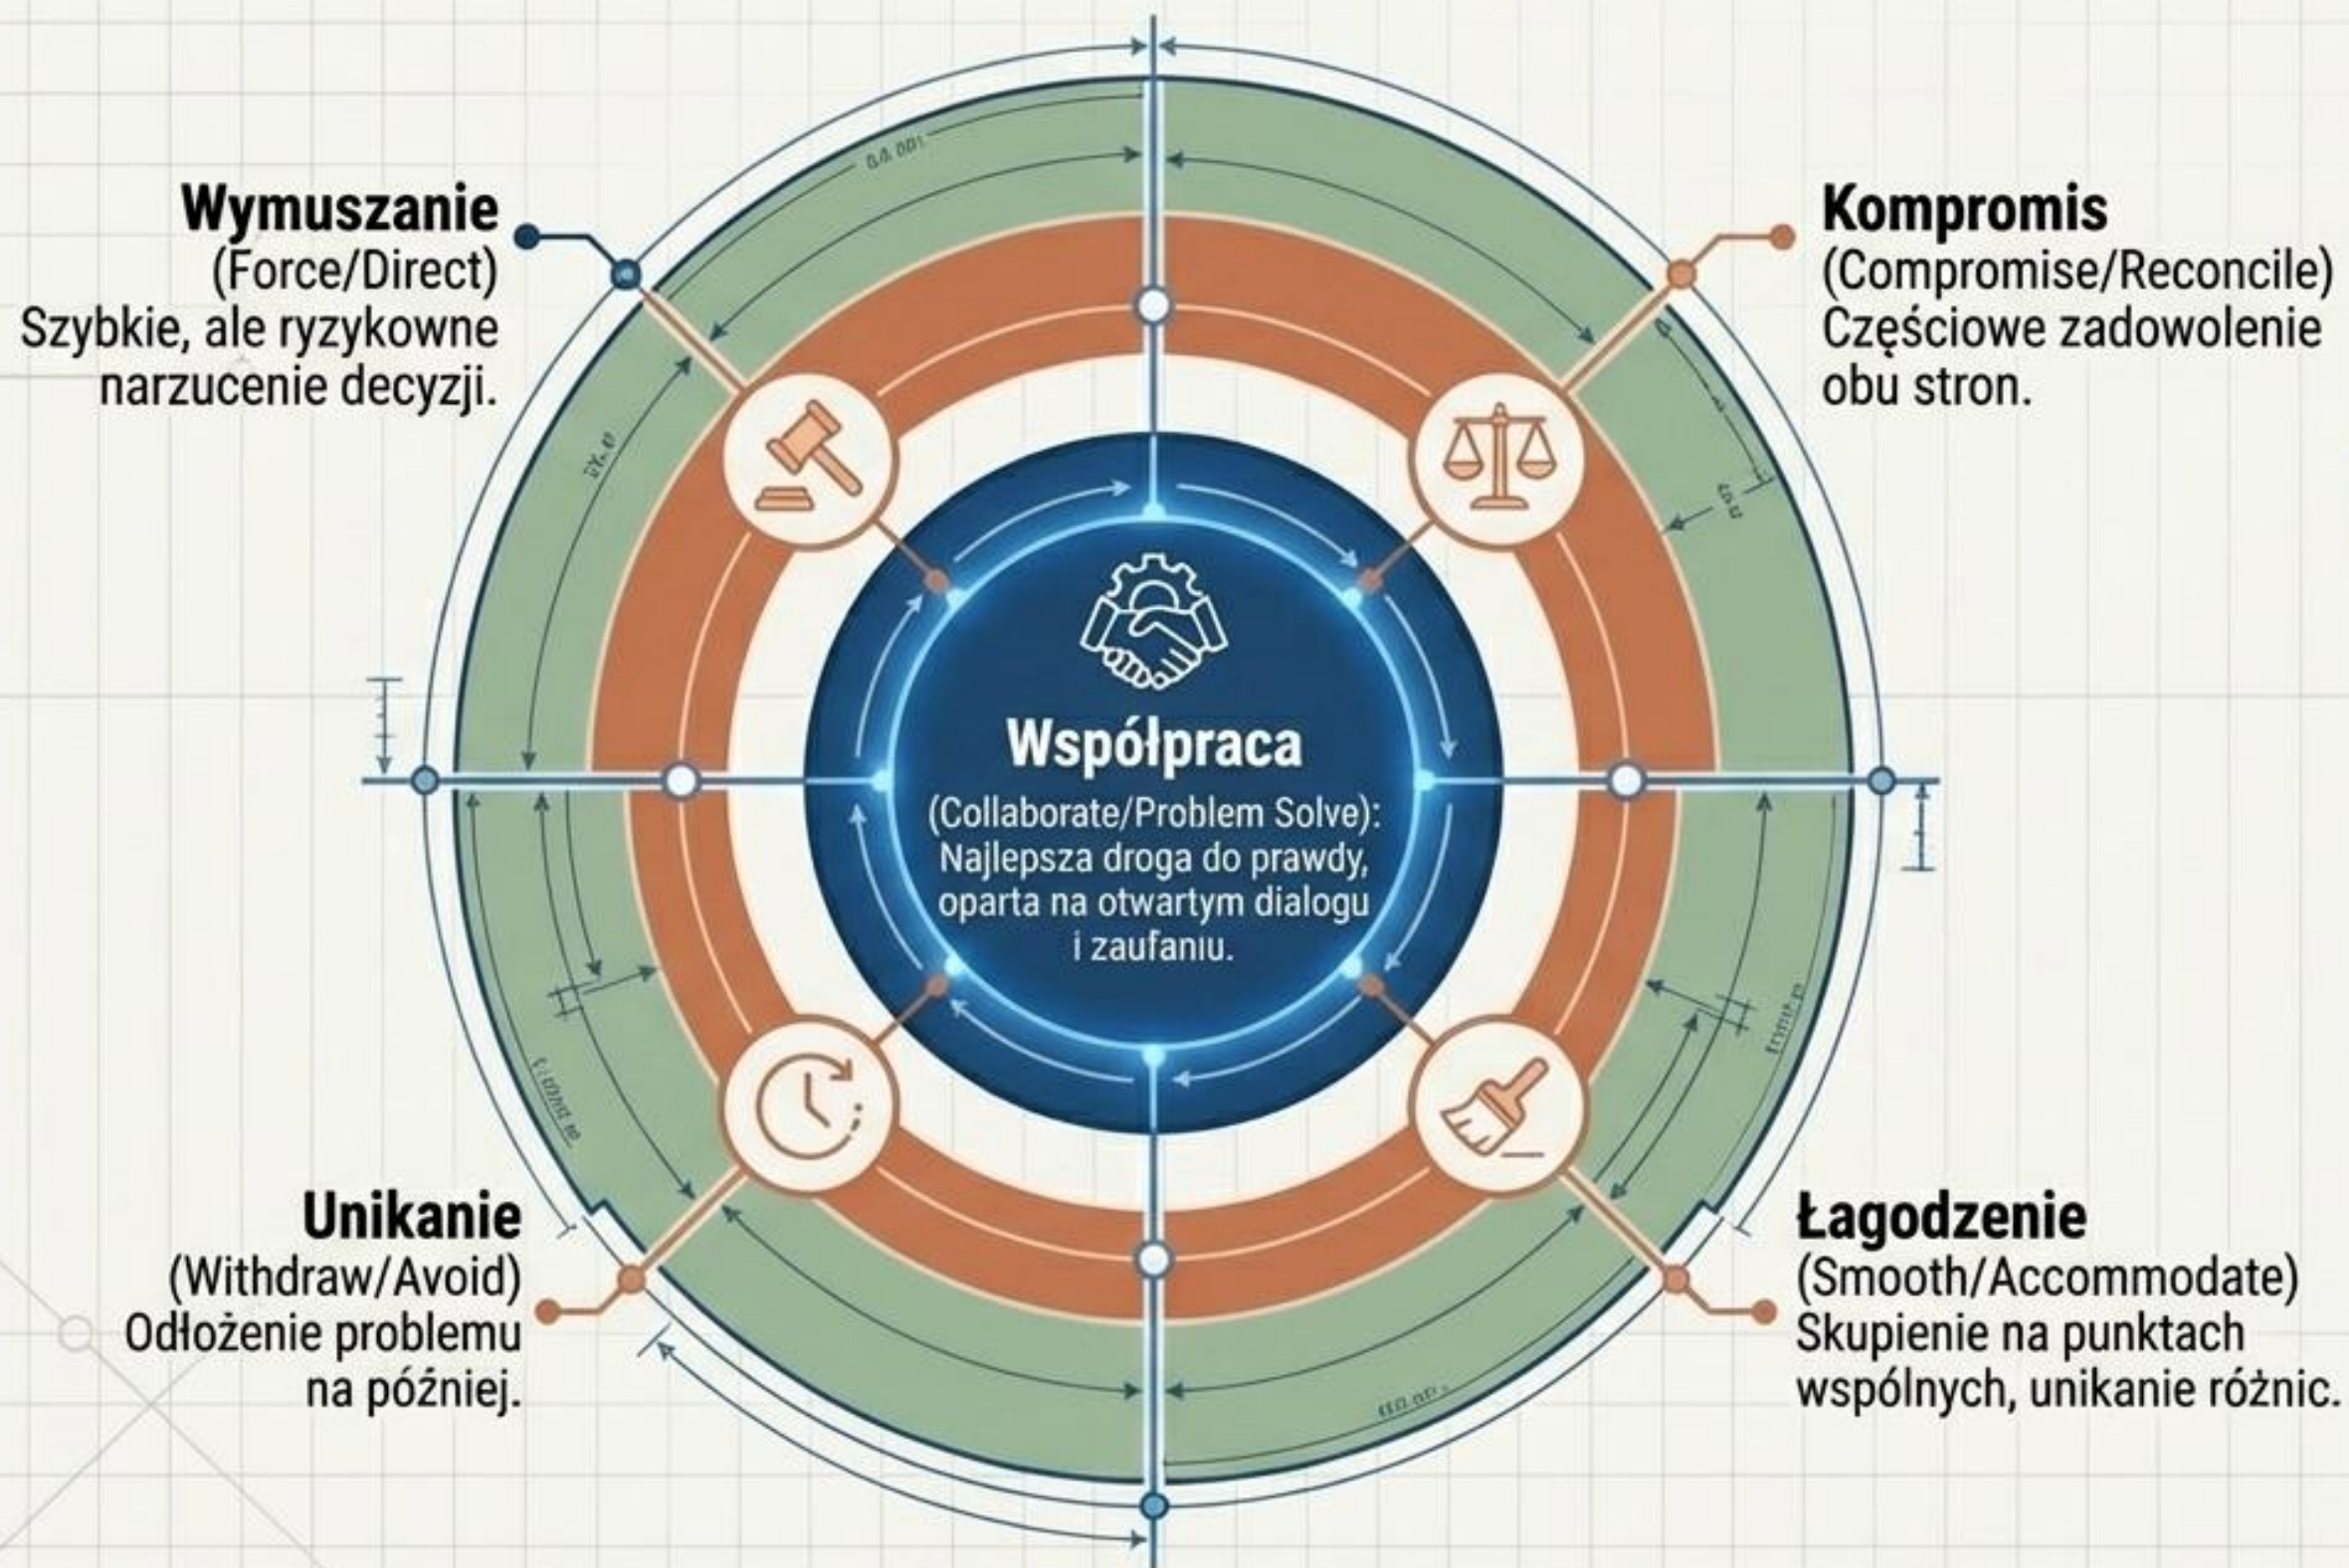

Wskazówka: Decyzje grupowe?

Zespoły liczące od 5 do 11 osób podejmują najbardziej trafne i precyzyjne decyzje!

Dystrybucja Wiedzy i Raportowanie (PMIS)

Systemy PMIS:

Narzędzia cyfrowe, e-mail, intranet, oprogramowanie do zarządzania (np. tablice, harmonogramy).

Raporty o Stanie Projektu:

- Postępy i procentowe ukończenie harmonogramu.
- Aktualizacje budżetu i ryzyk.
- Wnioski o zmianę (Change Requests).


Wskaźniki Zdrowia Projektu (RAG):

- - **Zielony**: Zgodnie z planem.
- - **Żółty**: Ostrzeżenie (wymaga monitorowania).
- - **Czerwony**: Zagrożenie (wymaga pilnej interwencji).



Zabezpieczanie Danych Projektowych (Aktualizacje OPA)

Informacje z projektu stają się historycznymi zasobami organizacji (Zasoby Procesów Organizacyjnych - OPA).

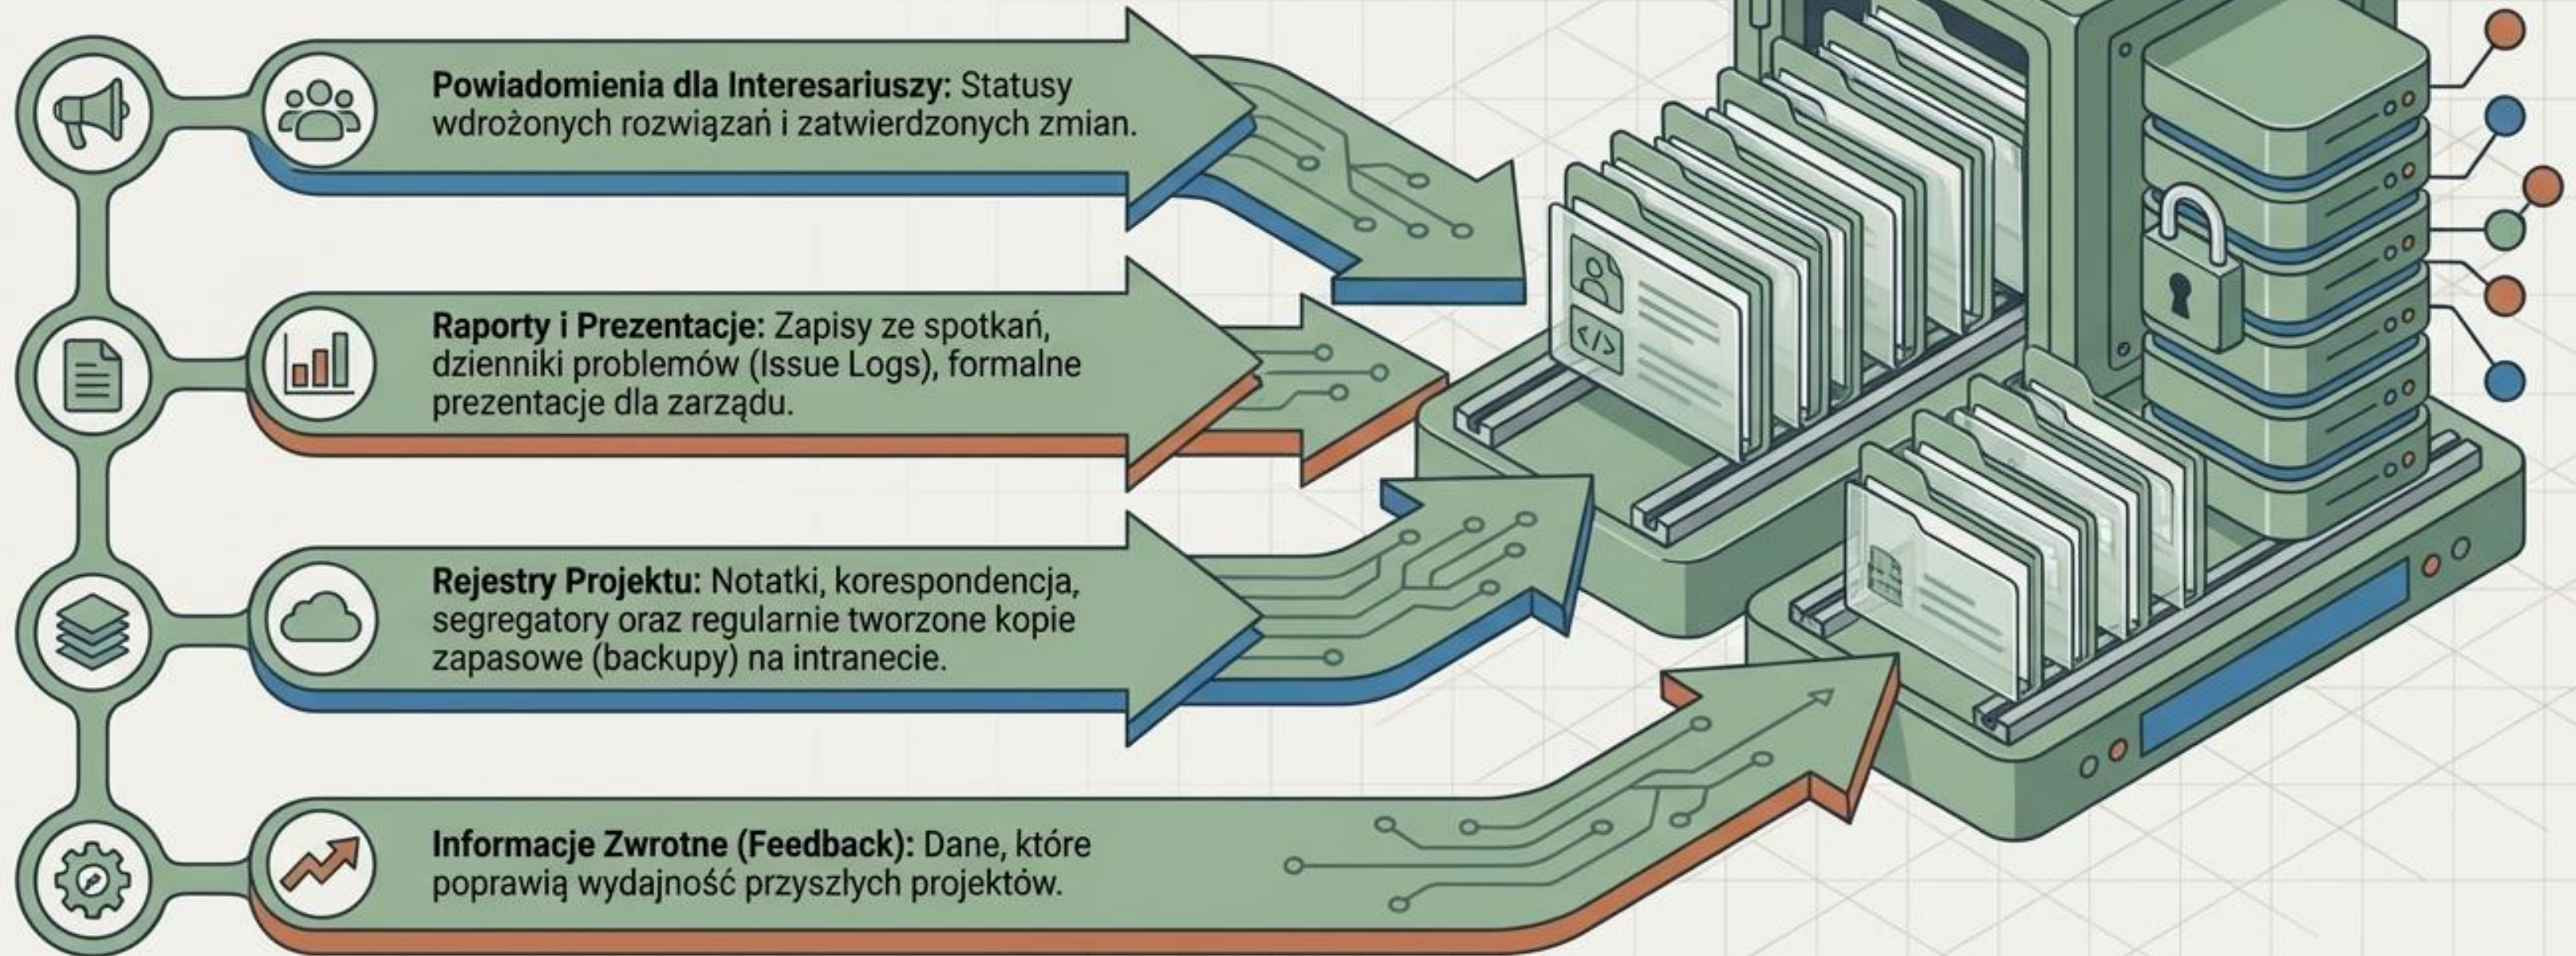

Najcenniejszy Zasób: Wyciągnięte Wnioski (Lessons Learned)




Co to jest?

Zbiór pozytywnych i negatywnych doświadczeń z całego cyklu życia projektu (co poszło dobrze i dlaczego, co poszło źle i dlaczego).



Kiedy przeprowadzać?

Zawsze na koniec fazy projektowej oraz na koniec całego projektu (minimum).

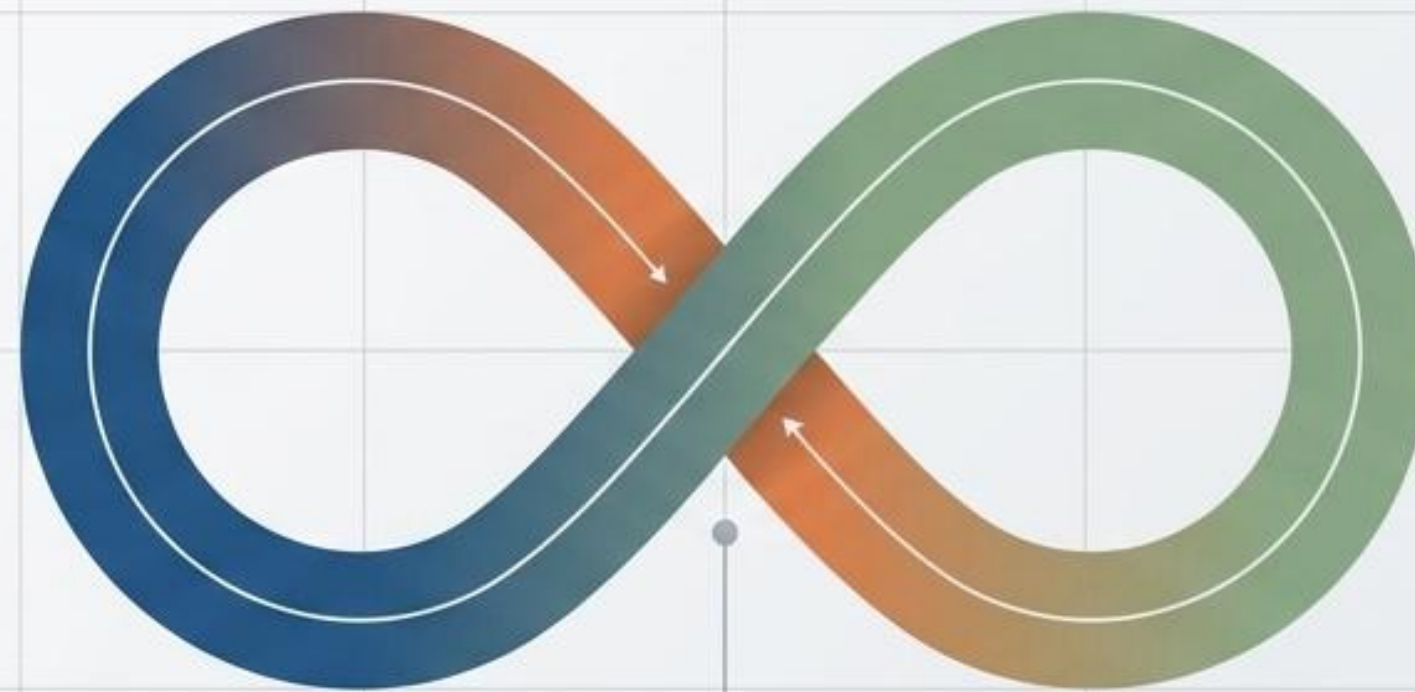

Złota Zasada (Zaufanie, nie obwinianie): To spotkanie nie służy szukaniu winnych (no finger-pointing). Celem jest budowa zaufania i ulepszanie przyszłych procesów.

Exam Spotlight



Zgodnie z PMBOK, organizacja spotkań Lessons Learned jest profesjonalnym obowiązkiem (professional obligation) każdego Project Managera!

Architektura Informacji PM-a: Podsumowanie

