



Certyfikat PMP: Cykl życia Projektu

Przewodnik wizualny po fazach i grupach
procesów PMBOK®

Autor: dr Zbigniew Galar


Metafora Projektu: Od narodzin do usamodzielnienia

Dashboard Timeline



Kluczowy wniosek: Każdy projekt – niezależnie od skali – ma naturalny początek, środek i koniec.


Fazy a Cykl Życia Projektu (Makro-perspektywa)

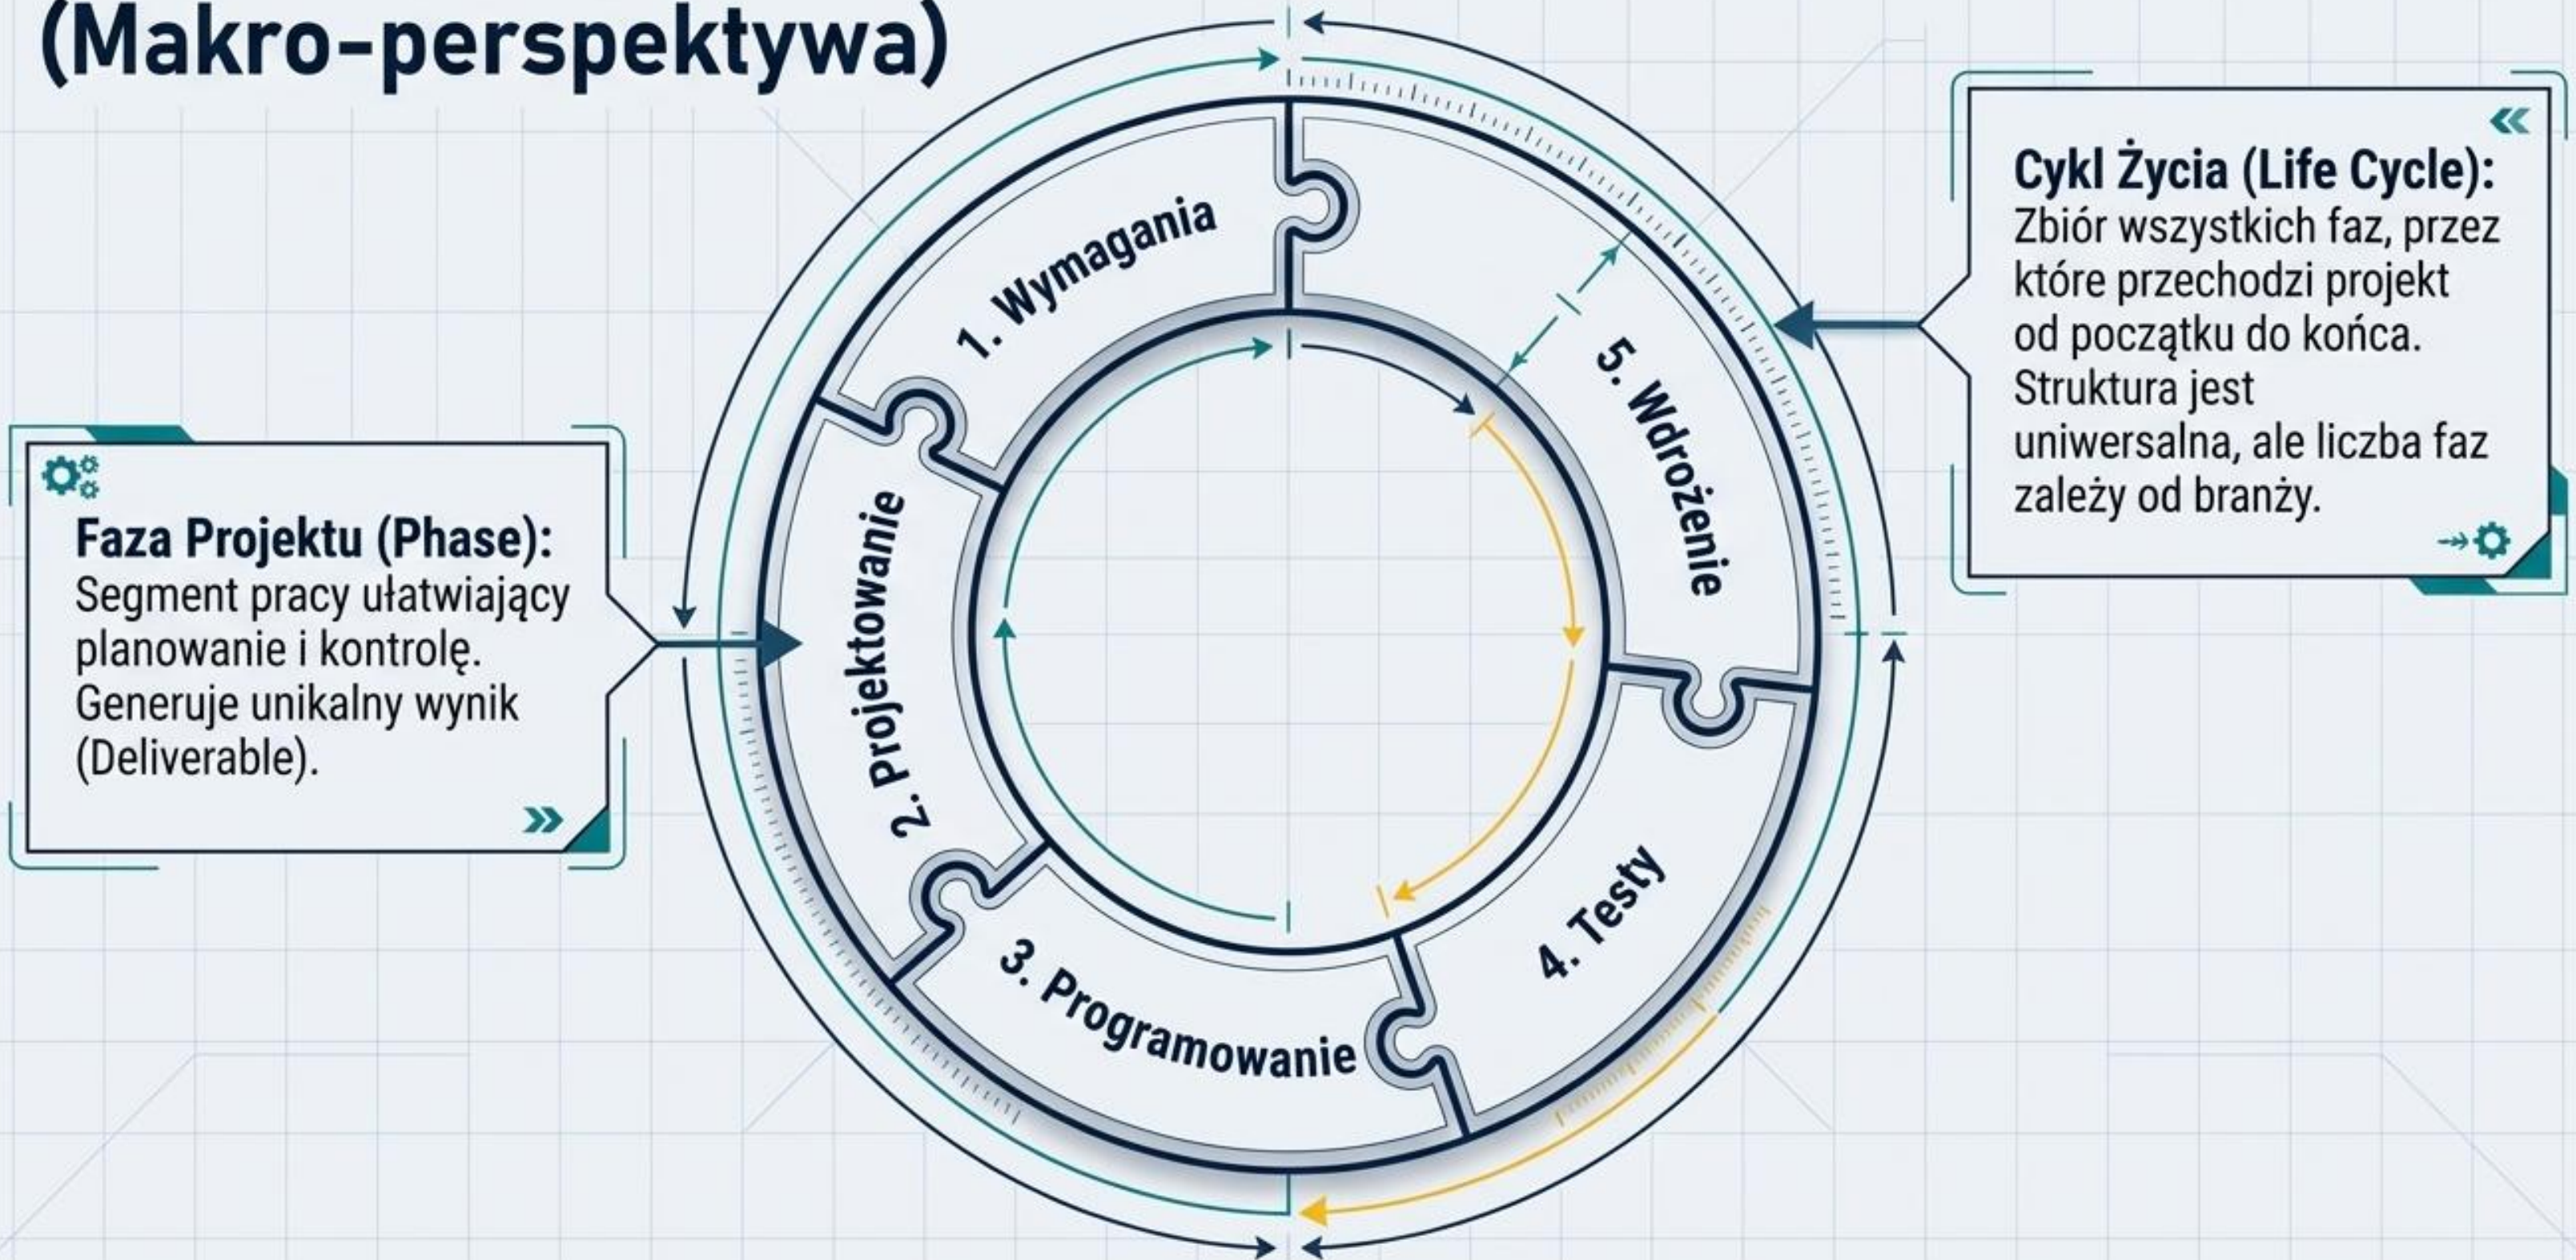

Trzy Kategorie Cykli Życia (Według PMBOK®)

	 Predykcyjny (Waterfall)	 Iteracyjno- Inkrementalny	 Adaptacyjny (Zwinny / Agile)
Definicja Zakresu	Zdefiniowany na samym początku. Ścisła kontrola zmian.	Stopniowo doprecyzowywany w trakcie prac.	Elastyczny, odkrywany na bieżąco.
Budżet i Harmonogram	Ustalane wcześniej i rygorystycznie.	Ciągle korygowane w miarę definiowania produktu.	Krótkie, stałe interwały czasowe (2-4 tyg.) i stałe zasoby.
Kiedy stosować?	Przewidywalne, dobrze znane środowisko.	Duże, bardzo złożone projekty.	Zmienne środowisko, wymóg ciągłej współpracy z interesariuszami.

Przekazania (Handoffs) i Bramy Fazowe

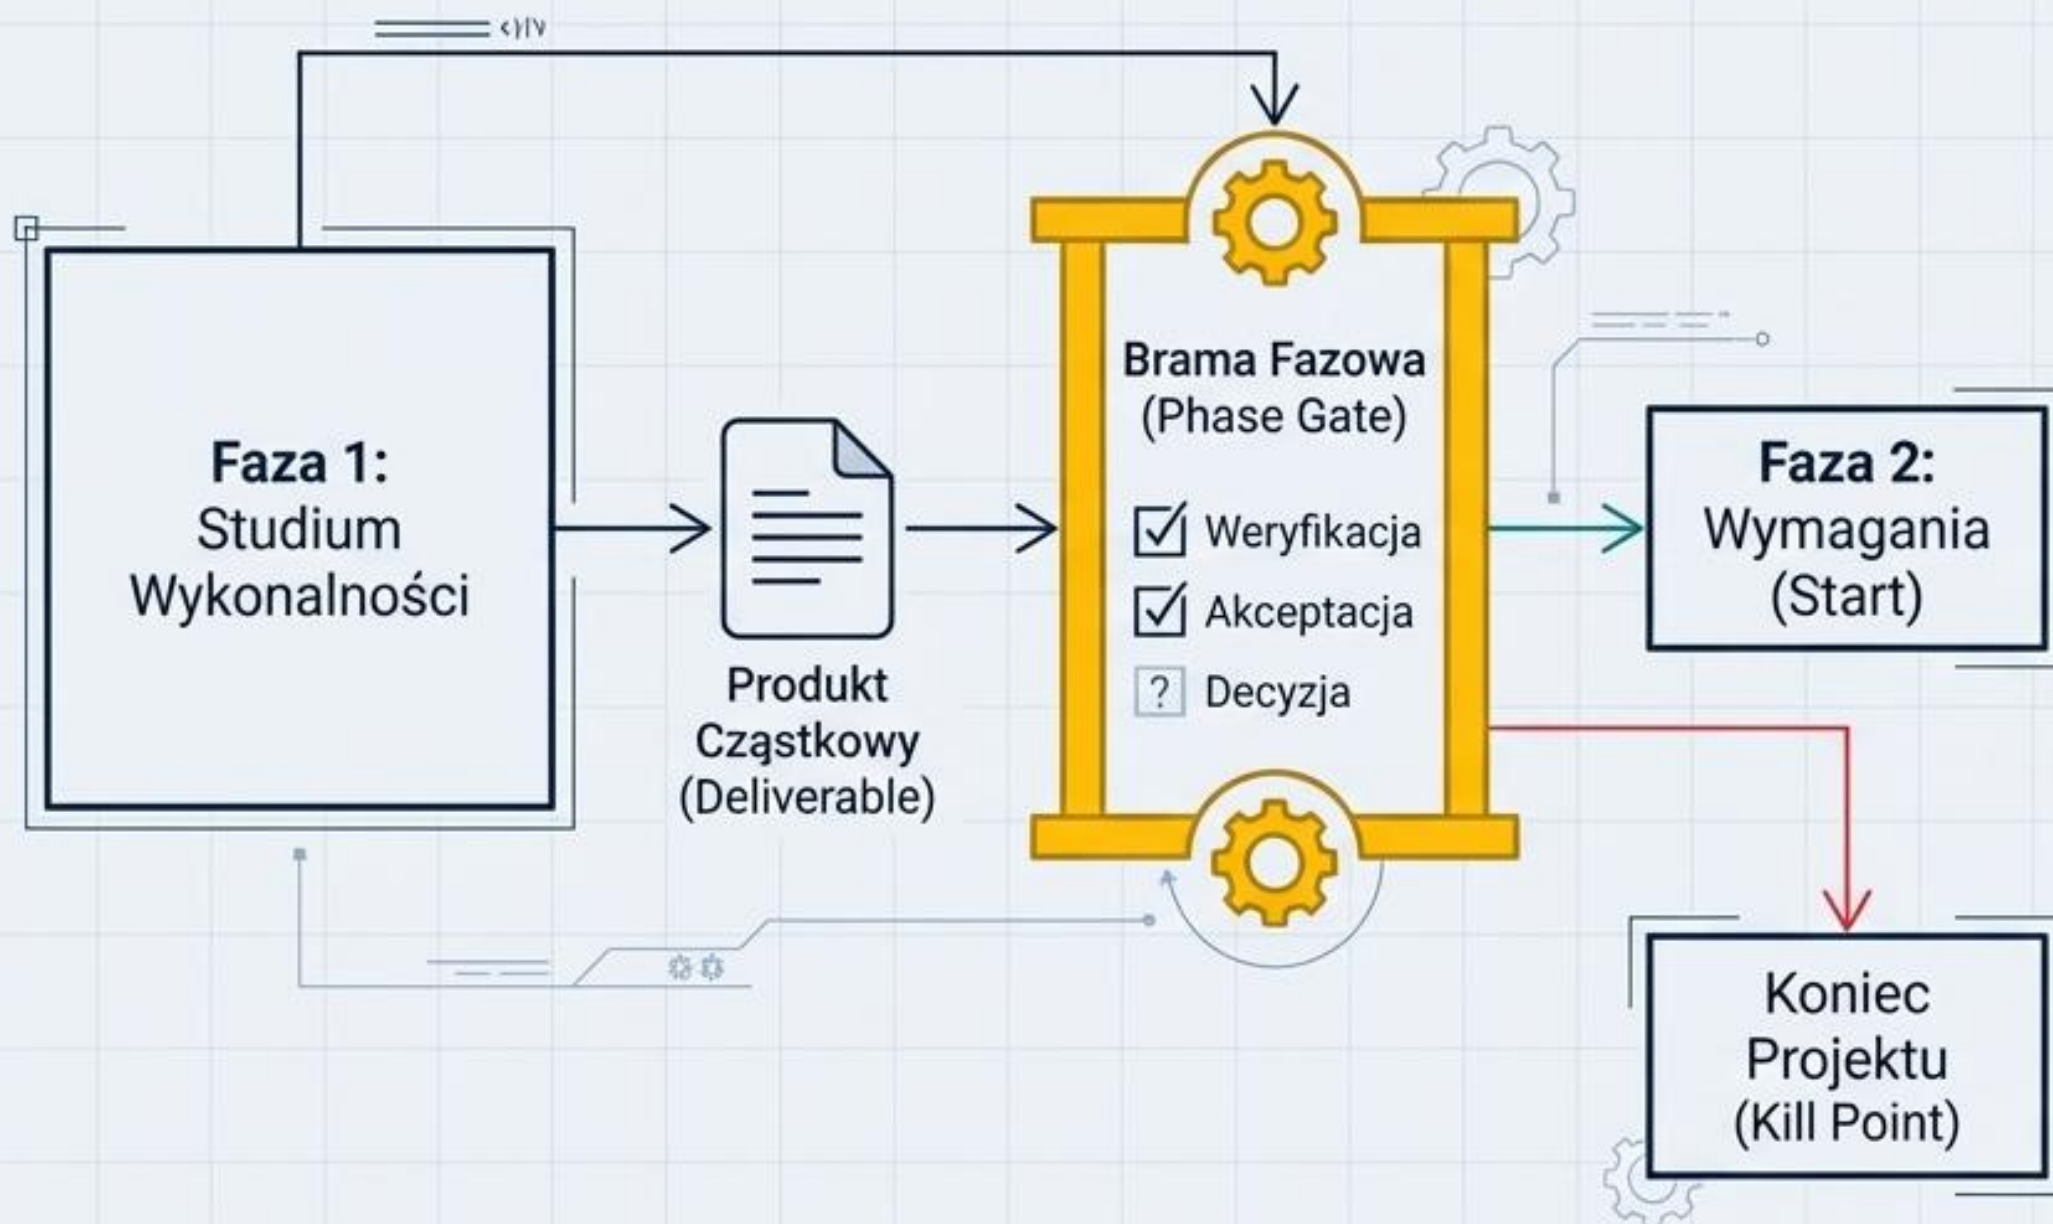


Rezultat: Każda faza kończy się namacalnym, weryfikowalnym rezultatem (Deliverable).

Decyzja Go / No-go: Udań zakończenie jednej fazy nie gwarantuje startu kolejnej. Projekt może zostać tu zamknięty.

Nomenklatura PMI:
Znane również jako: phase exits, stage gates, phase reviews, kill points.


Relacje Międzyfazowe: Sekwencyjne vs. Nakładające się

Relacja Sekwencyjna

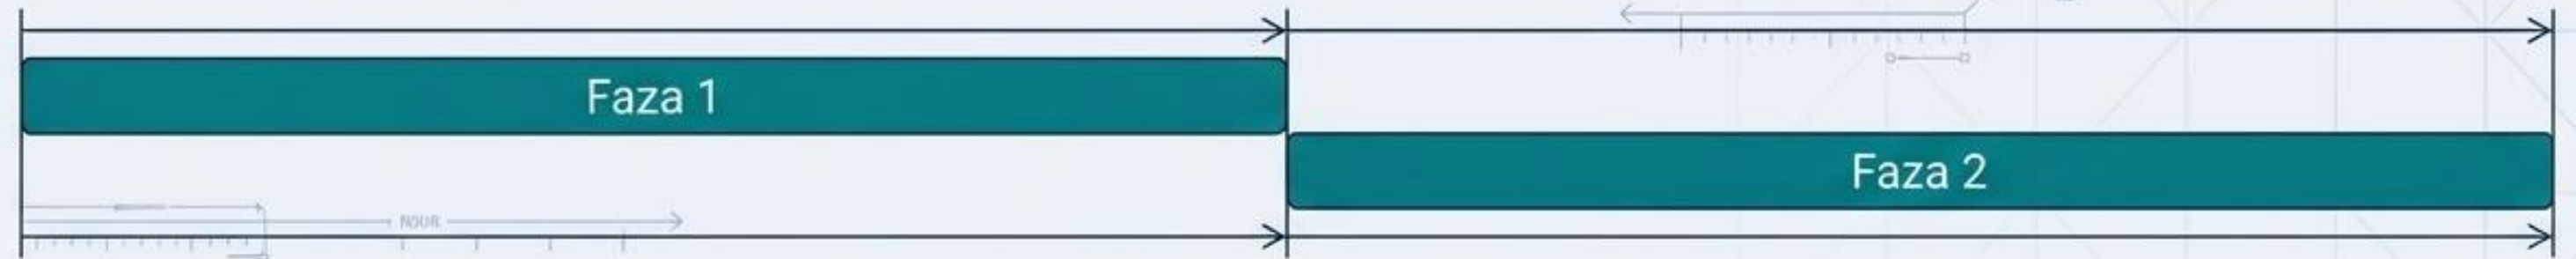

Krok po kroku: Faza musi zostać całkowicie zakończona, by kolejna mogła wystartować.

Relacja Nakładająca się / Fast tracking

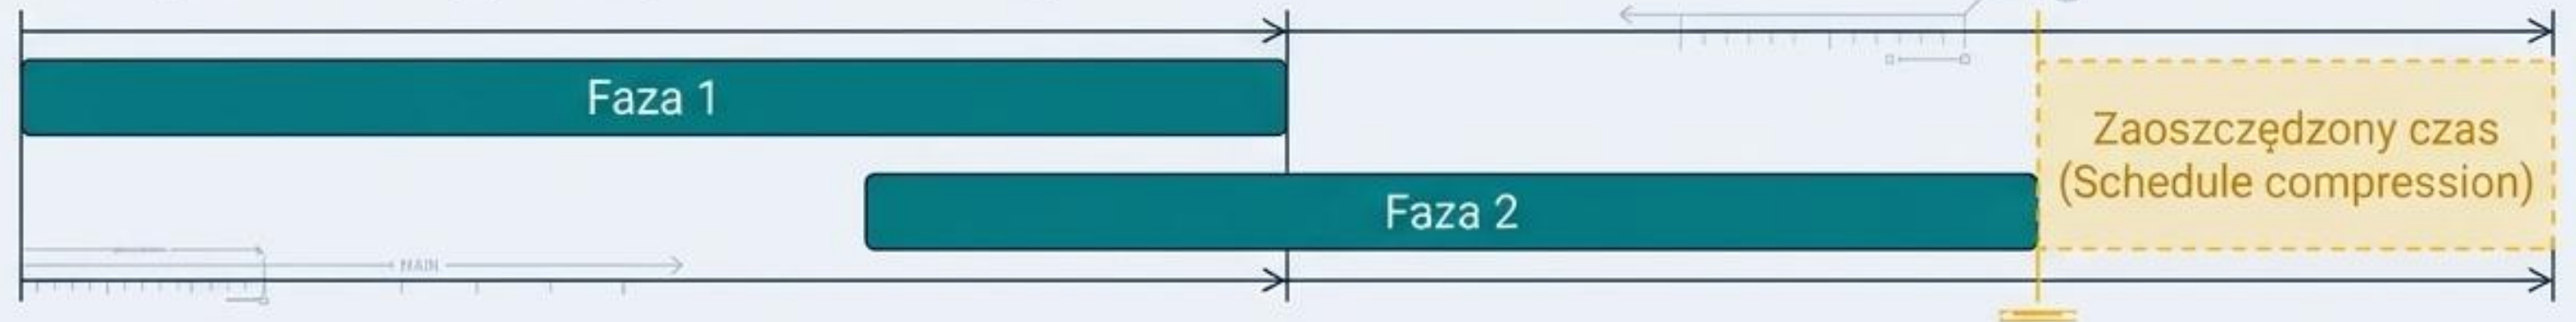

Fast tracking: Nakładanie faz w celu skrócenia harmonogramu. Zwiększa tempo, ale drastycznie podnosi ryzyko.

Dynamika Zmiennych w Cyklu Życia Projektu



Wniosek: Zmiana parametrów w czasie to naturalna właściwość projektów. Zarządzanie ułatwia kontrolowanie tych krzywych.

UWAGA: Fazy Projektu a Grupy Procesów

Fazy i Cykle Życia



Skupione na PRODUKCIE i BRANŻY.

Opisują co i jak technicznie budujemy (np. Studium Wykonalności, Design, Konstrukcja). Różnią się drastycznie w zależności od rodzaju projektu.

Grupy Procesów Zarządzania




Skupione na ZARZĄDZANIU.

Opisują jak organizujemy pracę zespołu w celu spełnienia wymagań. Są w 100% uniwersalne, niezależnie od tego, czy budujesz most, czy tworzysz oprogramowanie.



Złota zasada: Nie myl cyklu życia, który buduje produkt, z procesami, które zarządzają pracą!

5 Grup Procesów Zarządzania Projektami (IPECC)

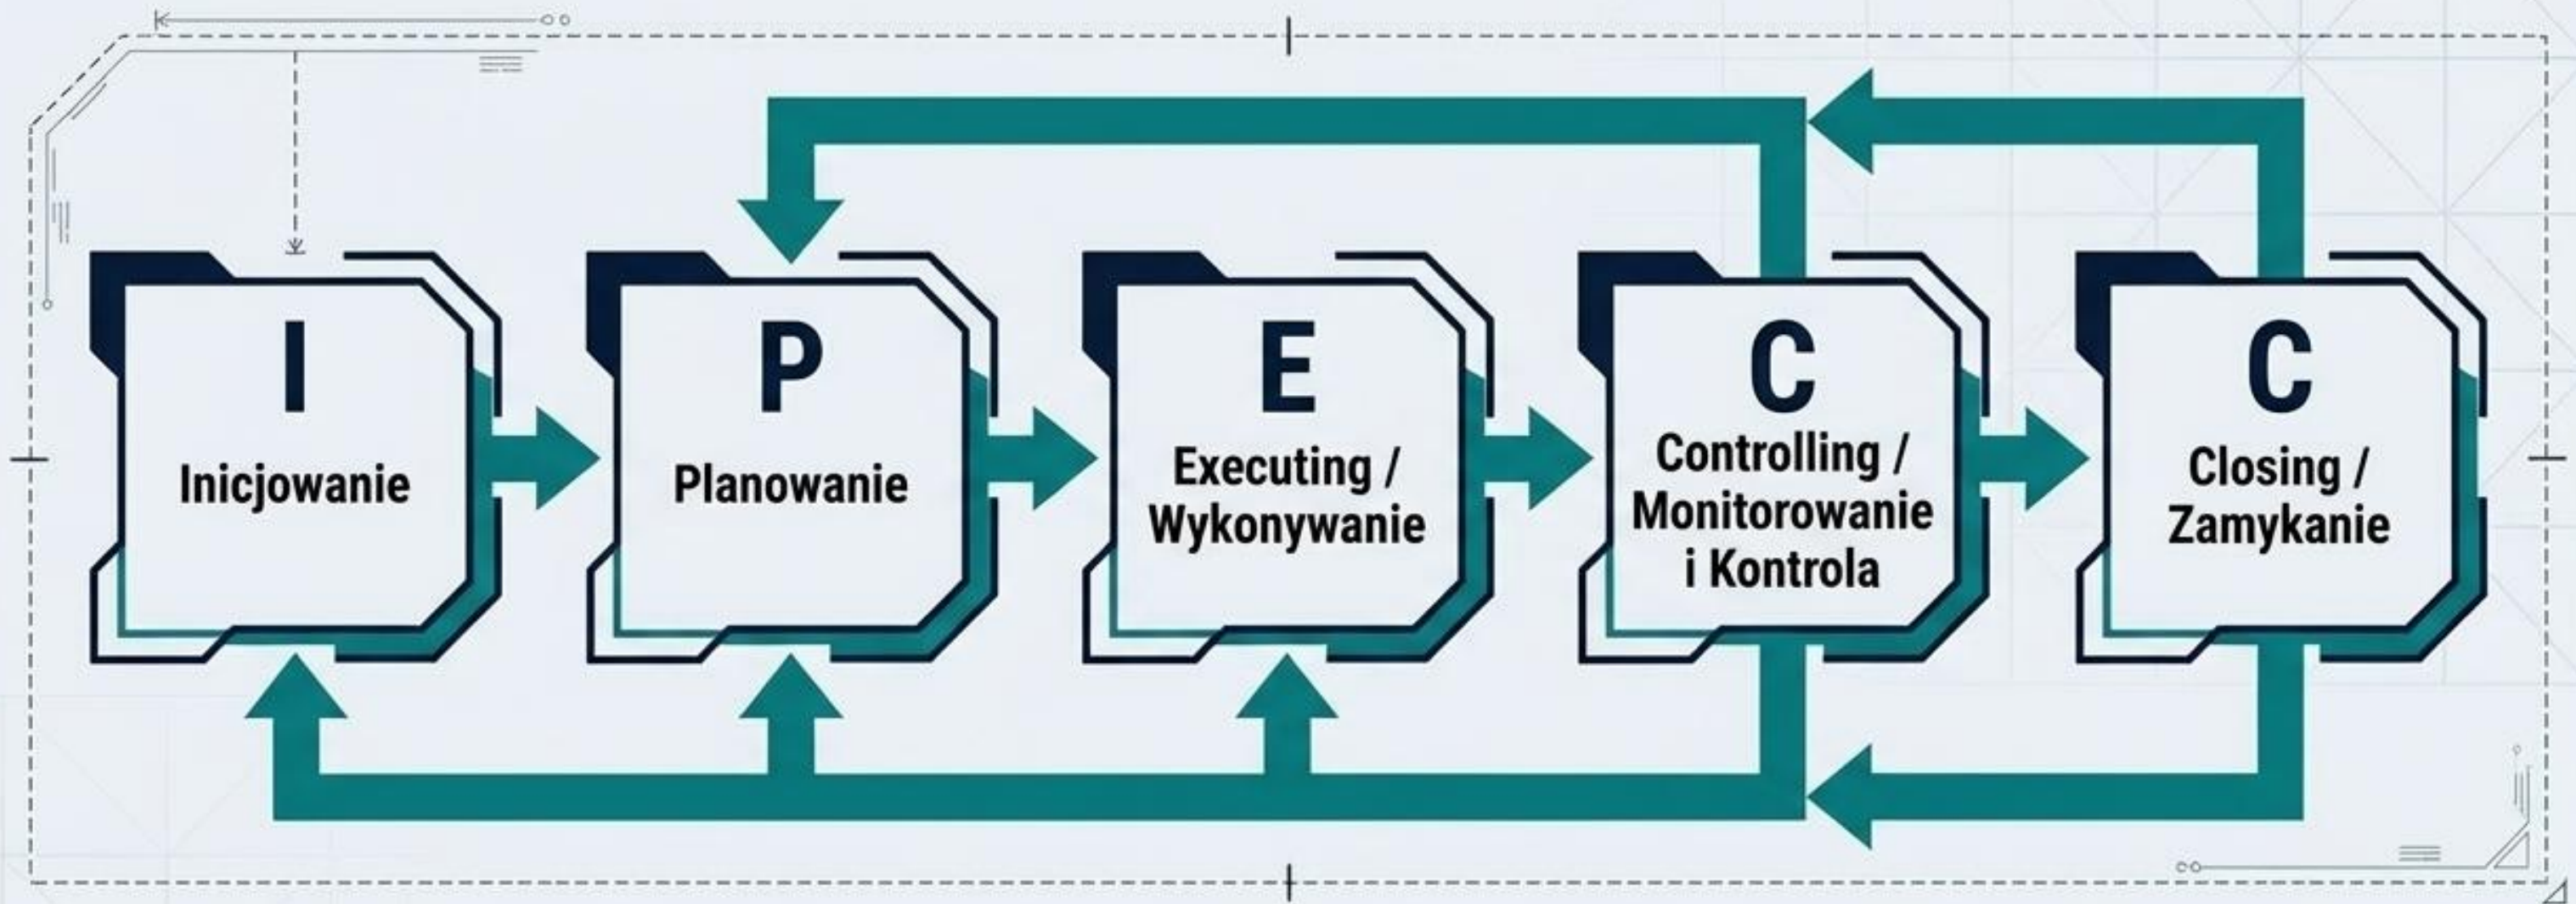

- **Ludzie i Zależności:** Procesy to działania wykonywane przez ludzi, ściśle zależne od siebie nawzajem.



- **Iteracyjność:** Nie są jednorazowe. Nakładają się na siebie i powtarzają w pętlach.



- **Serce PMBOK:** To właśnie te 5 grup organizuje i definiuje codzienną pracę kierownika projektu.

Anatomia Procesów: Inicjowanie i Planowanie

Inicjowanie (Initiating)




- **Cel:** Oficjalna autoryzacja projektu lub nowej fazy. Zapewnienie zasobów organizacji.
- **Główne procesy:** Opracowanie Karty Projektu (Project Charter) oraz Identyfikacja Interesariuszy.
- **Klucz:** Wyjścia (Outputs) z tego etapu stają się bezpośrednimi wejściami (Inputs) do Planowania.

Planowanie (Planning)



- **Cel:** Ustalenie celów, zakresu, budżetu, harmonogramu i zarządzania ryzykiem.
- **Charakterystyka:** Zawiera najwięcej procesów ze wszystkich grup! Obejmuje wszystkie obszary wiedzy.
- **Wyzwanie:** Wymaga ciągłej priorytetyzacji i wielokrotnych iteracji (Plan-Do-Check-Act).

Anatomia Procesów: Wykonywanie (Executing)

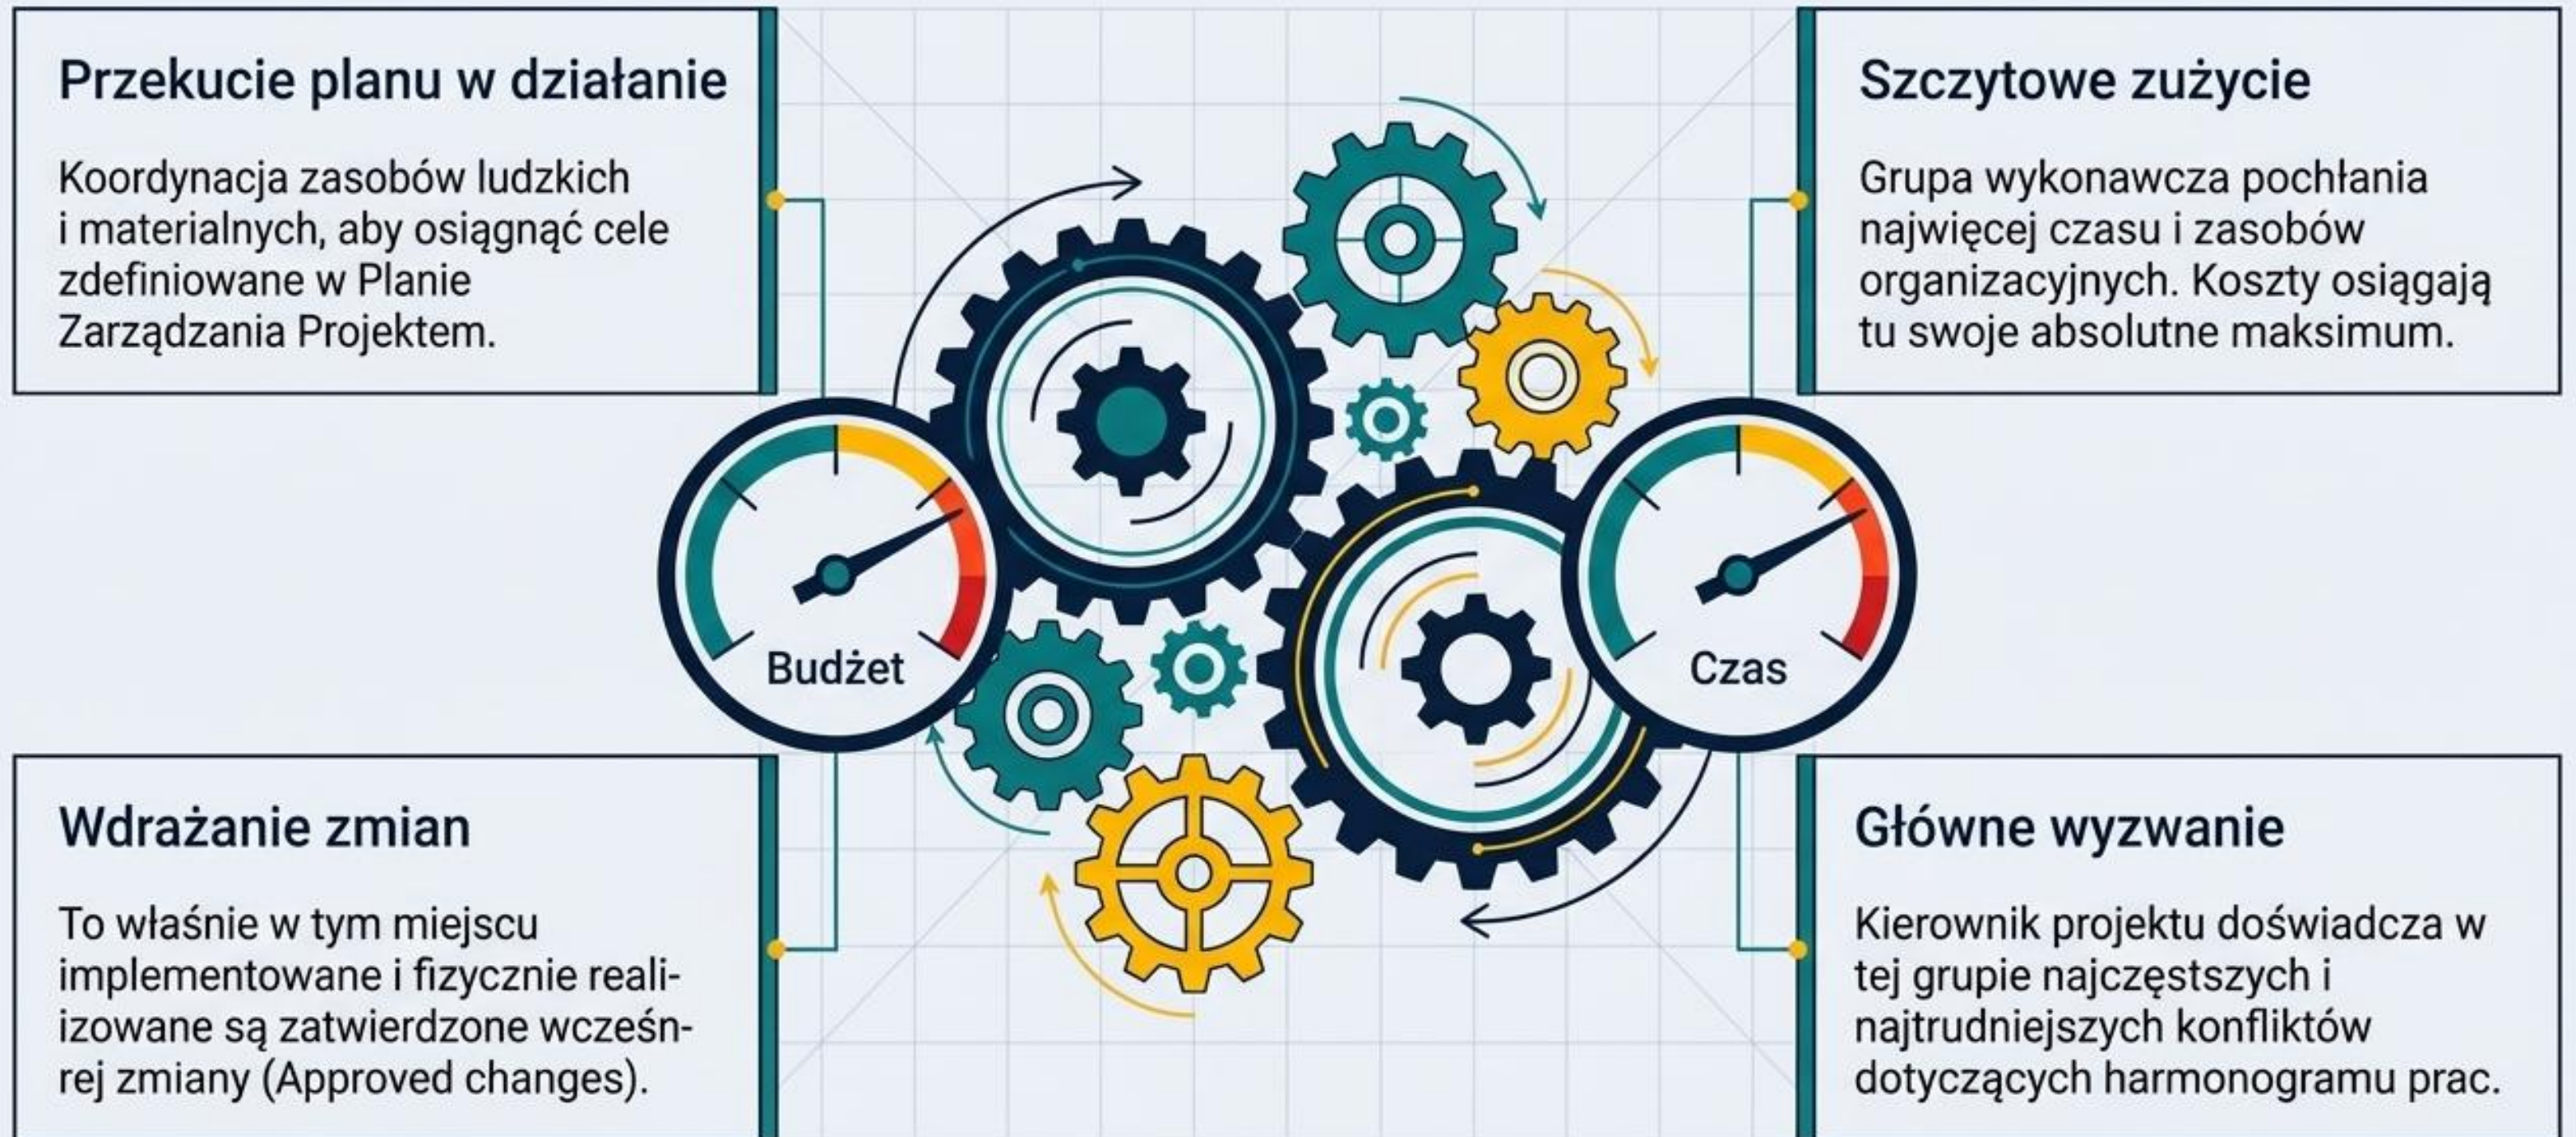

Anatomia Procesów: Kontrola i Zamykanie



Monitorowanie i Kontrolowanie (M&C)

- **Cel:** Śledzenie postępów i systematyczna identyfikacja odchyleń od planu bazowego.

Mechanizm: Wykrycie błędu uruchamia działania korygujące (Corrective action), co często cofa nas z powrotem do grupy Planowania w celu korekty harmonogramu.



Zamykanie (Closing)


- **Cel:** Formalne i uporządkowane zakończenie działań. Odbiór kontraktów, archiwizacja dokumentacji.

Złota zasada: Proces zamykania jest **OBOWIĄZKOWY** dla każdego projektu. Obowiązuje nawet wtedy, gdy projekt został przedwcześnie anulowany (killed). Gromadzimy tu Lessons Learned.

Zmienność Parametrów w Grupach Procesów


	Inicjowanie	Planowanie	Wykonywanie	Monitorowanie	Zamykanie
1. Koszty	Niski	Niski	NAJWYŻSZY	Niższy	Najniższy
2. Poziom zatrudnienia	Najniższy	Niski	WYSOKI	WYSOKI	Niski
3. Szansa na sukces	Najniższa	Niska	Średnia	Wysoka	NAJWYŻSZA
4. Wpływ interesariuszy	NAJWYŻSZY	Wysoki	Średni	Niski	Najniższy
5. Ryzyko (Prawdopodobieństwo)	NAJWYŻSZE	Wysokie	Średnie	Niskie	Najniższe

Cykl Deminga (PDCA) a Iteracyjność Procesów

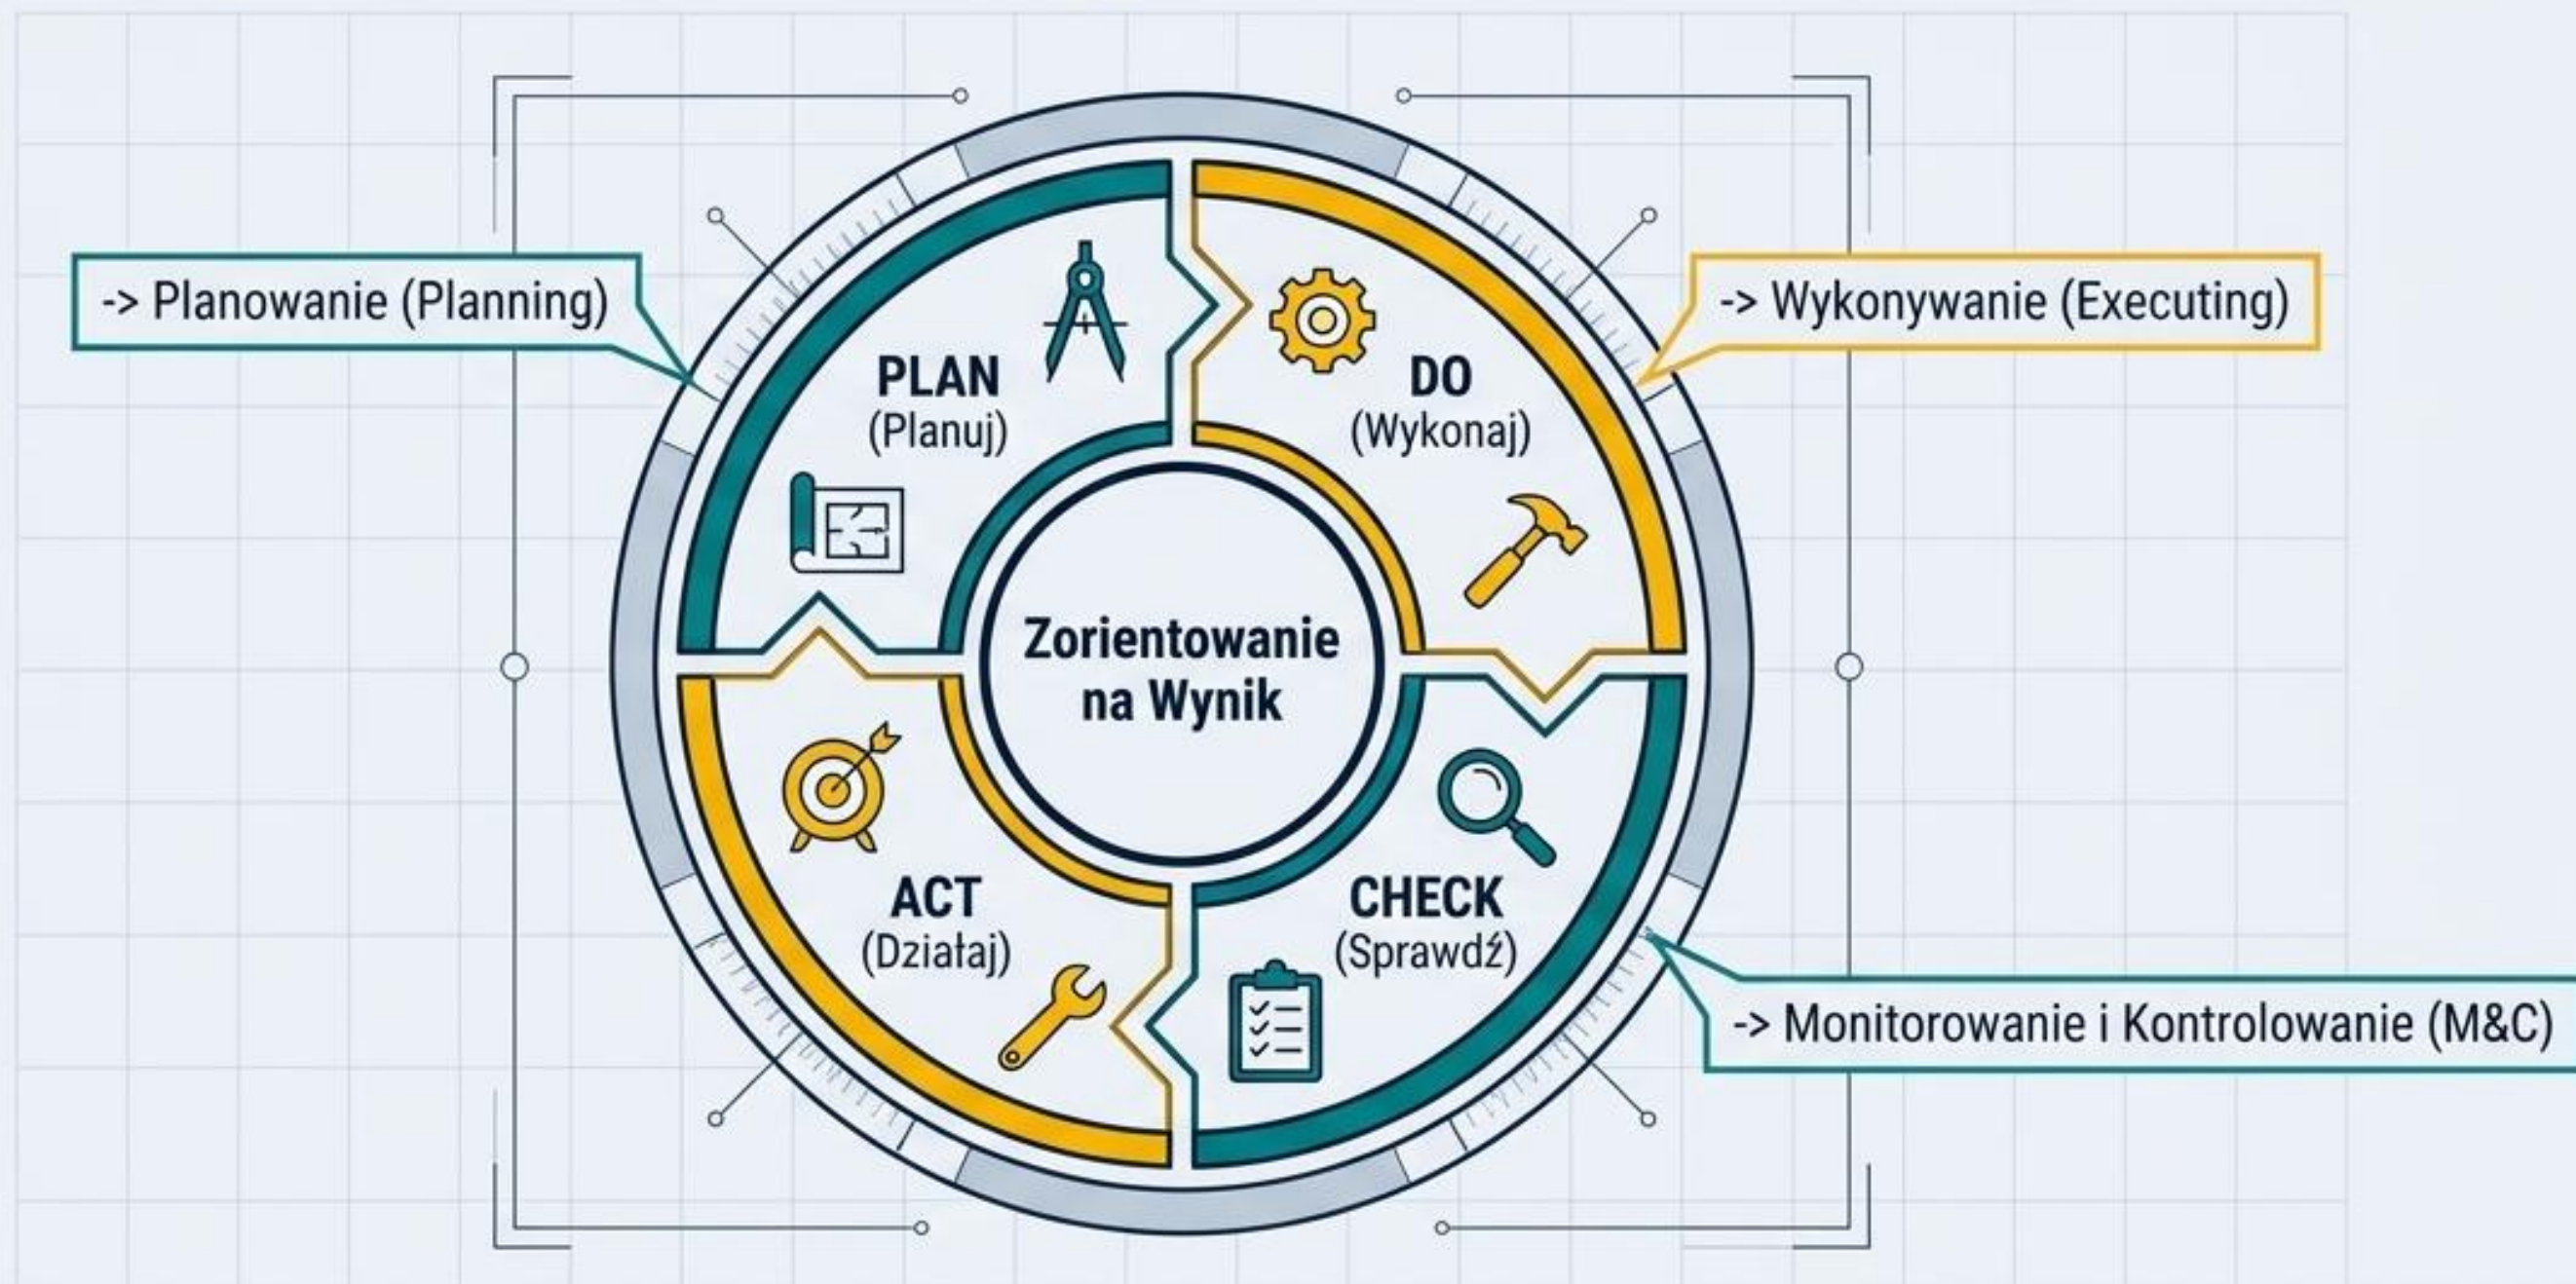

Koncepcja W. Shewharta i E. Deminga udowadnia, że zarządzanie to proces ciągły. Zakończenie każdej grupy procesów zmusza do weryfikacji celów biznesowych: czy wciąż zaspokajamy potrzeby, dla których projekt powstał?

Wielki Obraz: Jak Procesy Zagnieżdżają się w Fazach

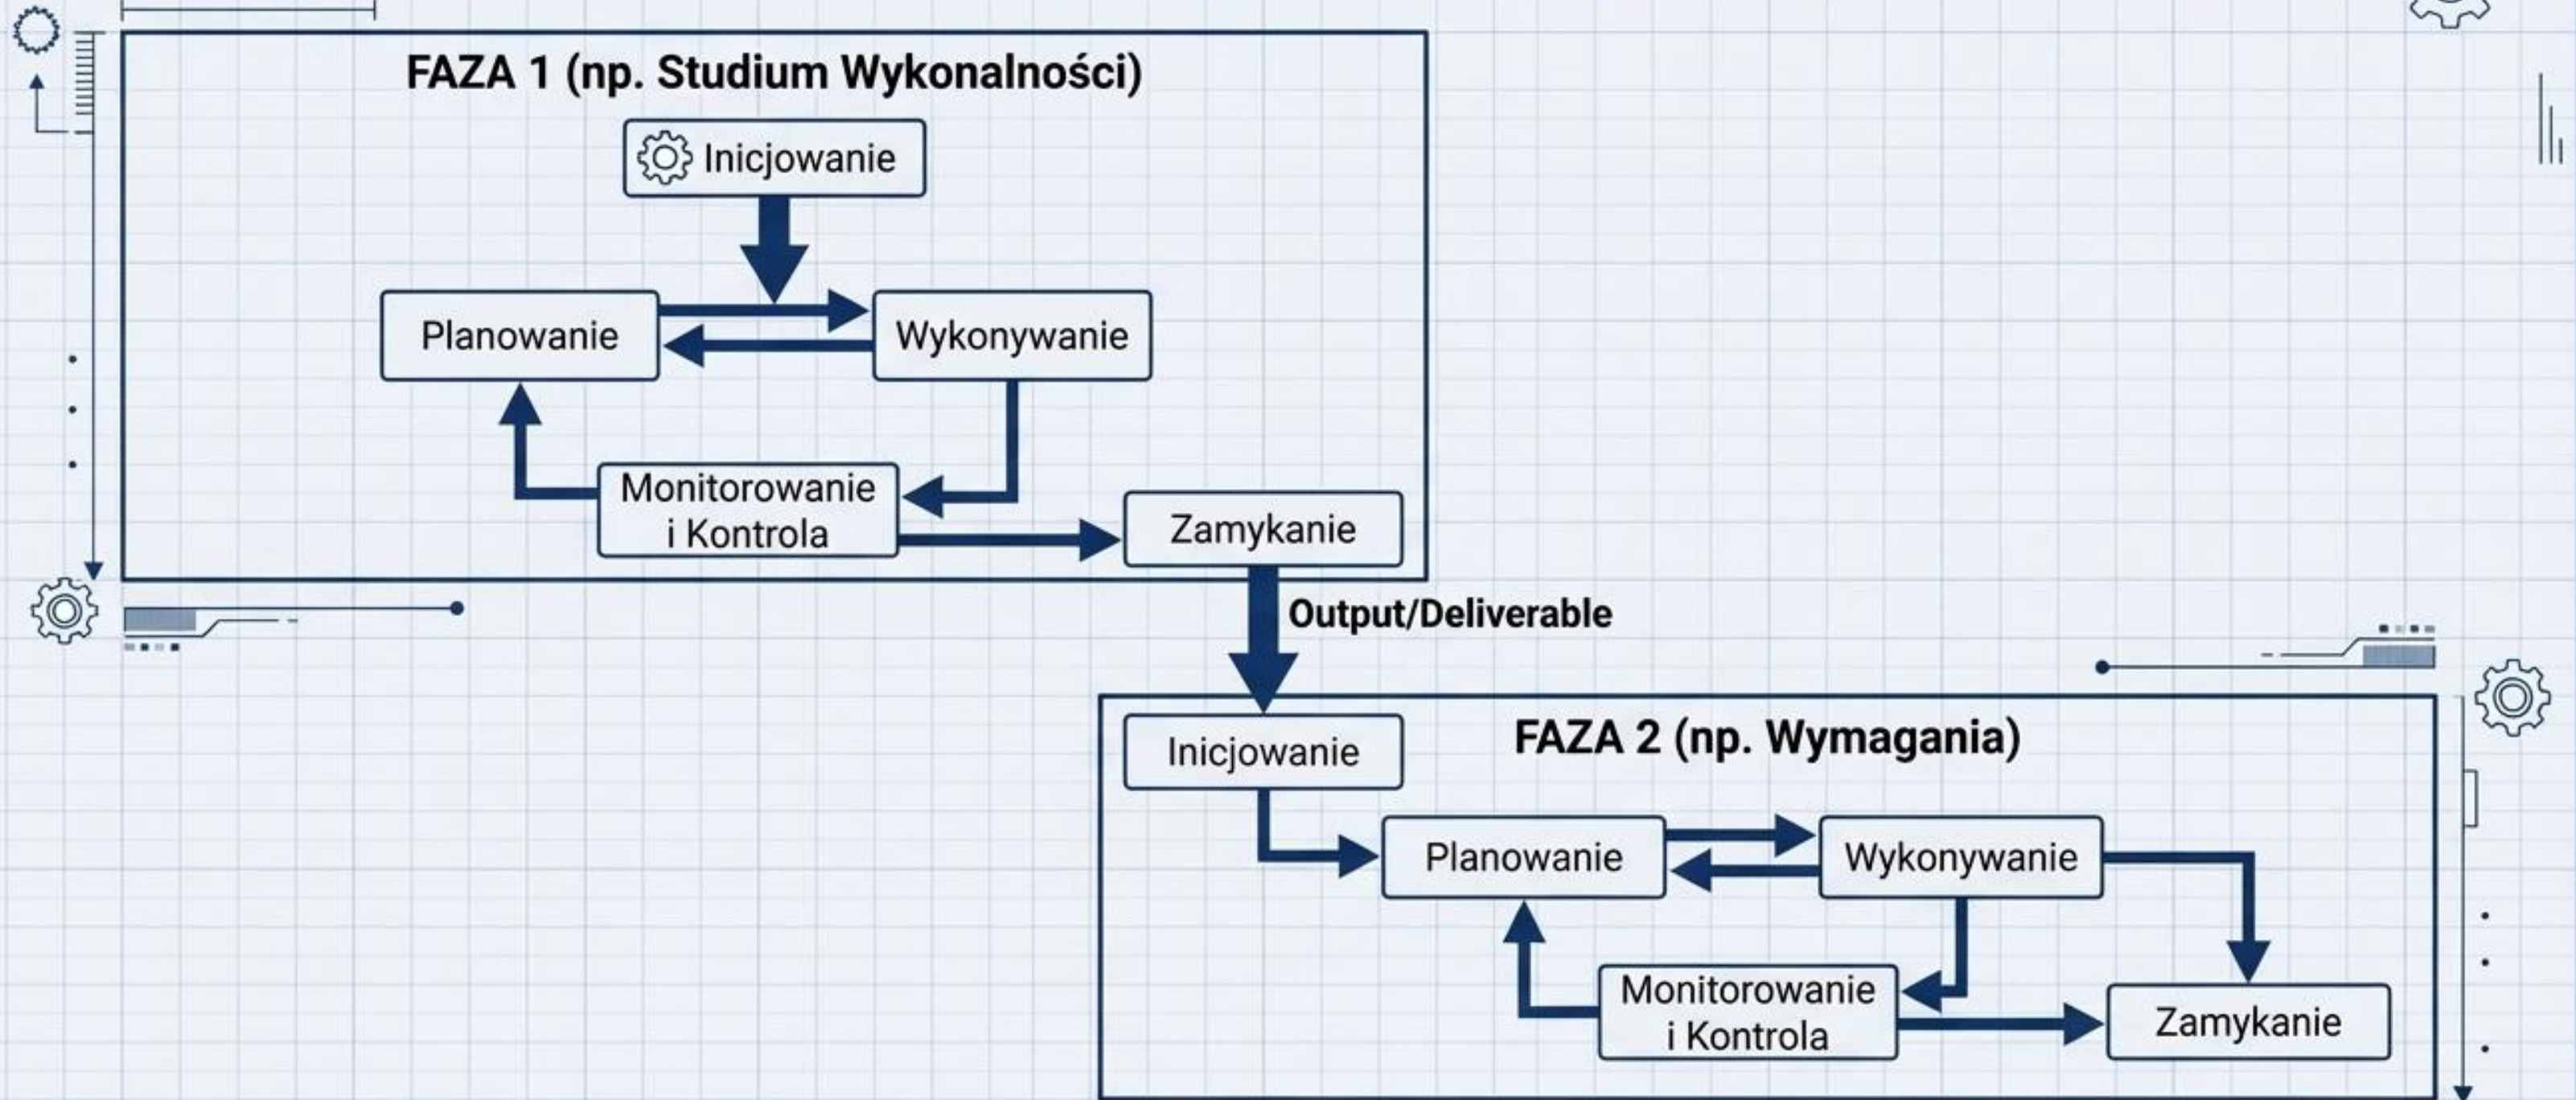

Synteza: Grupy procesów zarządzania (IPECC) to nie etapy całego projektu – to mechanizm, który powtarza się wewnątrz KAŻDEJ fazy. Wyjścia z procesów zamykania jednej fazy inicjują kolejną. To istota zarządzania według PMI.
