


Certyfikat PMP®: Plan Projektu

Architektura, Grupy Procesów
i 10 Obszarów Wiedzy


dr Zbigniew Galar

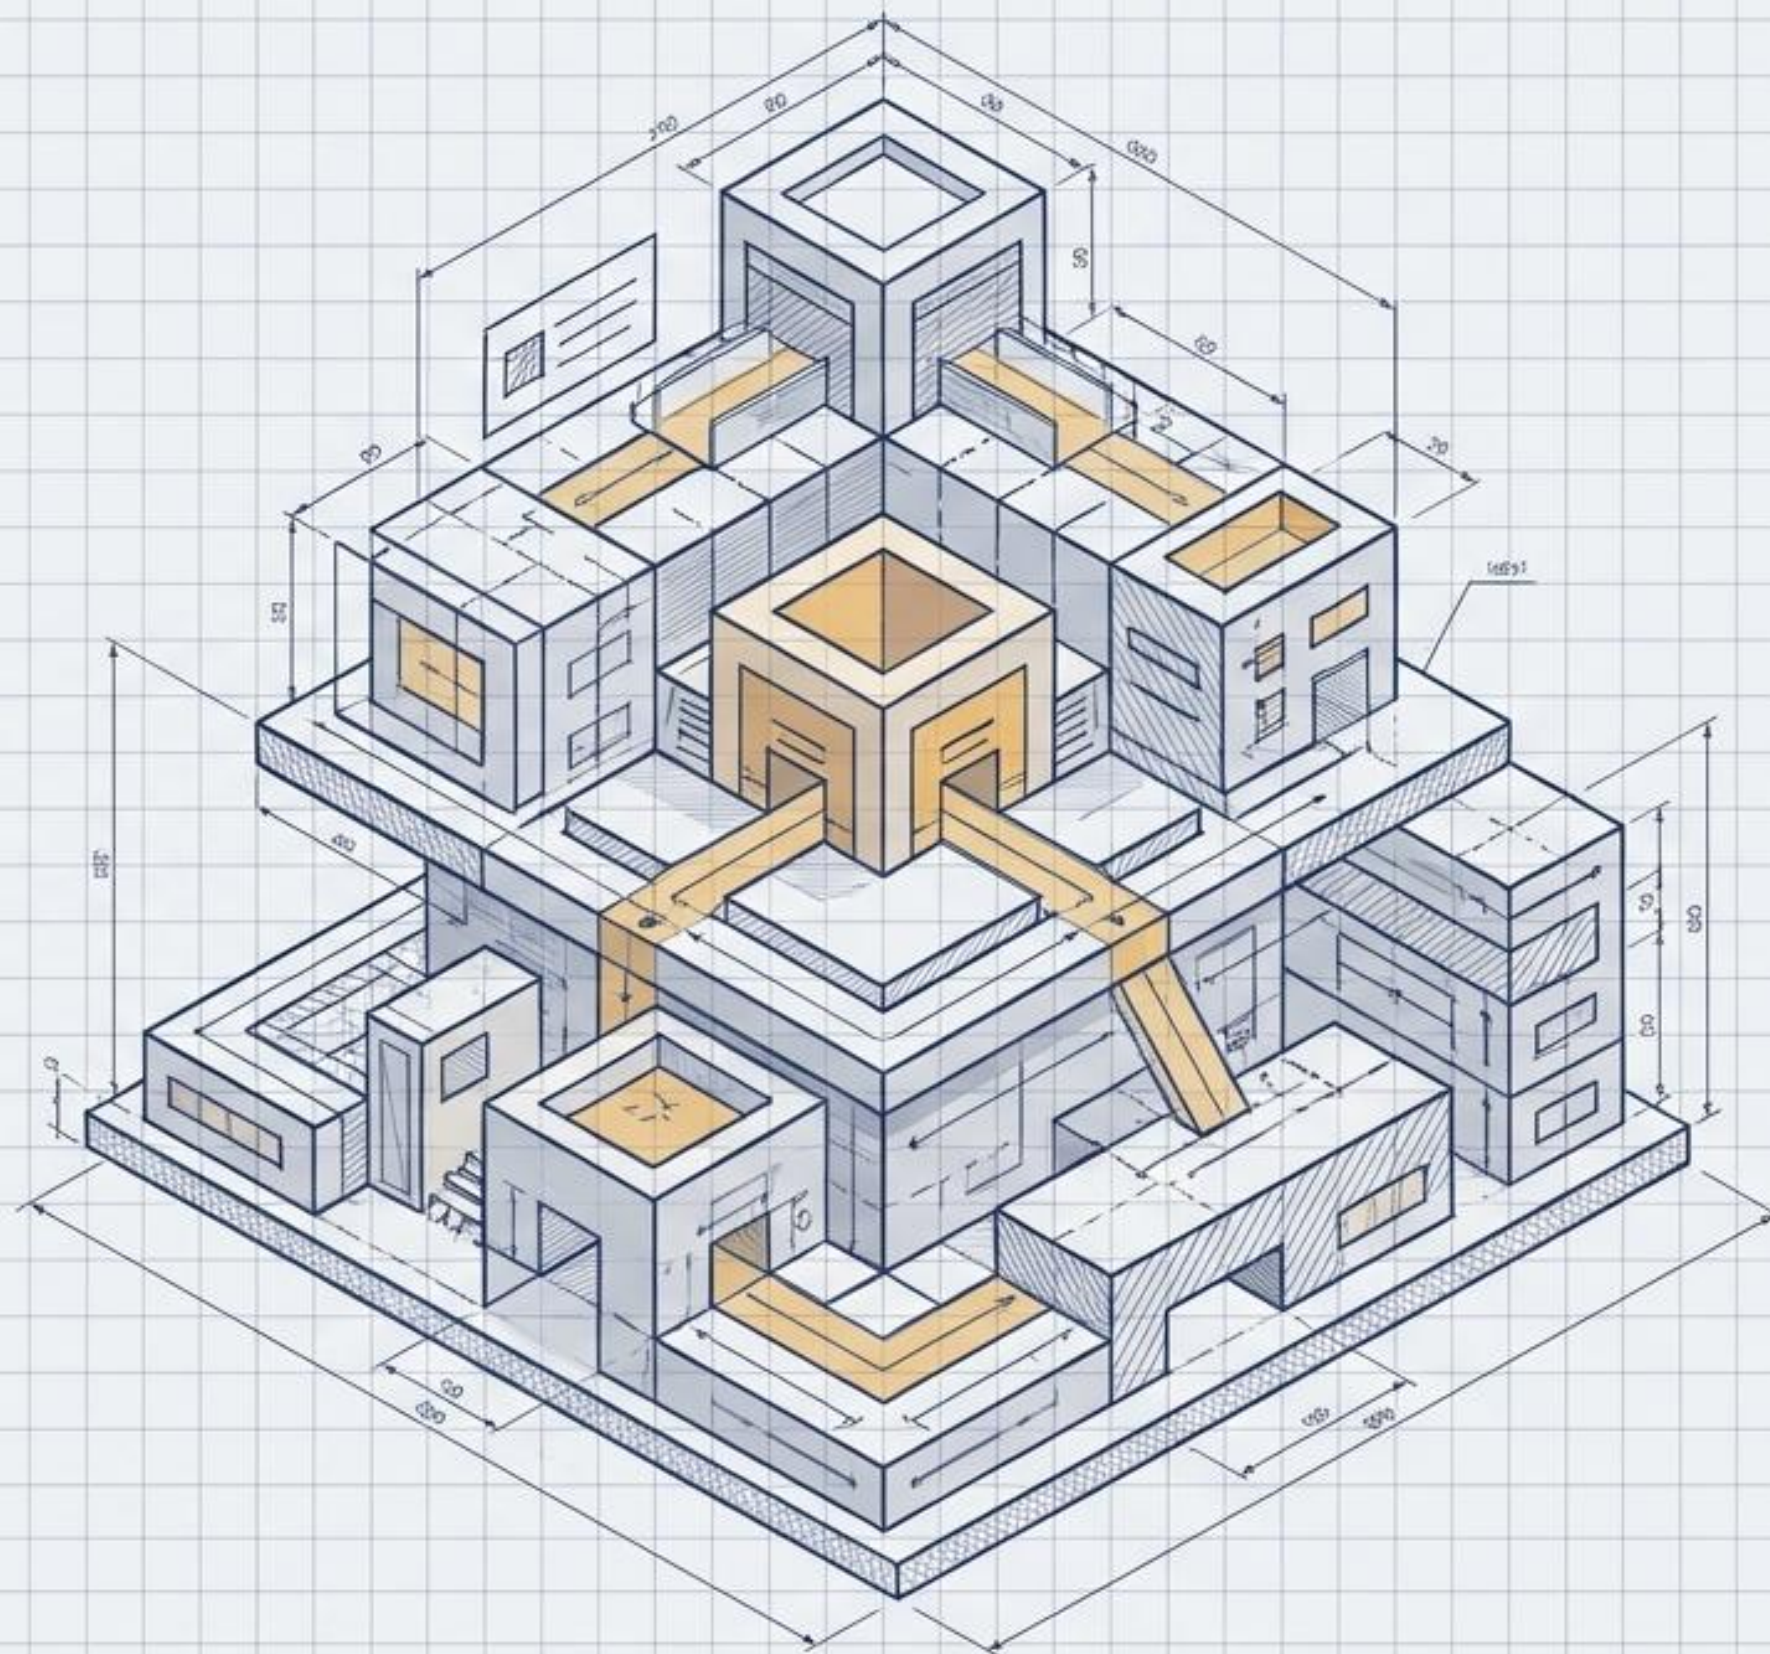

Wszystko zaczyna się od komunikacji. Zanim zaplanujesz projekt, musisz go oficjalnie rozpocząć w Grupie Procesów Inicjowania.



Karta Projektu formalizuje autorytet Kierownika Projektu. Bez zatwierdzenia przez sponsora, projekt (i rola PM-a) oficjalnie nie istnieje.

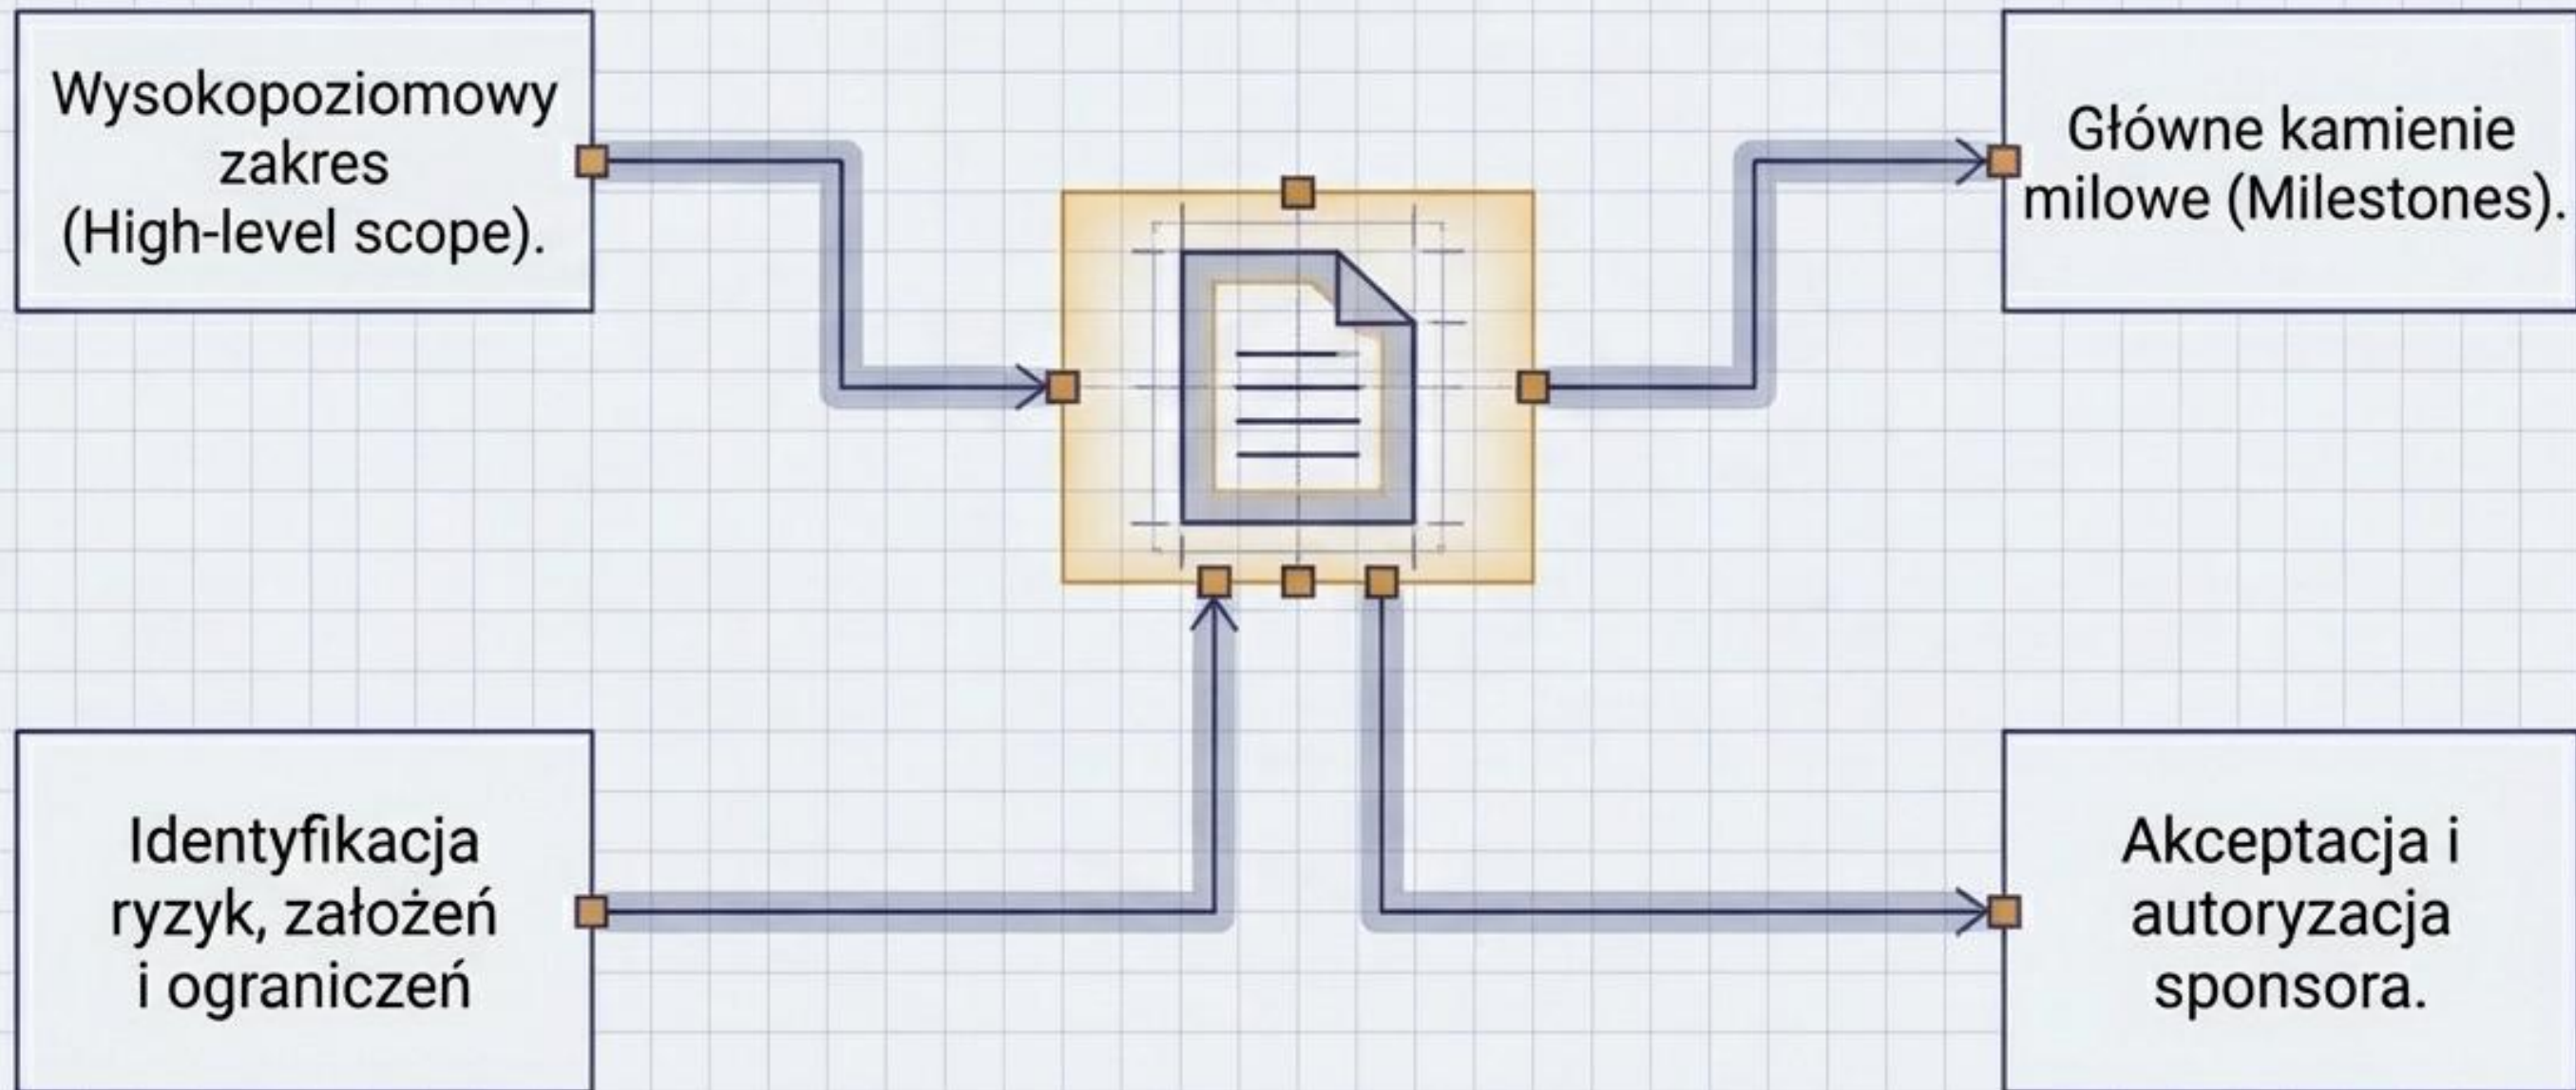

Anatomia PMP®: Macierz 10 x 5

	Inicjowanie	Planowanie	Realizacja	Monitorowanie i Kontrola	Zamykanie
	Inicjowanie	Planowanie	Realizacja	Monitorowanie i Kontrola	Zamykanie
10 Obszarów Wiedzy	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...
	...		...	...	...


Procesy są zgrupowane według obszarów kompetencji (Wiedza), ale realizowane w kolejności cyklu życia (Grupy Procesów).

 **Exam Tip**

Pamiętaj na egzaminie: obszary wiedzy łączą procesy na podstawie wspólnych cech i wymaganych umiejętności, ułatwiając przydzielanie zasobów.

Serce Projektu: Zarządzanie Integracją

Koordinacja wszystkich elementów planu. Wybór alternatyw, alokacja zasobów i zarządzanie kompromisami między rywalizującymi celami.

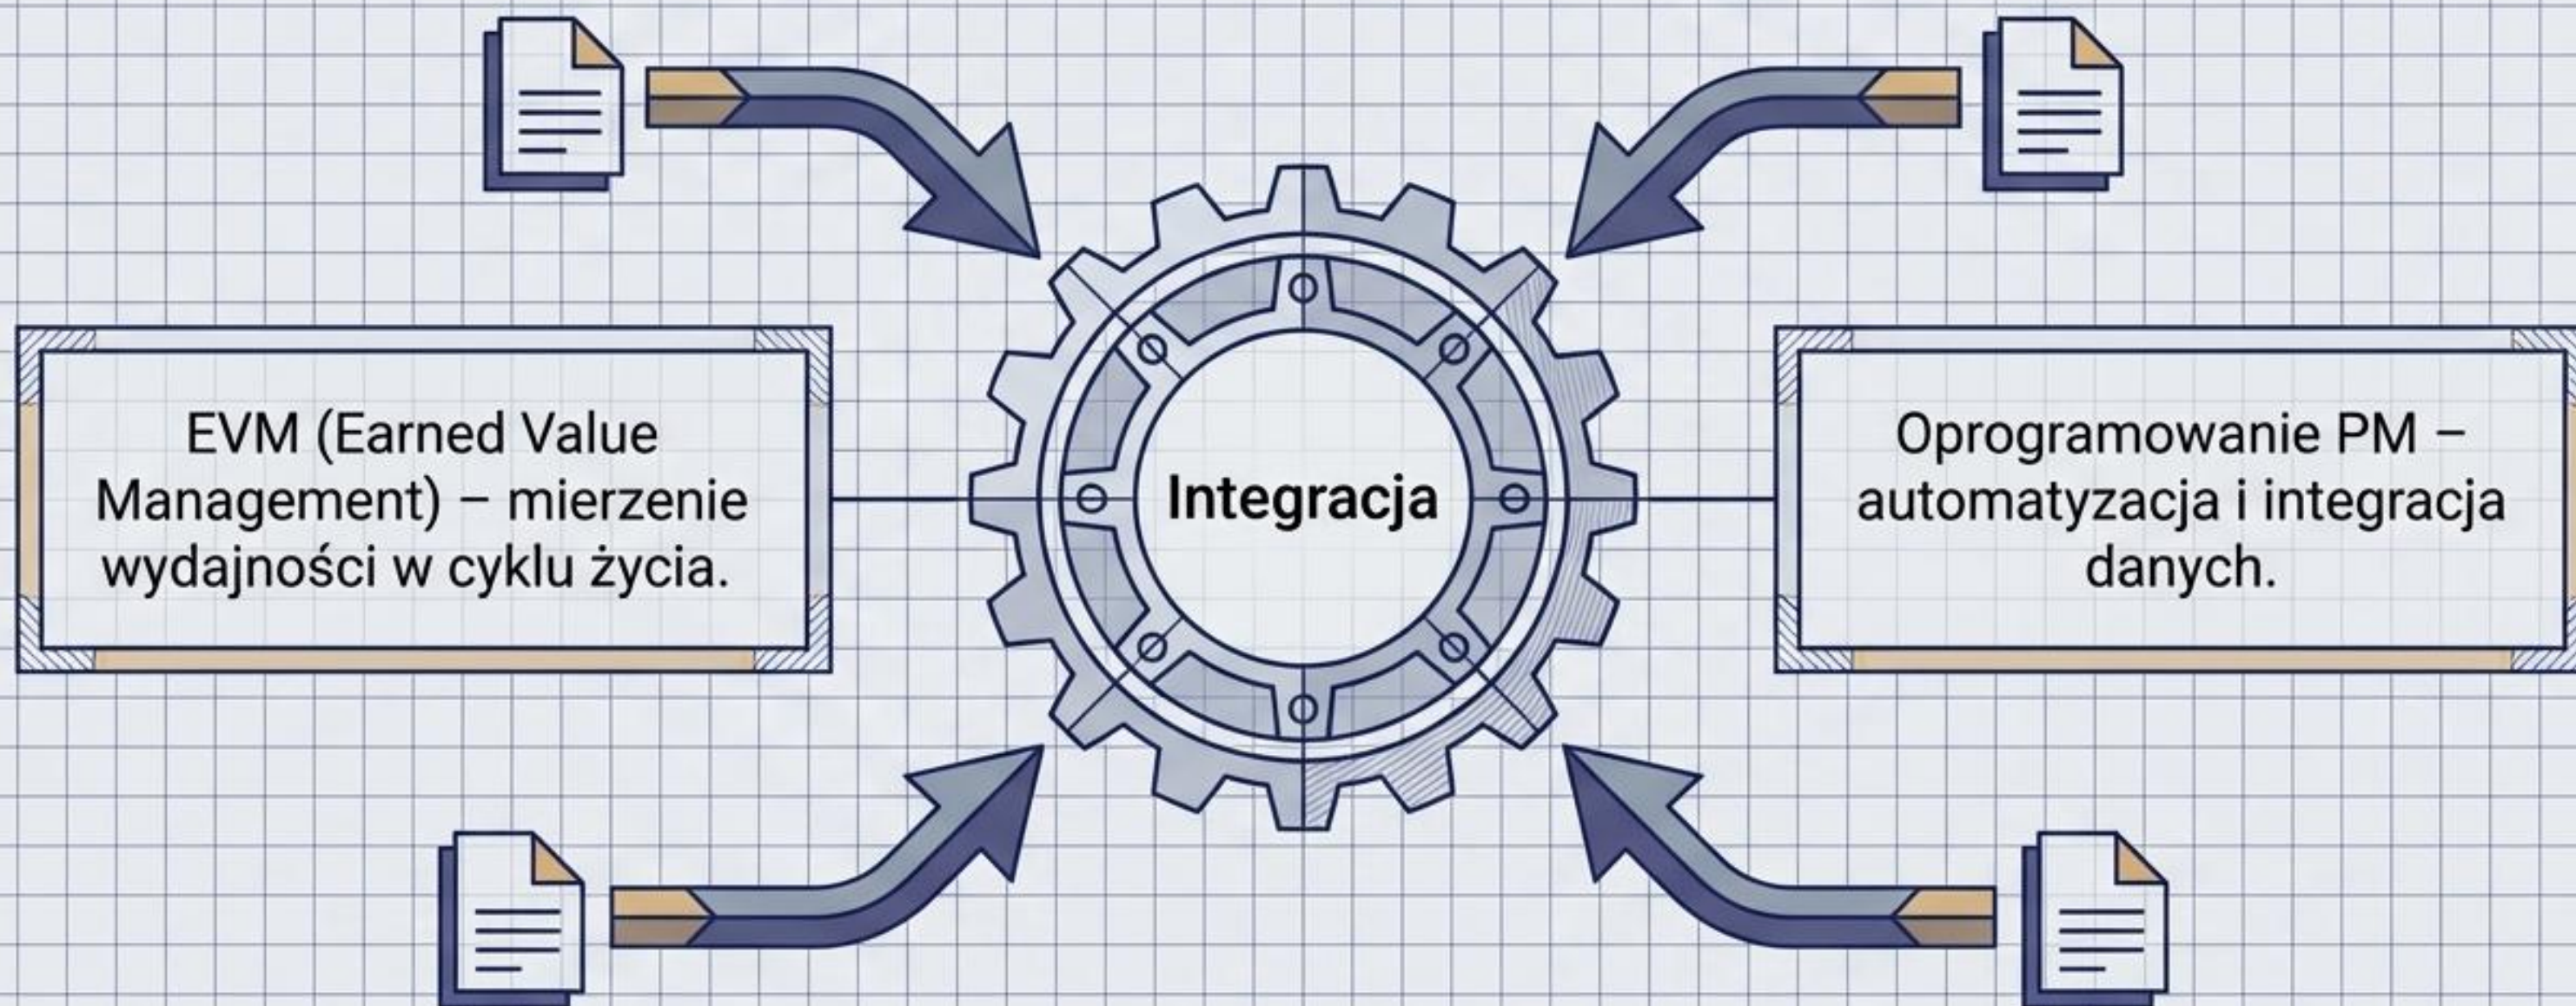

Zakres (Scope)

Definiowanie **CAŁEJ** niezbędnej pracy i **TYLKO** tej pracy, która jest potrzebna do osiągnięcia celu.


Koszt (Cost)

Im wcześniej i precyzyjniej zdefiniujesz zakres, tym dokładniej oszacujesz koszty zasobów.

Czas (Time)


Szacowanie czasu i harmonogramowanie. W małych projektach procesy te często wykonuje się jako jedną, połączoną aktywność.

Zakres Produktu

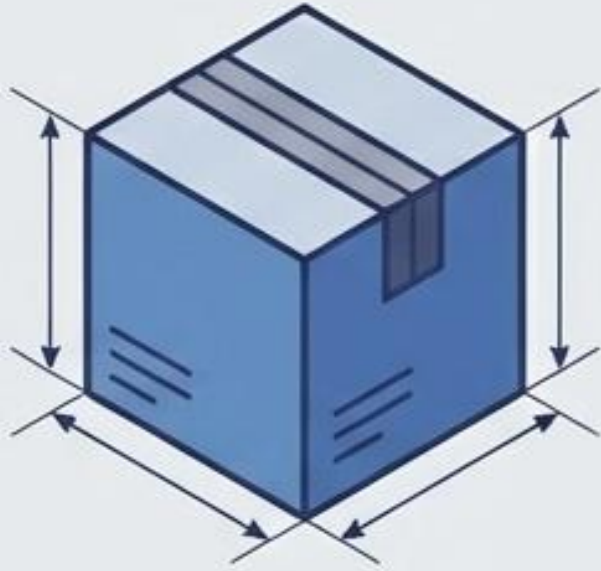

Cechy, funkcje i właściwości produktu/usługi. Mierzony i weryfikowany względem wymagań klienta.

Zakres Projektu

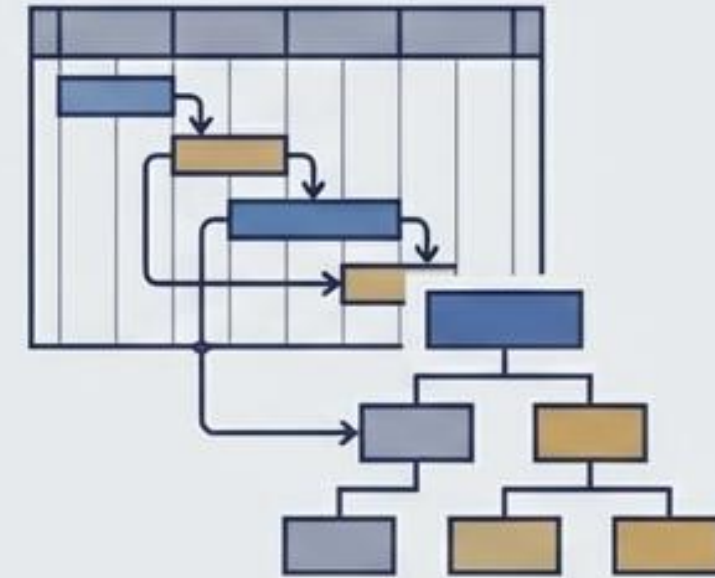


Praca niezbędna do dostarczenia produktu (i tylko ta praca). Mierzony i weryfikowany względem Planu Zarządzania Projektem.

Linia Bazowa Zakresu (Scope Baseline) = Deklaracja Zakresu (Scope Statement) + **WBS** + **Słownik WBS** (WBS Dictionary).

Zaawansowane Zarządzanie Kosztami

Kalkulacja Kosztów Cyklu Życia (Life Cycle Costing)

Uwzględnia koszty całkowite: nabycie, operacje, utrzymanie i utylizację – nie tylko koszty samego projektu.

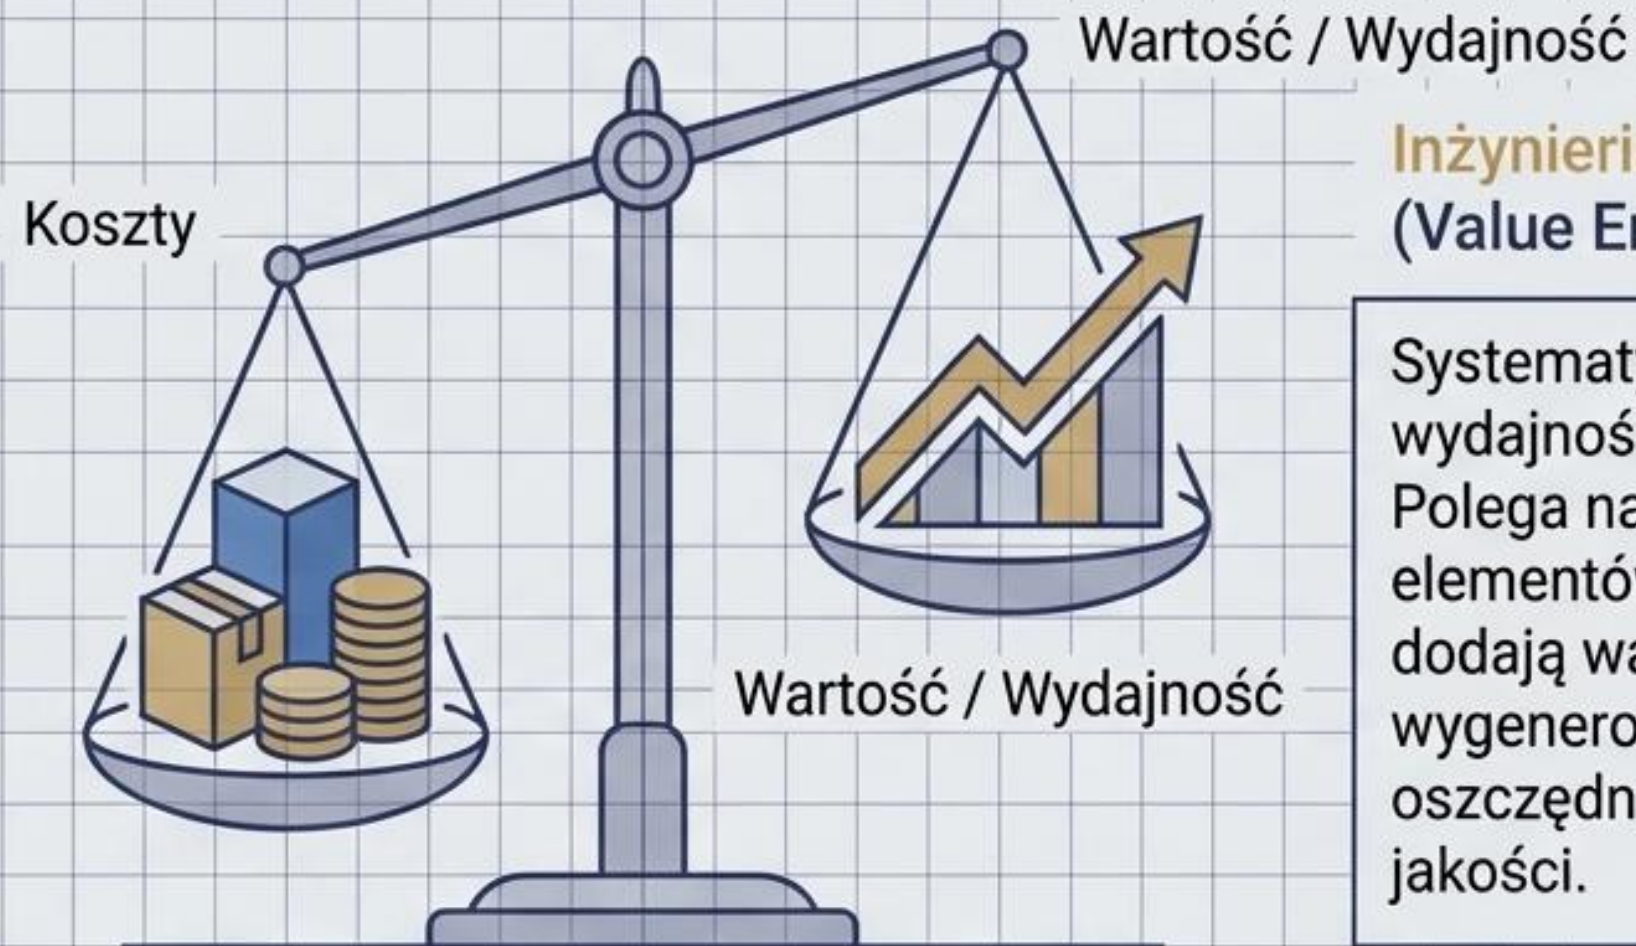


Inżynieria Wartości (Value Engineering)

Systematyczna optymalizacja wydajności i kosztów. Polega na eliminacji elementów, które nie dodają wartości, w celu wygenerowania oszczędności bez utraty jakości.



A

Jakość

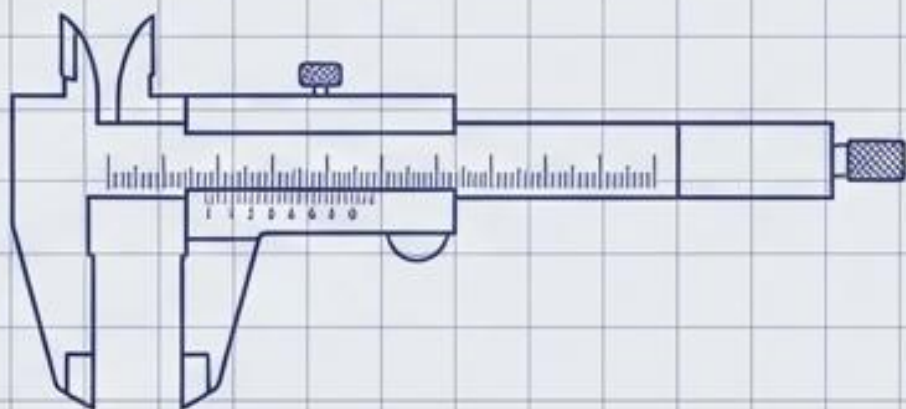

Zapewnienie, że projekt spełnia wymagania.

Uwaga: dotyczy nie tylko jakości samego produktu, ale również jakości procesów zarządczych używanych w projekcie.

B

Zasoby Ludzkie





Budowa tymczasowych zespołów z unikalnych specjalistów.

Wczesne zaangażowanie zespołu w fazie planowania gwarantuje ich zaangażowanie (buy-in) i wykorzystanie ich eksperckiej wiedzy.


System Nerwowy: Zarządzanie Komunikacją

Zbieranie, organizowanie, archiwizowanie i dystrybucja informacji (w tym zachowanie "danych historycznych" dla przyszłych projektów).

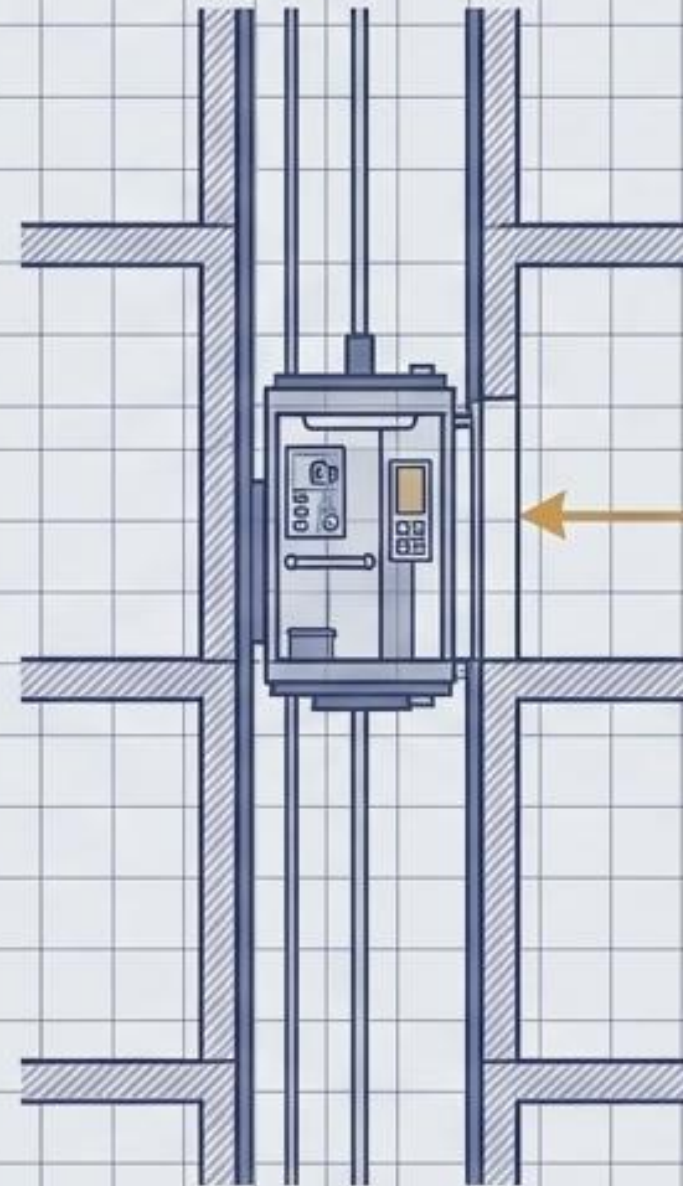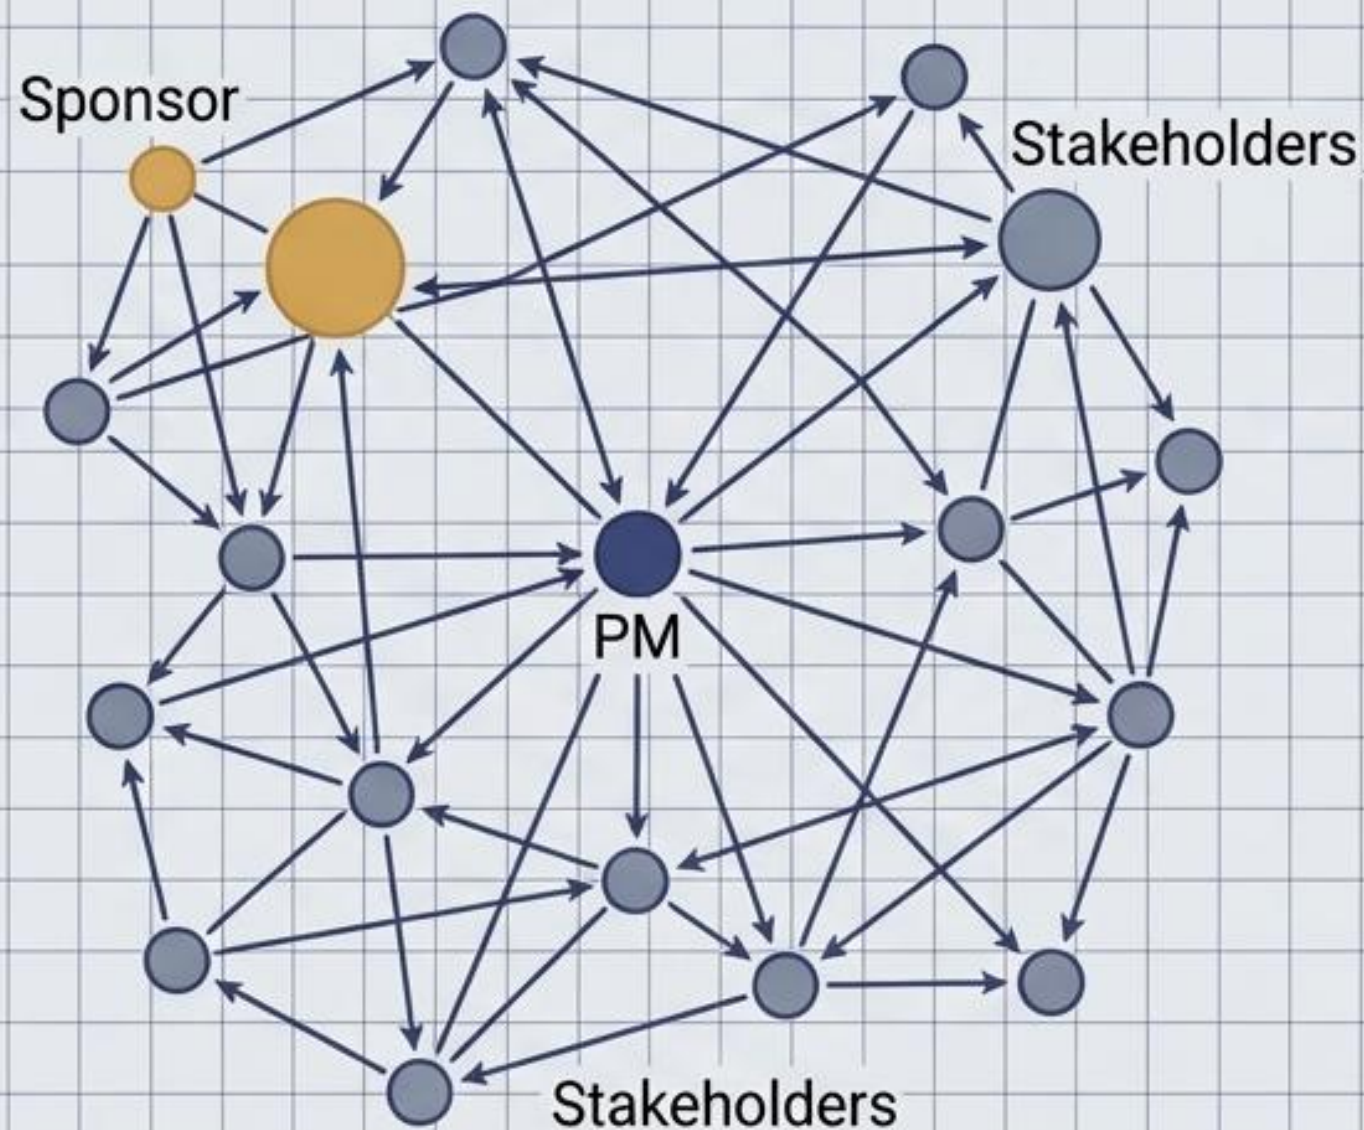

Studium Przypadku (Winda):
Komunikacja to proaktywność. PM, który nie mógł zdobyć czasu sponsora, zaczął jeździć z nim windą, tworząc "przypadkowe" spotkania twarzą w twarz. Narzędzia są ważne, ale celowe działanie jest kluczowe.

Ryzyko to nie tylko problem

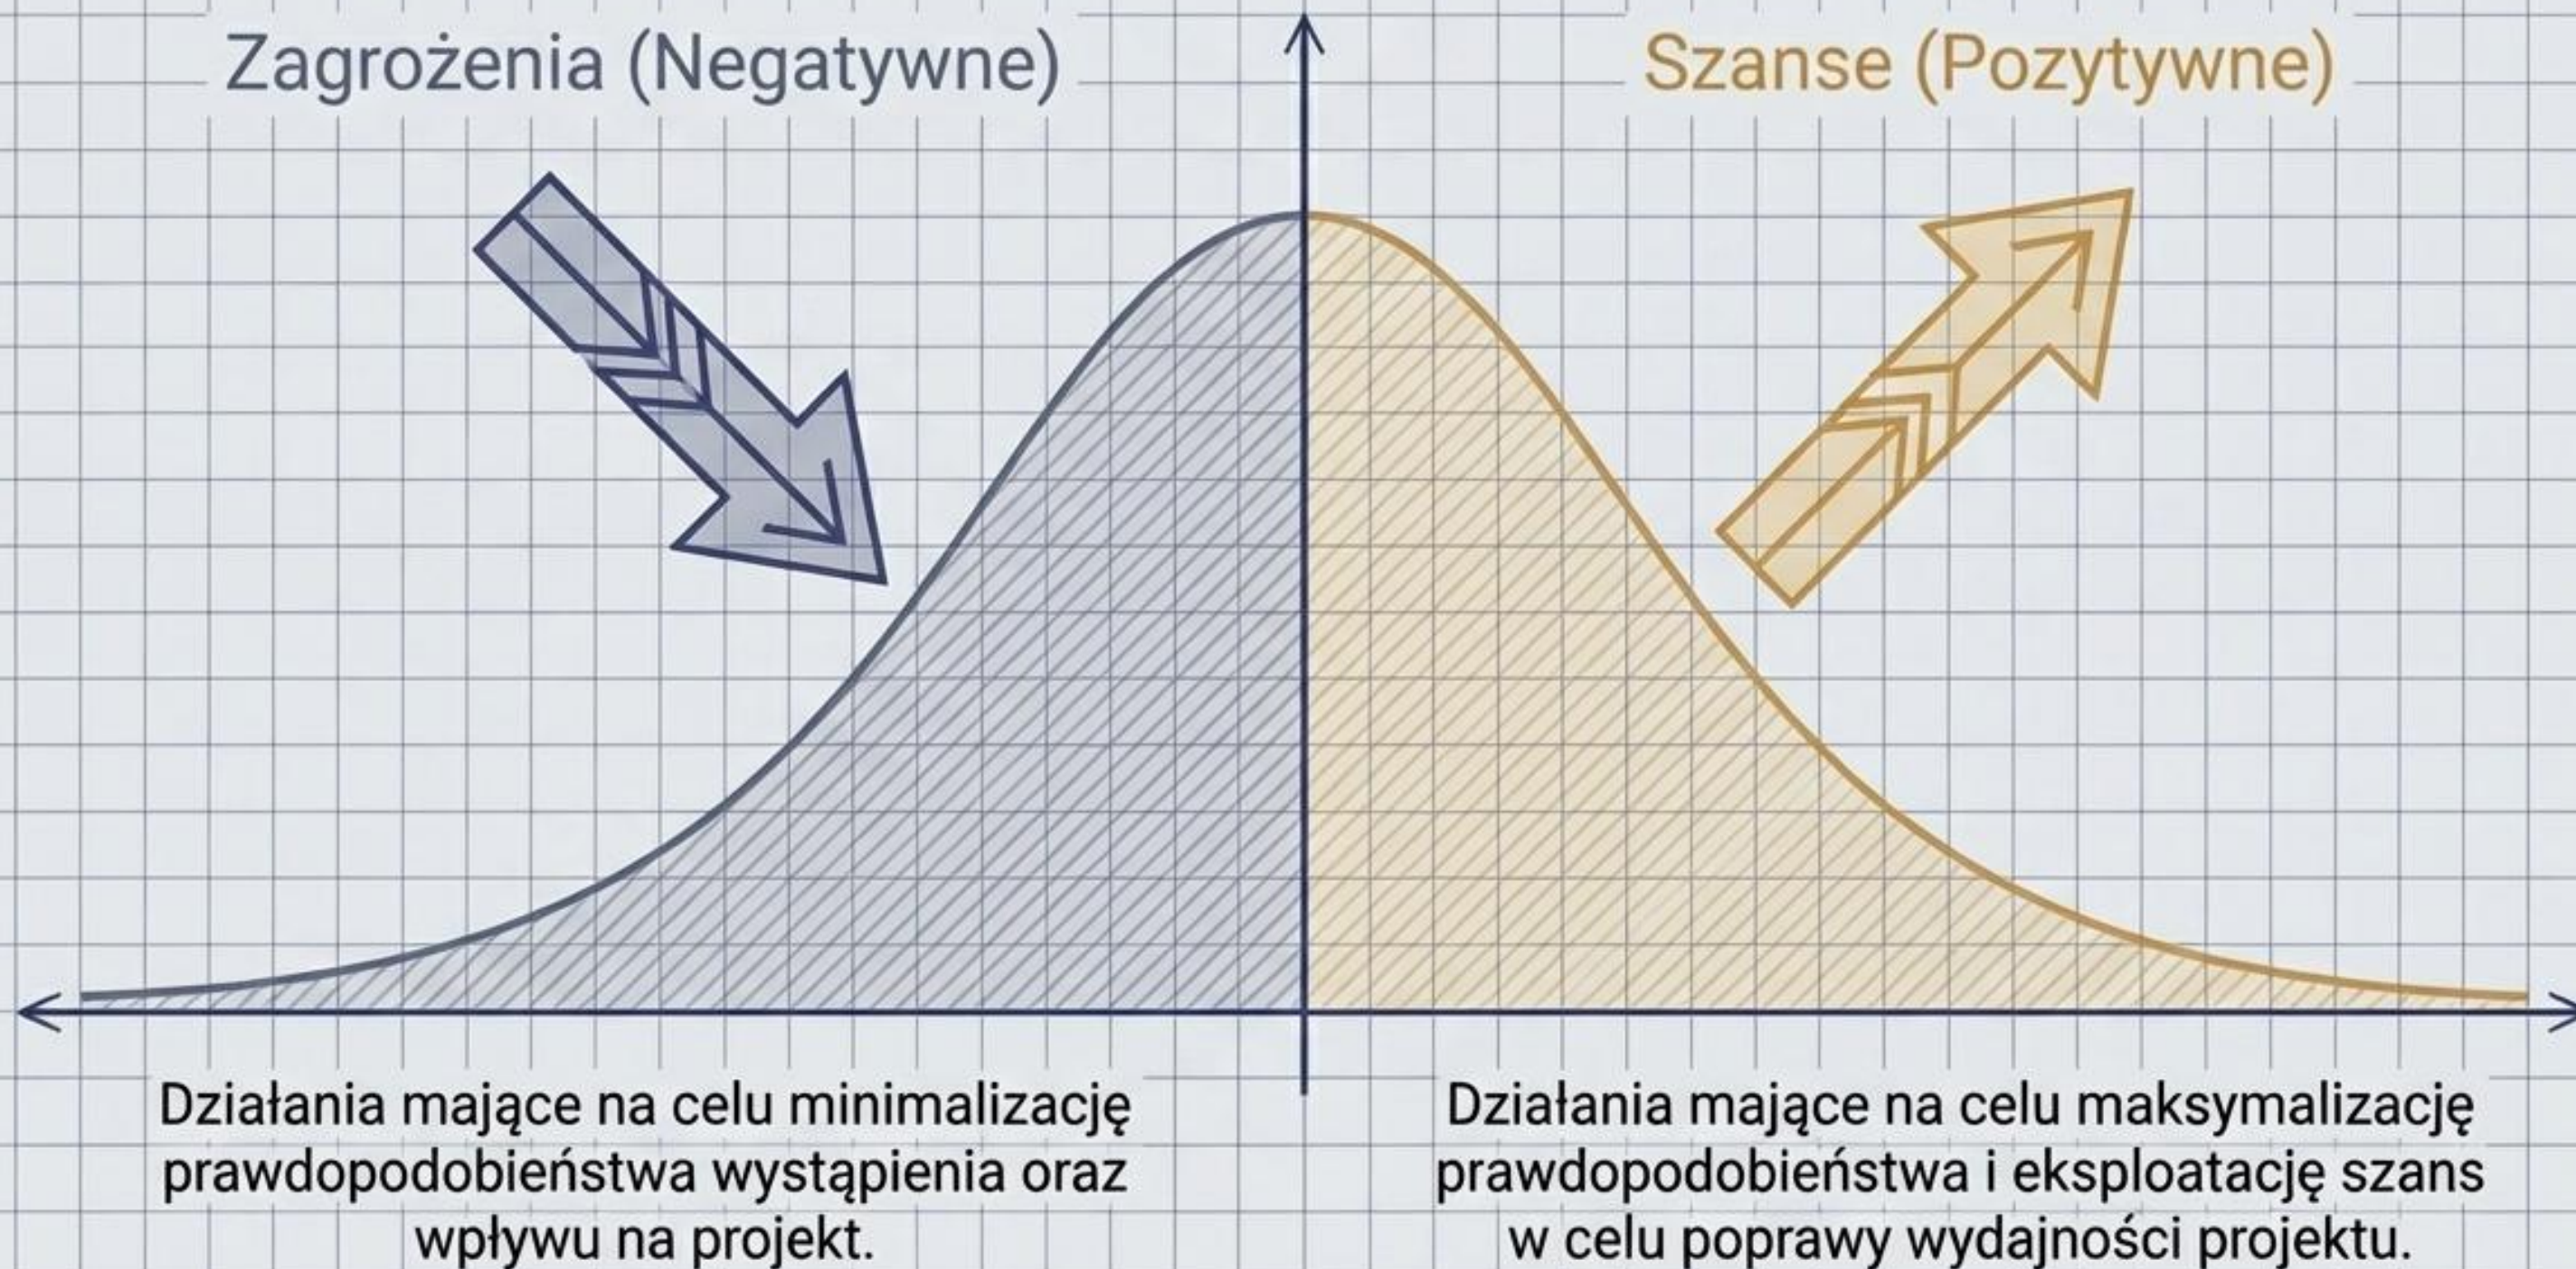

Granica Wewnątrz / Zewnątrz: Interakcje i Relacje



Zakupy (Procurement)

Zawsze oceniane z perspektywy Kupującego.
Pamiętaj: zewnętrzny sprzedawca realizujący Twój kontrakt może traktować tę pracę jako swój własny, oddzielny projekt.

Interesariusze (Stakeholders)

Identyfikowani już w fazie Inicjacji.
Kluczem jest ciągłe zarządzanie ich zaangażowaniem i oczekiwaniami przez cały cykl życia projektu.

Synteza: Czym jest Plan Projektu?



Plan to nie tylko harmonogram (wykres Gantt).

To zintegrowany zbiór 10 obszarów wiedzy, które wspólnie definiują, jak projekt będzie realizowany, monitorowany, kontrolowany i zamykany.

Wszystko spina proces Zarządzania Integracją, który dba o to, by każda zmiana w jednym bloku była odzwierciedlona w pozostałych.

PODSUMOWANIE: KLUCZOWE WNIOSKI



Karta Projektu to absolutny start. Bez niej (Grupa Inicjowania) PM nie ma formalnego autorytetu, a projekt biznesowo nie istnieje.



Macierz to Twój kompas. Obszary Wiedzy to grupy procesów połączone wymaganymi kompetencjami, działające w poprzek chronologicznego cyklu życia.



Integracja to Twoja główna praca. Rolą PM-a nie jest bycie ekspertem w każdej dziedzinie, ale ciągłe równoważenie zakresu, czasu, kosztów, ryzyka i ludzi.
