

Certyfikat PMP: Angażowanie interesariuszy projektu


dr Zbigniew Galar



Moduł: Grupa Procesów Realizacji (Executing Process Group)


Zasada Komunikacji (PMP Exam)

Nadawca odpowiada za jasność i kompletność komunikatu. Odbiorca odpowiada za jego właściwe zrozumienie.

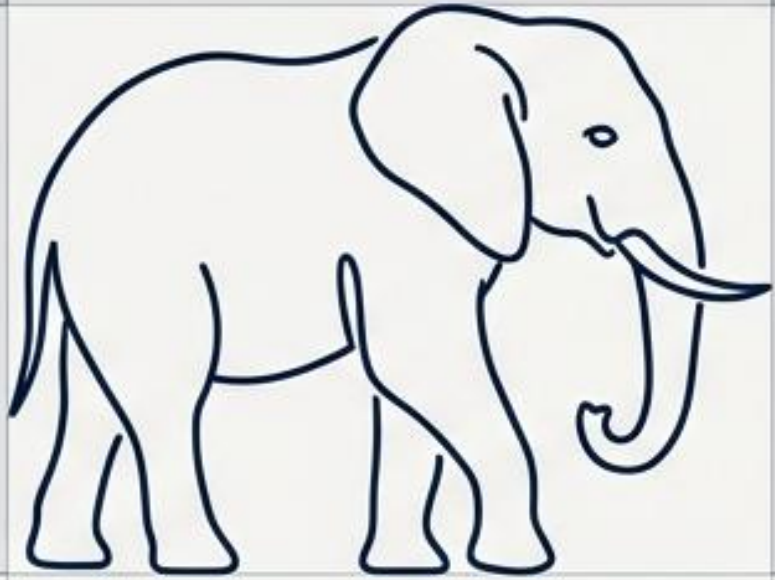

Komunikat Jednoznaczny

Hasło słów nie pozostawia miejsca na interpretację.

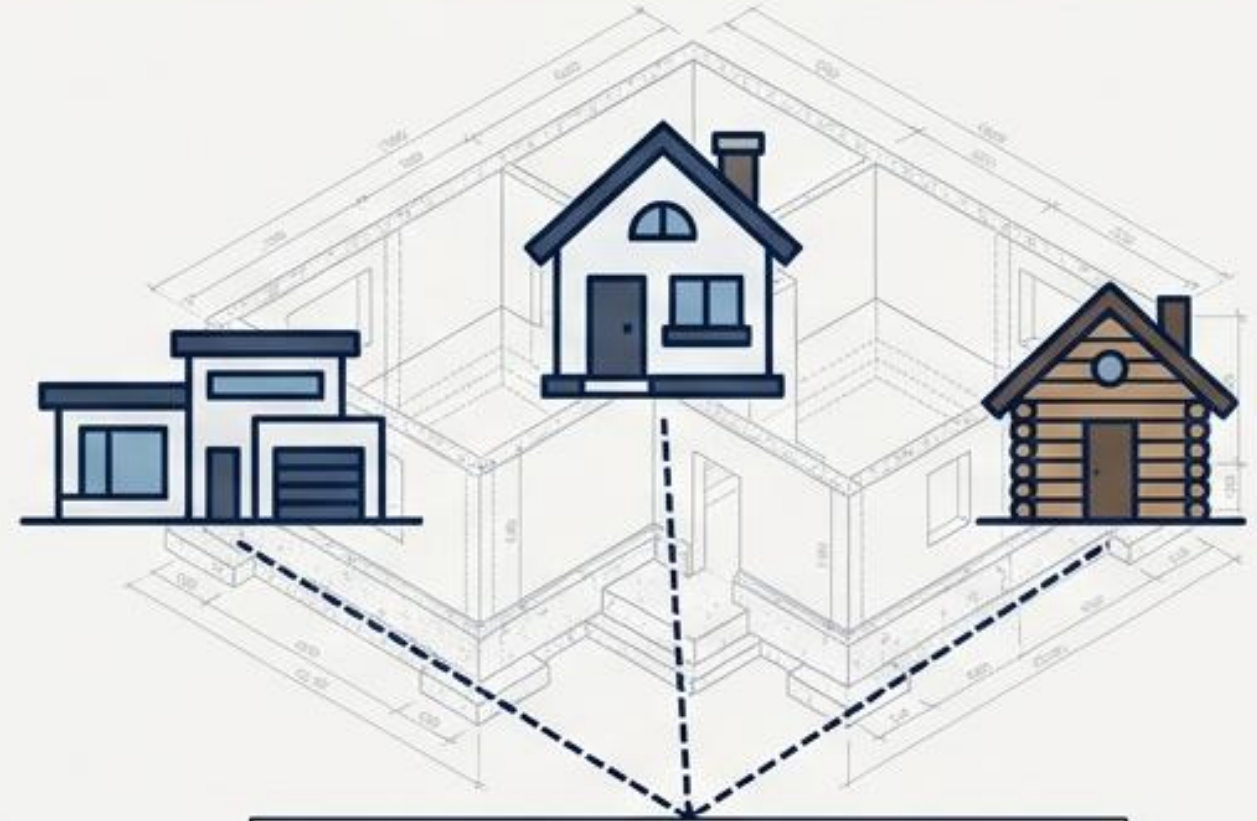


Różne Wizje

Hasło dom z 3 sypialniami tworzy skrajnie różne obrazy w głowach interesariuszy.


Słowa mają różne znaczenia; oczekiwania wymagają aktywnego, ciągłego zarządzania przez PM-a.

Anatomia Procesu: Angażowanie Interesariuszy

Cel Procesu: Zmniejszenie ryzyka niepowodzenia poprzez zarządzanie oczekiwaniami.

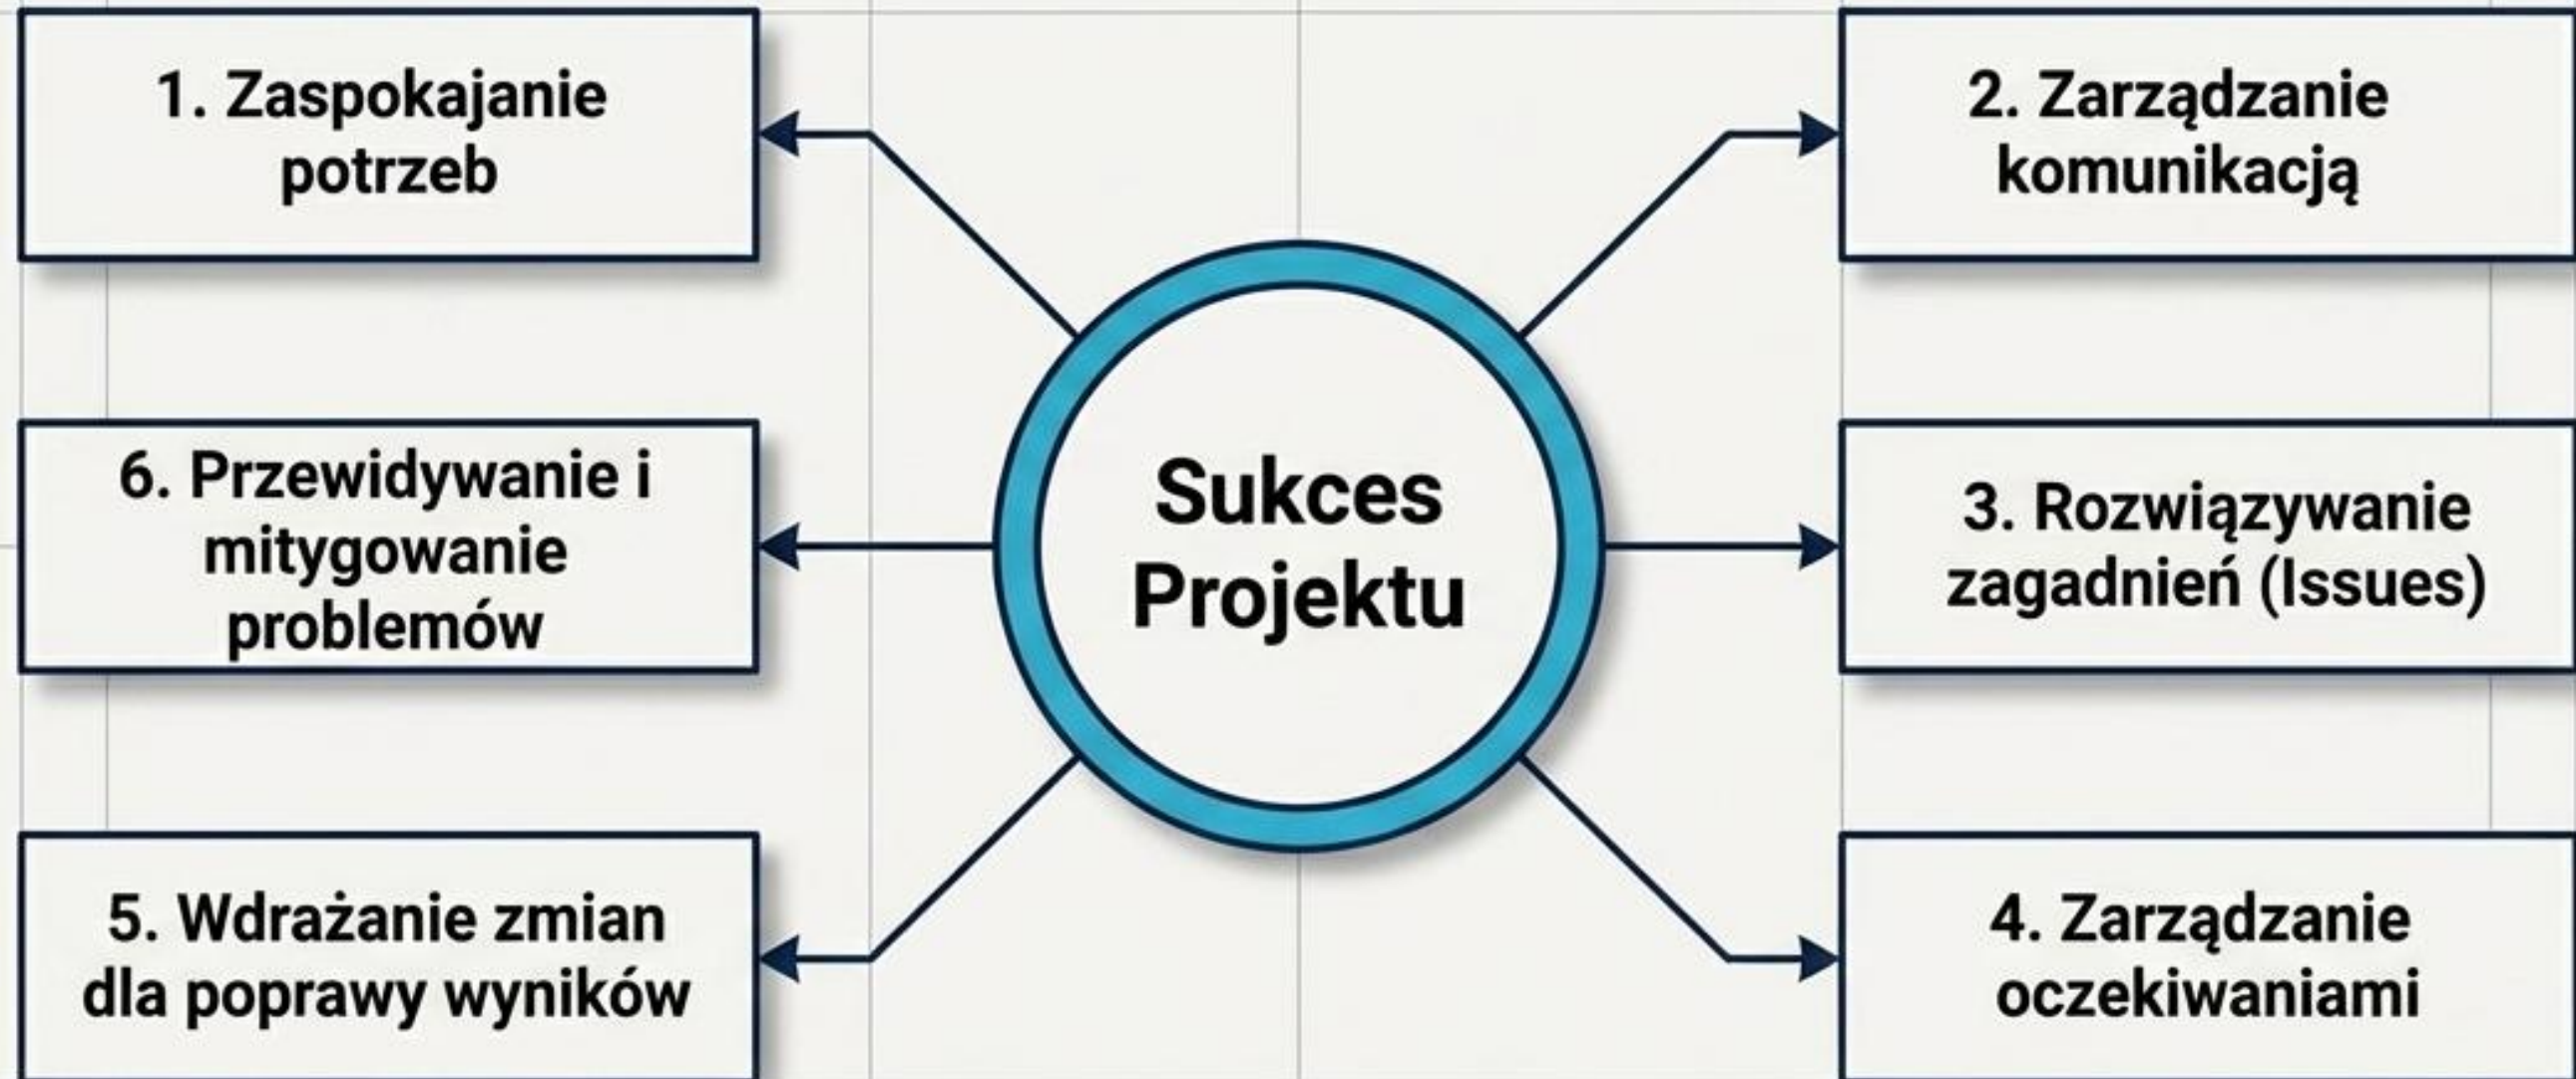

Architektura Procesu (Model ITTO)

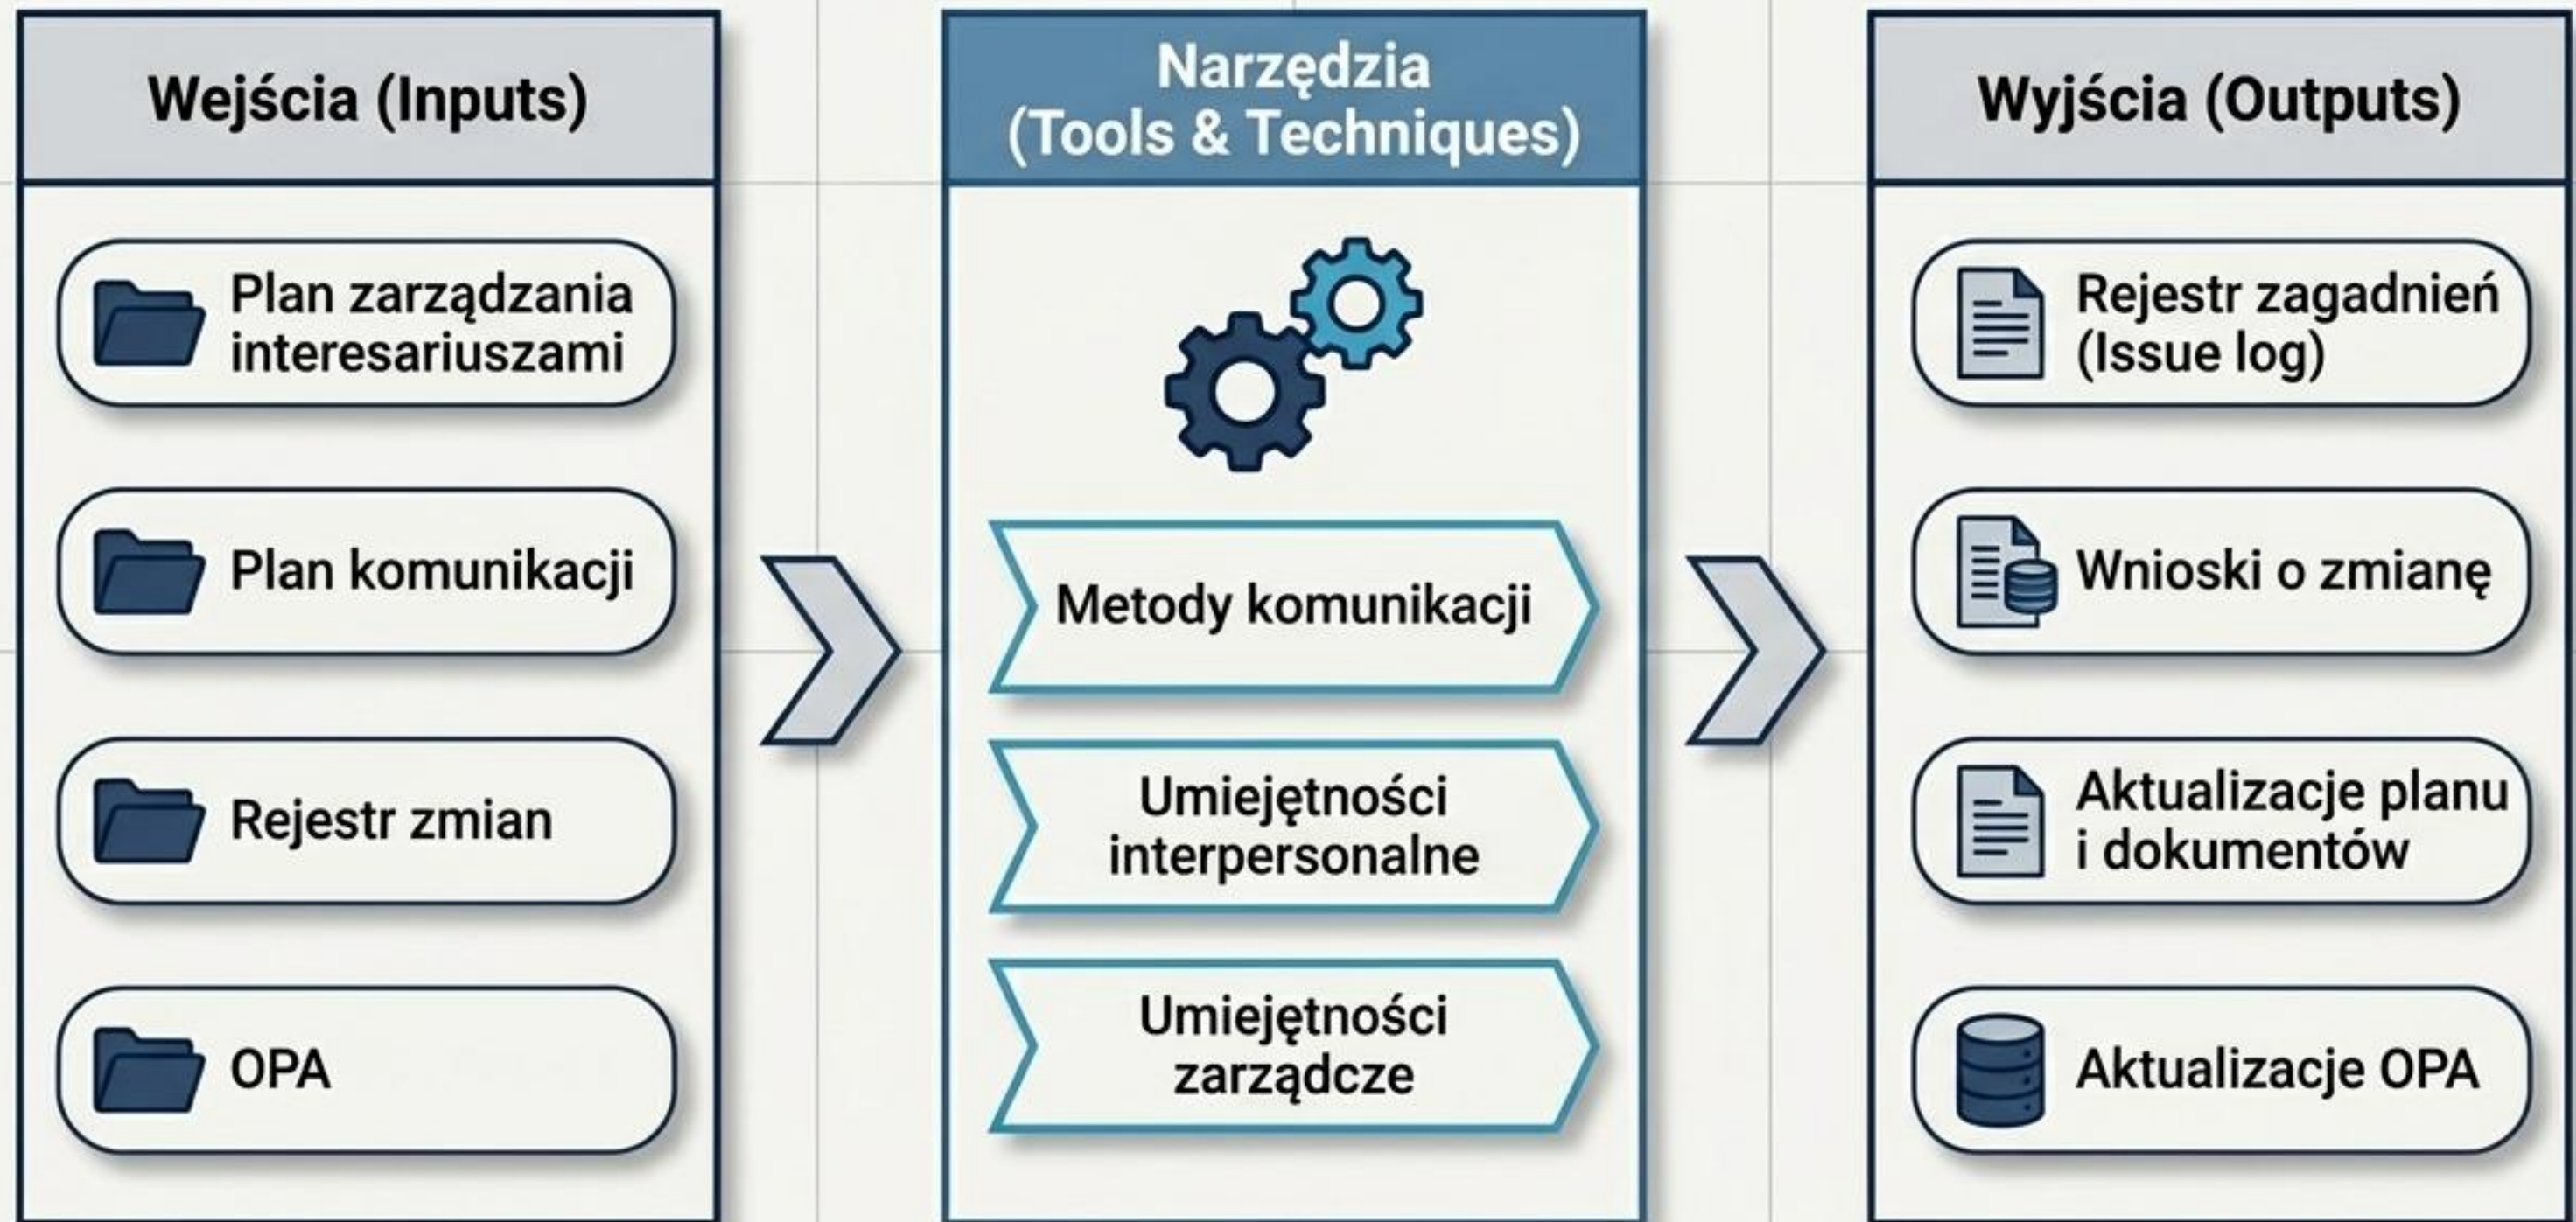


Paliwo Procesu (Kluczowe Wejścia)



Instrumenty PM-a (Narzędzia i Techniki)

Formaty Komunikacji

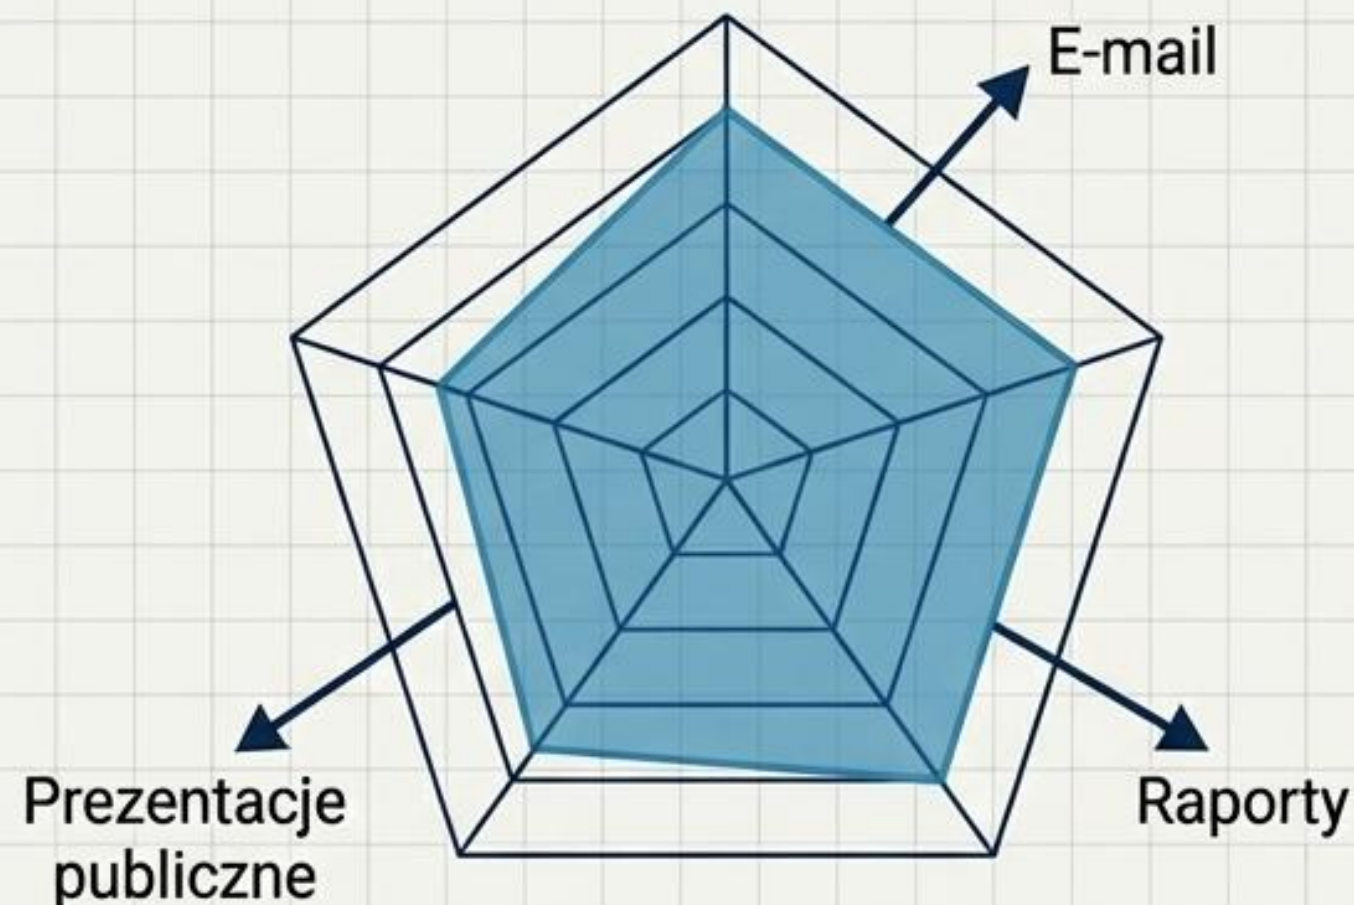

Złota Zasada: Komunikacja twarzą w twarz (Face-to-face) jest zawsze najbardziej efektywna w zarządzaniu interesariuszami.

Kompetencje Zarządcze



Budowanie konsensusu wobec celów



Wywieranie wpływu na wsparcie projektu



Negocjacje rozwiązań



Kształtowanie zachowań organizacyjnych



Anatomia Rejestru Zagadnień (Issue Log)

Priorytetyzacja: Zagadnienia muszą być kategoryzowane według pilności i potencjalnego wpływu na projekt.

ID Zagadnienia	Priorytet	Osoba Odpowiedzialna (Responsible Party)	Termin Rozwiązania (Due Date)

Działa jak Action Item Log (Rejestr zadań do wykonania).

Wspólne zrozumienie: Zapewnia, że zespół i interesariusze jednakowo postrzegają dany problem.

Macierz Diagnostyczna

Rejestr Zagadnień (Issue Log)

Cel: Rejestracja problemów, obaw interesariuszy i tematów do dyskusji.

Funkcja: Narzędzie operacyjne do przypisywania odpowiedzialności i terminów (Rozwiązywanie problemów).

Stan: Coś nie działa lub wymaga uwagi.

Rejestr Zmian (Change Log)

Cel: Rejestracja oficjalnie wprowadzonych modyfikacji do projektu.

Funkcja: Narzędzie komunikacyjne pokazujące wpływ na harmonogram, budżet i zakres.

Stan: Coś zostało zmodyfikowane w stosunku do bazy (baseline).

Cykl Życia Wiedzy (Aktualizacje OPA)



Rzeczywistość Projektowa: Studium Przypadku



Real World Scenario

Obiekt:

Kitchen Heaven Retail Store
(ID: 081501-1910)

Faza Projektu:

Grupa Procesów Realizacji
(Executing)

Data:

8 Października

**Kluczowy
Interesariusz:**

Dirk Perrier


**Główny
Wykonawca:**

Gomez Construction
(Reprezentant: Jake)

Zarządzanie IT:

Ricardo

Anatomia Status Raportu (Komunikacja w praktyce)

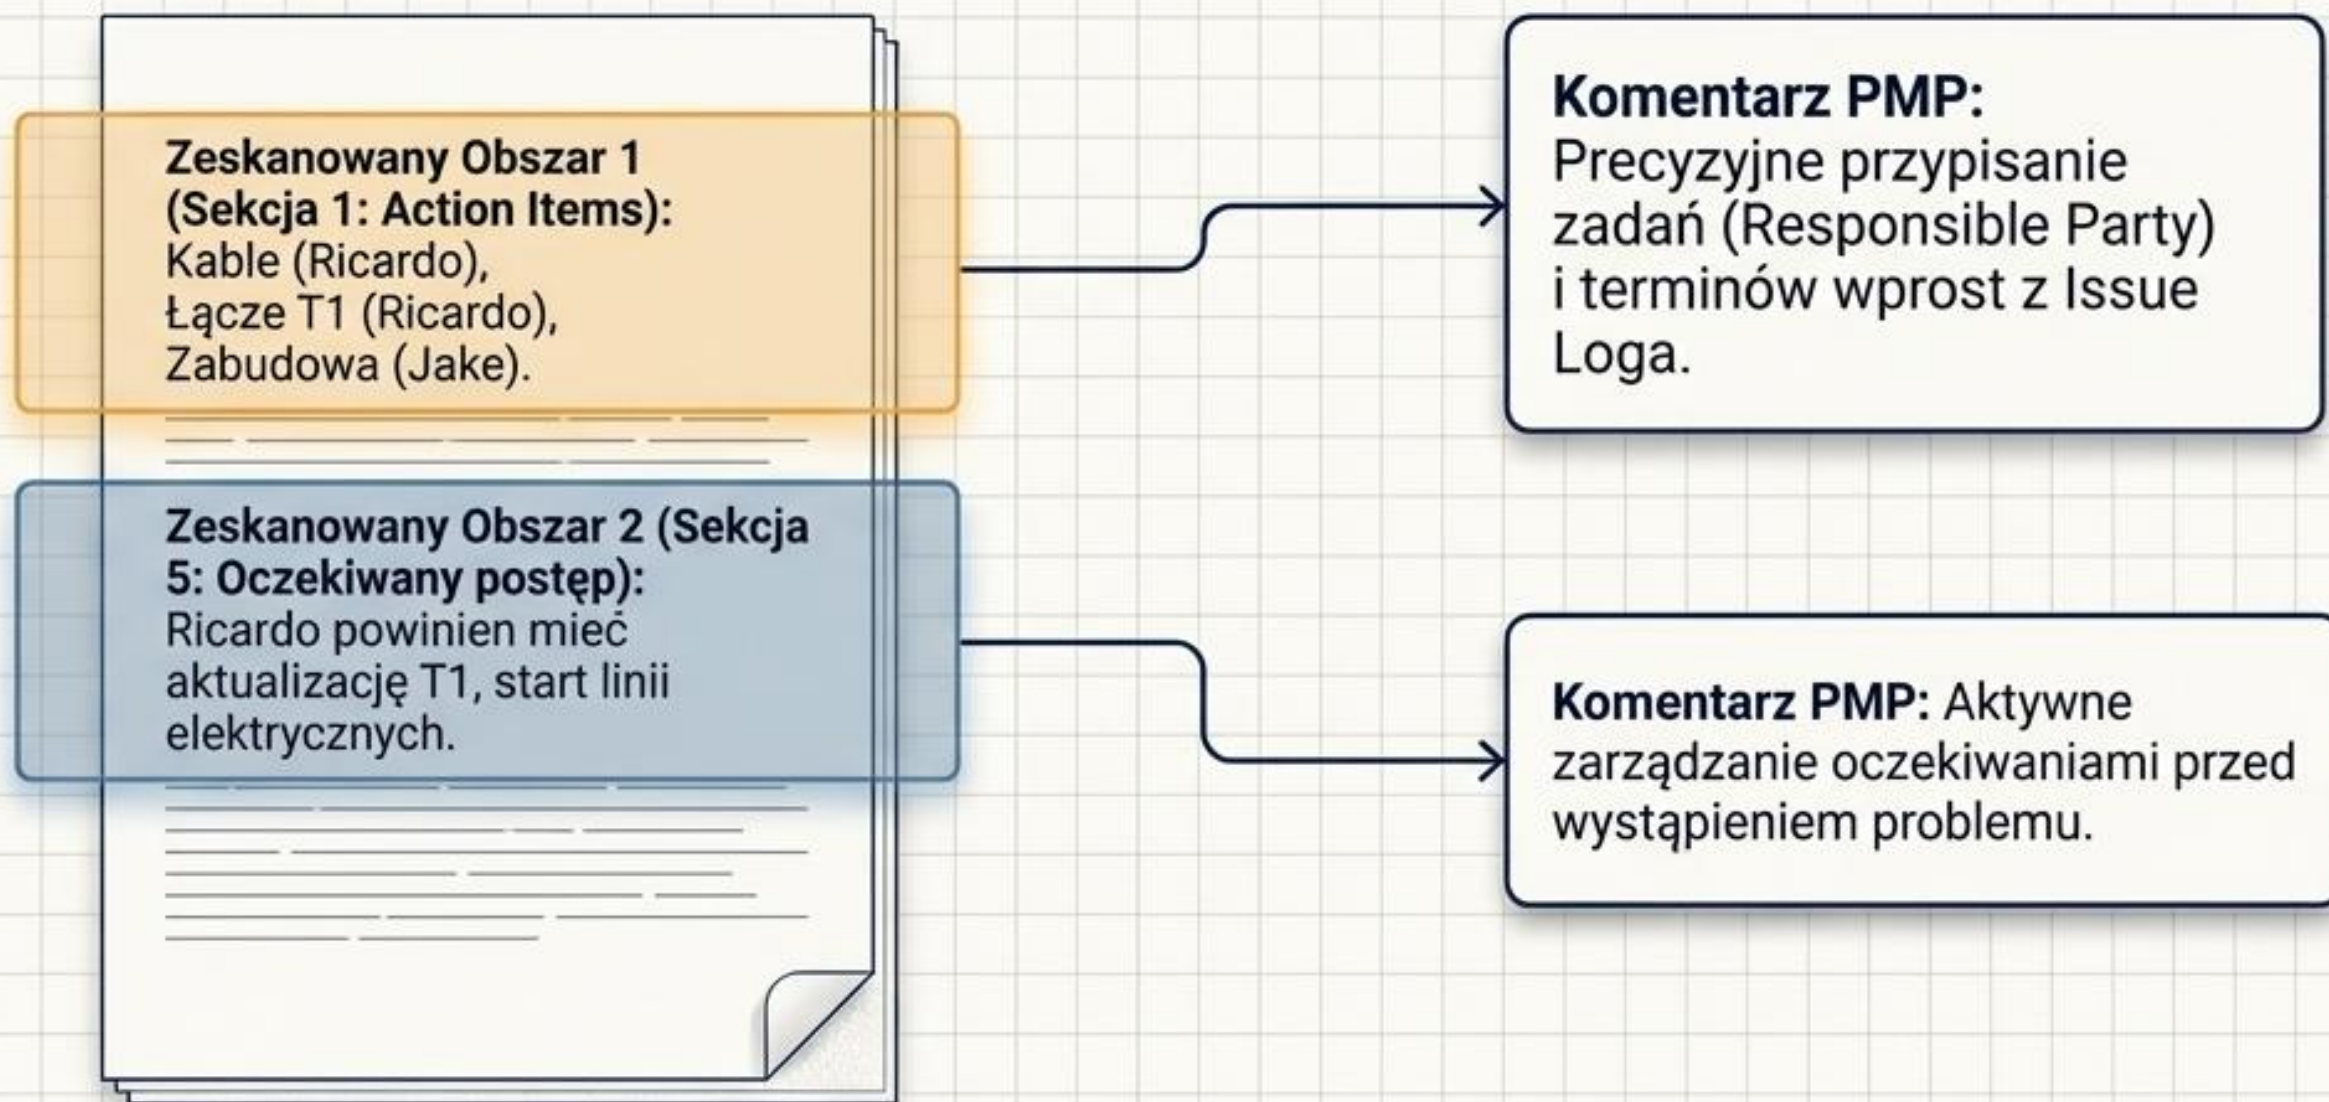

Zasada podsumowująca: Interesariusze muszą słyszeć informację średnio 6 razy, zanim w pełni ją zarejestrują (powtarzalność to klucz).

Rozwiązywanie Problemów na Żywo (Issue Management)

[Zamknięte]

Kolizja Fast Tracking

Opis: Rozpoczęcie zabudowy w ostatnim dniu układania kabli. Wykonawcy wchodzili sobie w drogę.

Status: Mitygowane operacyjnie (brak wpływu na harmonogram).

[Zamknięte]

Zasoby Gomez Construction

Opis: Kluczowy pracownik nieobecny (nagły wypadek rodzinny).

Status: Zastąpiony przez dostawcę. Ryzyko zażegnane.

[Otwarte w Issue Log]

Milczenie dostawcy T1

Opis: Brak zwrotnych telefonów do Ricardo. Testy sprzętu zaplanowane na 21 stycznia.

Akcja PM: Rejestracja w Issue Log jako heads-up. Monitorowanie w kolejnych raportach aż do rozwiązania.


Ekosystem Fazy Realizacji (Executing)

Zapewnienie Jakości (Quality Assurance)

Audyty zgodności ze standardami (np. niezależny inspektor upewniający się, że budowa jest zgodna z kodem miasta).

Przeprowadzanie Zamówień (Conduct Procurements)

Bidy, wybór dostawców, negocjacje i kontrakty (np. fixed-price na sprzęt IT).

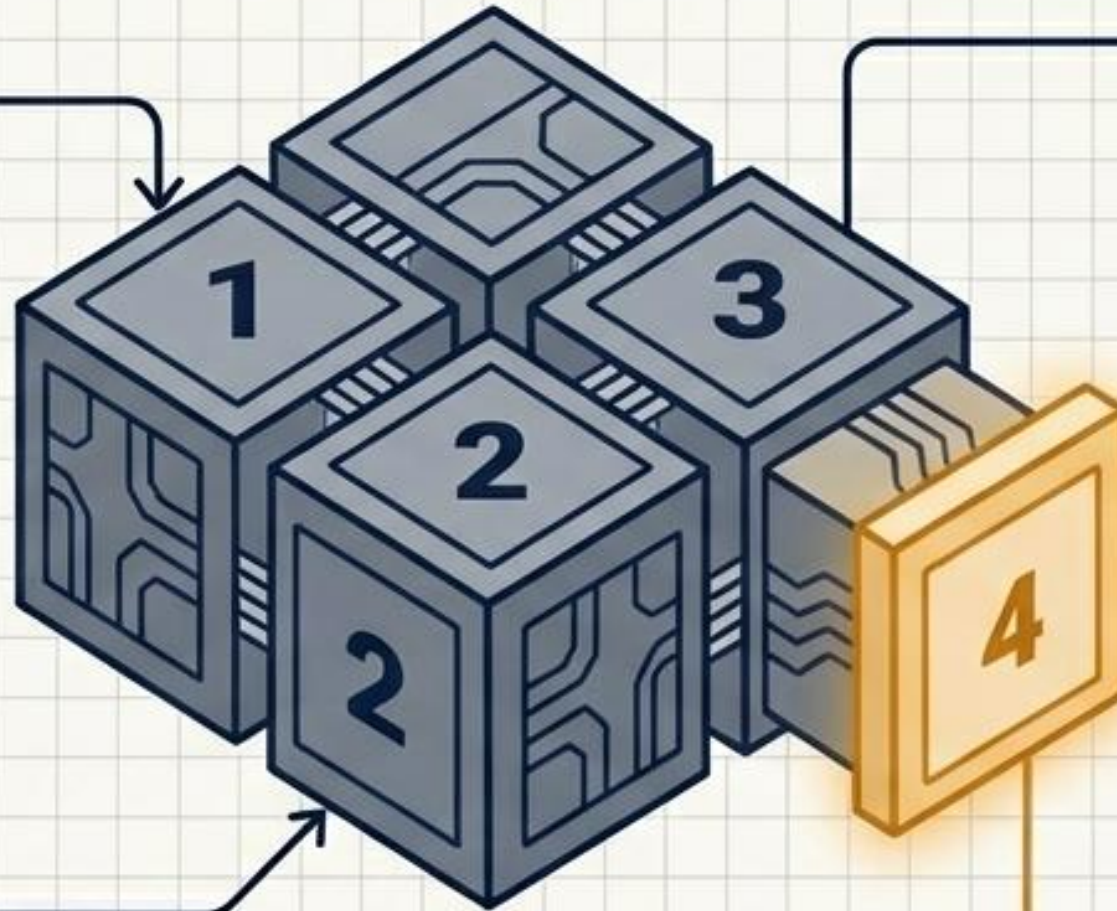


Zarządzanie Komunikacją

Dostarczanie informacji (raporty) we właściwym czasie.

Angażowanie Interesariuszy

Aktywne adresowanie obaw i dyskusja nad zagadnieniami.

Silnik Iteracyjny

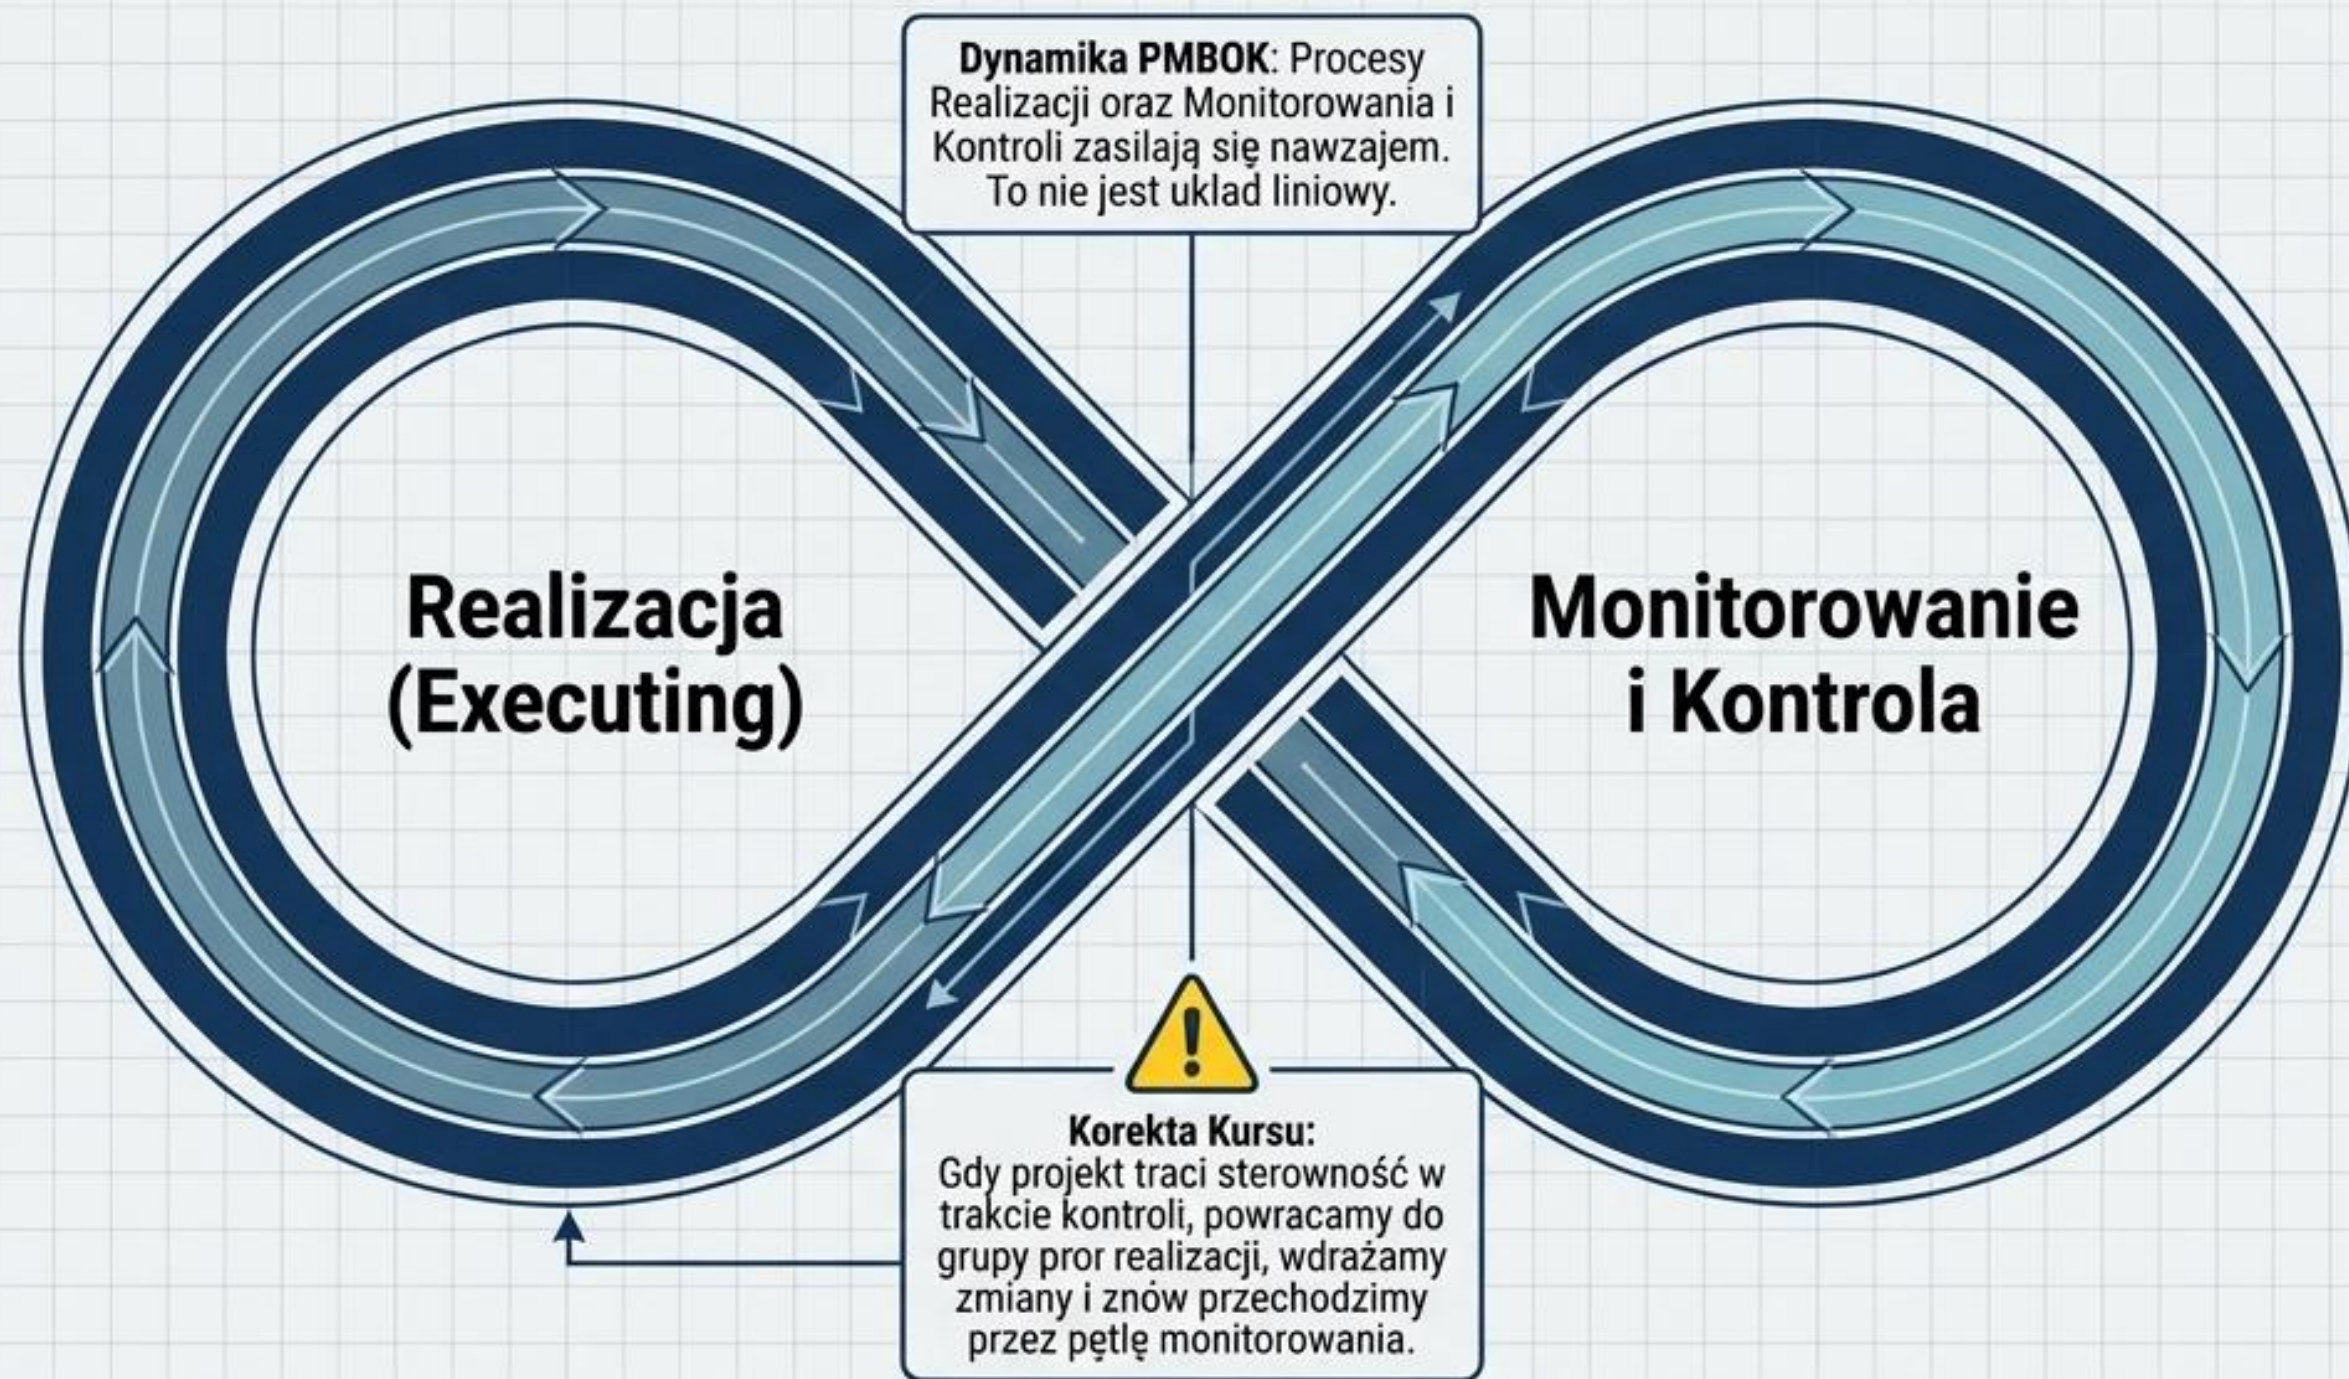

Droga w przód: Faza Executing jest zakończona. Projekt przechodzi w fazę weryfikacji i sterowania.

PMP Exam Spotlight – Kluczowe Fiszki

Fiszka 1: **Odpowiedzialność PM-a**



To Kierownik Projektu jest bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy (nie sponsor, nie zespół).

Fiszka 2: **Narzędzie Konsensusu**



Rejestr Zagadnień (Issue Log) służy do tego, aby zarówno zespół, jak i interesariusze mieli absolutnie jednakowe, wspólne zrozumienie problemów.

Fiszka 3: **Prawo Komunikacji**



Nadawcy są odpowiedzialni za jasne, zwarte i kompletne wiadomości. Odbiorcy odpowiadają za ich poprawne zinterpretowanie.
