



Certyfikat PMP®: Kontroling wyników i zakupów projektu

Monitorowanie pracy i zarządzanie realizacją
umów według standardów PMBOK®

dr Zbigniew Galar

MONITOR & CONTROL PROJECT WORK

RAPORTOWANIE
STATUSU

ZARZĄDZANIE
ZMIANAMI

AKTUALIZACJE
PLANÓW

ZINTEGROWANA KONTROLA


Osiąganie celów
projektu przy
jednoczesnej
ochronie prawnej i
finansowej obu stron
umowy.

CONTROL PROCUREMENTS

AUDYTY
WYDAJNOŚCI

ZARZĄDZANIE
UMOWAMI

KOORDYNACJA
WYKONAWCÓW

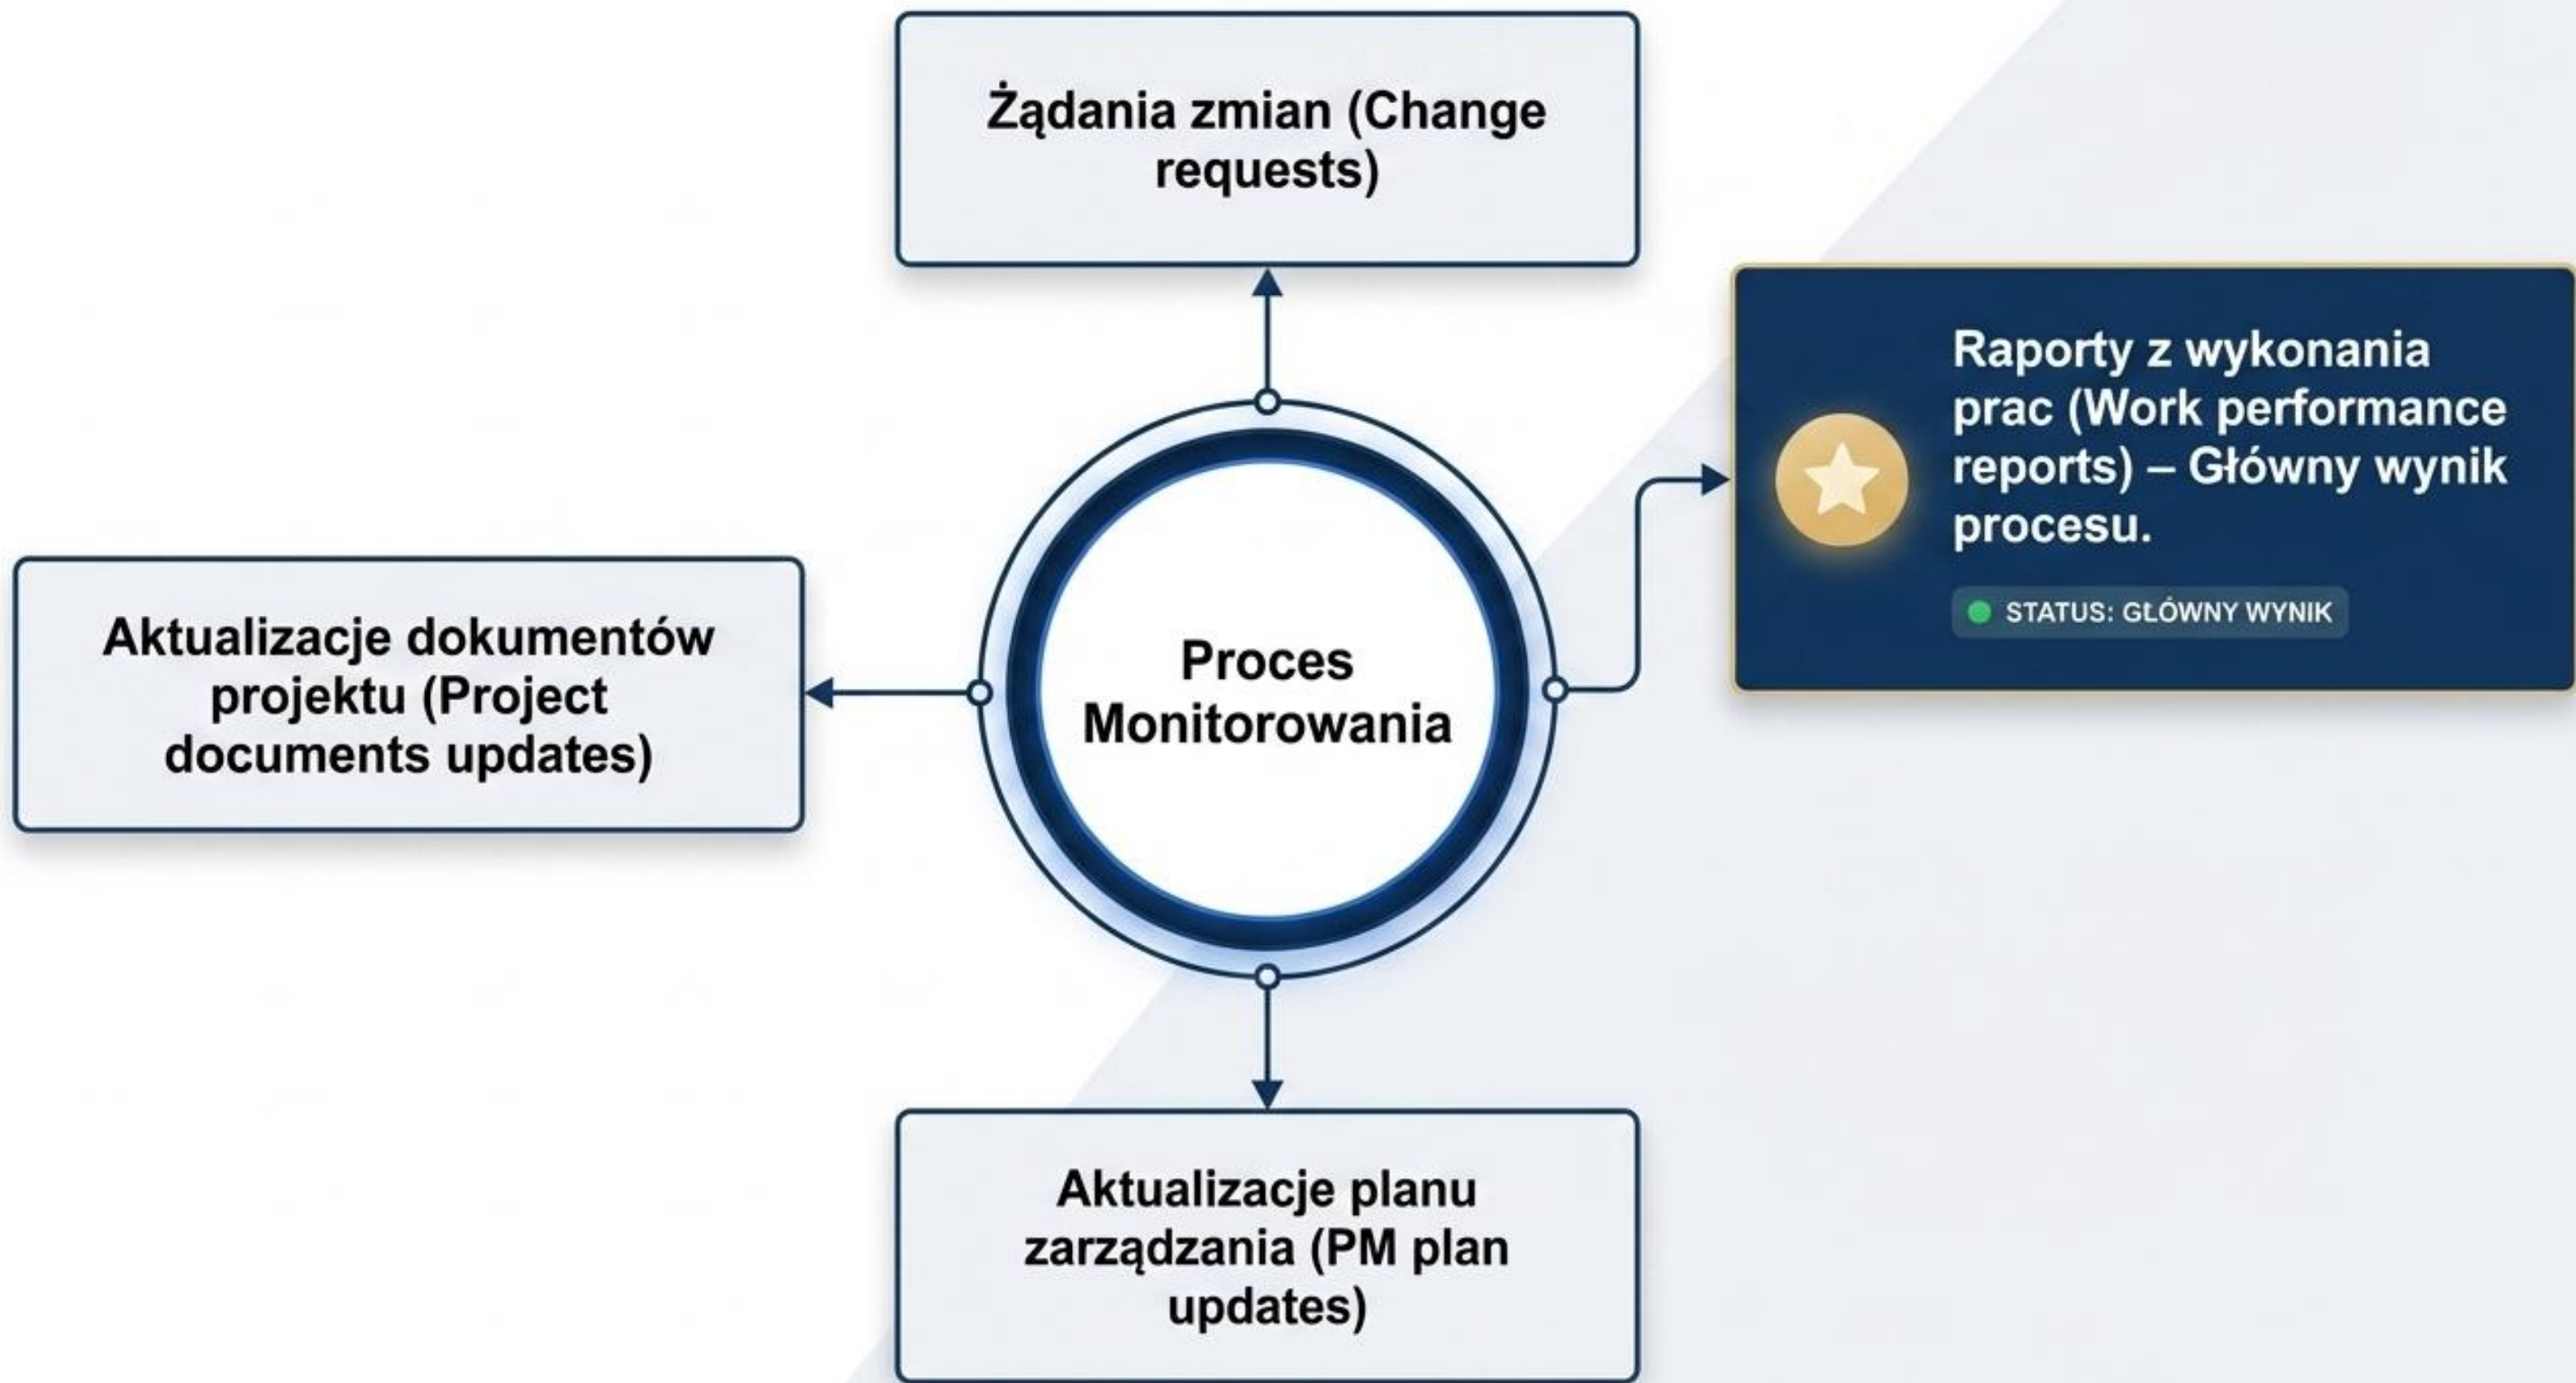



Działanie Korygujące

(Corrective action)

Doprowadzenie przyszłych
wyników prac do
zgodności z pierwotnymi
oczekiwaniami.



Działanie Prewencyjne

(Preventive action)

Wdrożenie środków
zmniejszających
prawdopodobieństwo
wystąpienia negatywnych
ryzyk projektowych.



Naprawa Wad

(Defect repair)

Korekta lub wymiana
komponentów, które są
wadliwe lub nie spełniają
standardów
(substandard).

Poziom Executive

STATUS PROJEKTU



CZERWONY: Problem/Opóźnienie



ŻÓŁTY: Ryzyko/Wymagana uwaga



ZIELONY: Zgodnie z planem

CEL:

Szybka ocena statusu dla decydentów.
Tworzenie świadomości problemów i
generowanie akcji.

Poziom Szczegółowy / PMBOK Elements



Analiza odchyleń (Variance analysis)



Prognozy czasu i kosztów



Status ryzyk i problemów




Prace zrealizowane vs. Planowane




Zatwierdzone zmiany w bieżącym okresie

Rola PM w ekosystemie zakupów

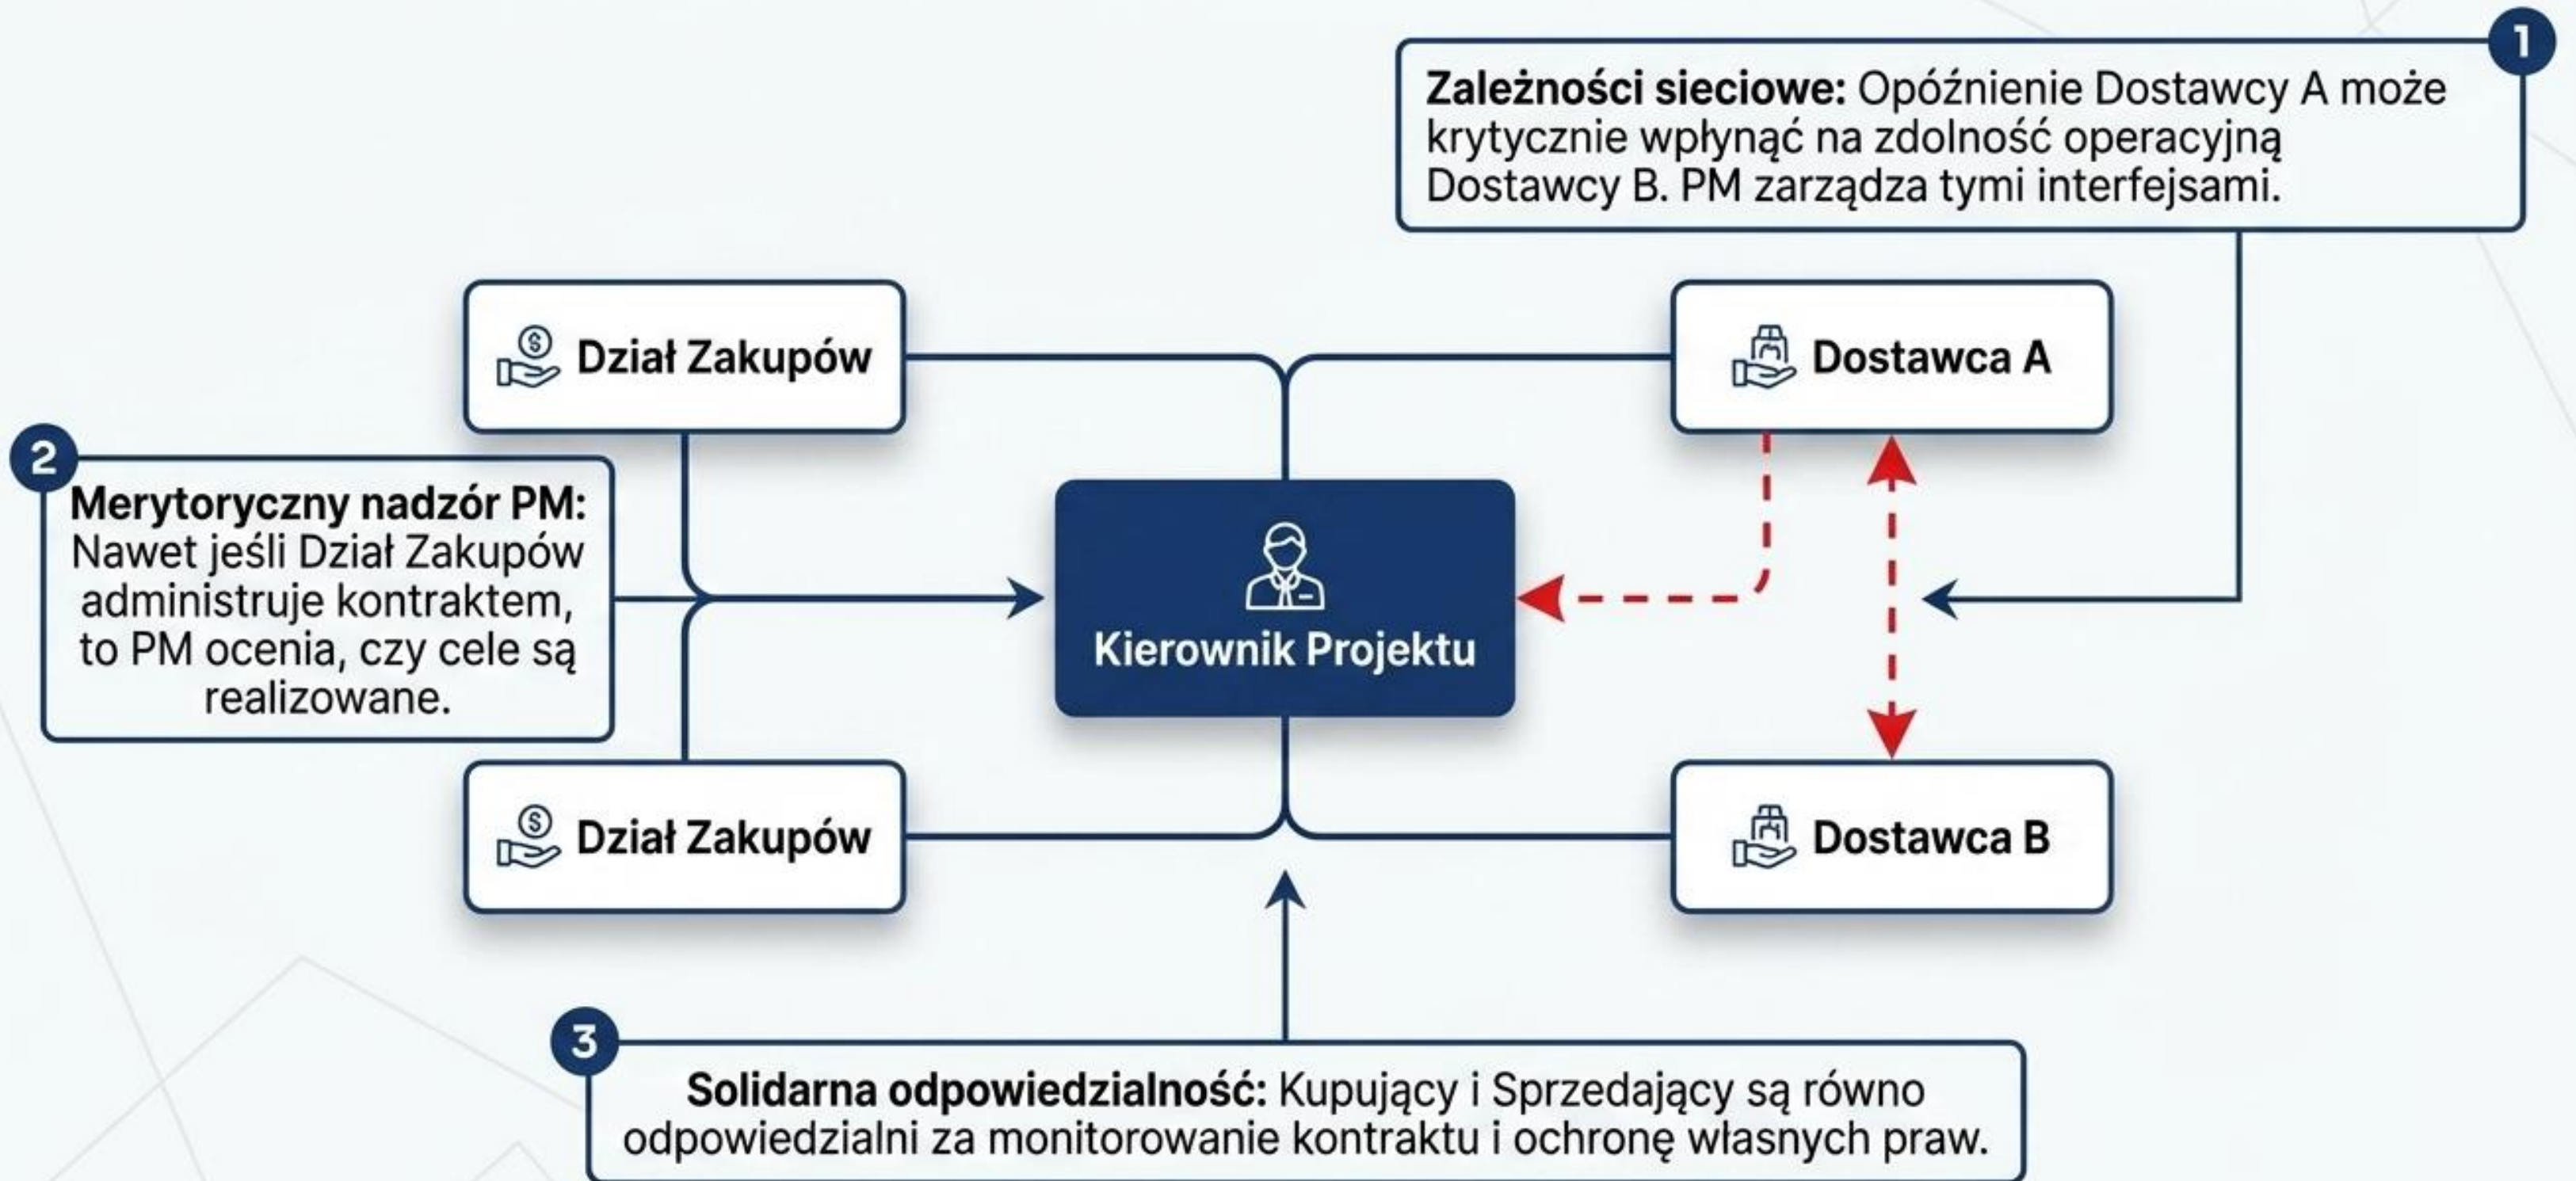

CONTROL PROCUREMENTS PROCESS INPUTS

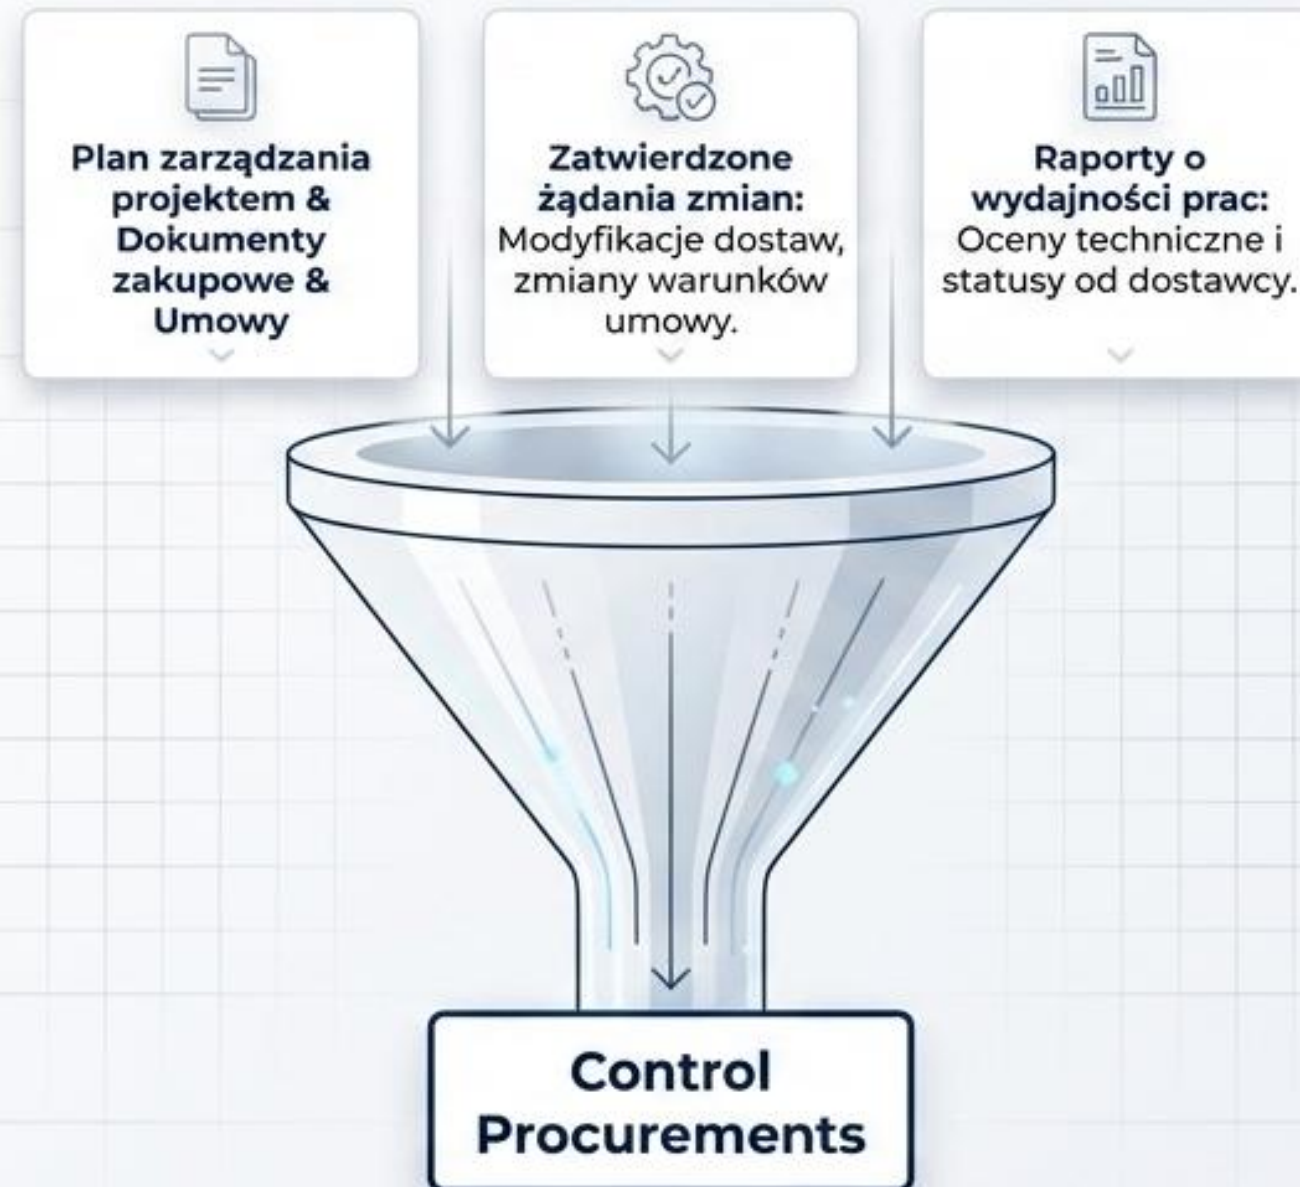

EXAM SPOTLIGHT

Surowe 'Dane o wykonaniu prac' (Work Performance Data) gromadzone w tym procesie to faktycznie wyjście z procesu Direct and Manage Project Work.

PRZYCZYNY ZAKOŃCZENIA KONTRAKTU

Z PRZYCZYNY (CAUSE)



Naruszenie warunków umowy przez jedną ze stron (naruszenie prawne lub rażące zaniedbanie).

Z WYGODY (CONVENIENCE)



Jedna ze stron decyduje się nie kontynuować umowy, co jest dozwolone przez klauzule w kontrakcie (za obopólnym porozumieniem lub okresem wypowiedzenia).

Z NIEDOTRZYMANIA (DEFAULT)



Strona nie wywiązała się z obowiązku dostarczenia prac zgodnie z określonymi warunkami i specyfikacją (SOW).

ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI - ANALIZA RYZYKA

Zarządzanie kontraktami - analiza na podstawie stron, konkretnie warunków umowy, za dostawę prac jest dozwolone przez klauzule w kontrakcie - (za porozumieniem lub okresem wypowiedzenia).

SYSTEM KONTROLI ZMIAN W UMOWIE

(Contract Change Control System)



Formalny proces składania, autoryzacji (odpowiednie poziomy uprawnień) i śledzenia zmian w dokumentacji prawnej (zintegrowane z Integrated Change Control).



PRZEGLĄDY WYDAJNOŚCI ZAMÓWIEŃ

(Procurement Performance Reviews)



Audyty jakości, inspekcje fizyczne i weryfikacja dokumentów.

Cel: Porównanie rzeczywistych wyników z umową SOW - weryfikacja Zakresu, Jakości, Budżetu i Harmonogramu.



DRABINA ESKALACJI ROSZCZEŃ

Krok 1: Negocjacje

Preferowana metoda PMBOK®. Bezpośrednie, polubowne rozstrzygnięcie spornych zmian o wynagrodzenie.

Krok 2: Arbitraż (ADR)

Wejście bezstronnej osoby trzeciej (arbitra) w celu wypracowania porozumienia bez angażowania systemu sprawiedliwości.

Krok 3: Sąd


Ostateczność, gdy zawiodą wszystkie inne formy.



Złota Zasada Dokumentacji

Records Management System: To nie tylko pliki, ale zintegrowane polityki, funkcje kontrolne i automatyczne narzędzia indeksowania. Niezbędne zabezpieczenie przed roszczeniami i dla celów audytowych.

Cykl Życia Płatności

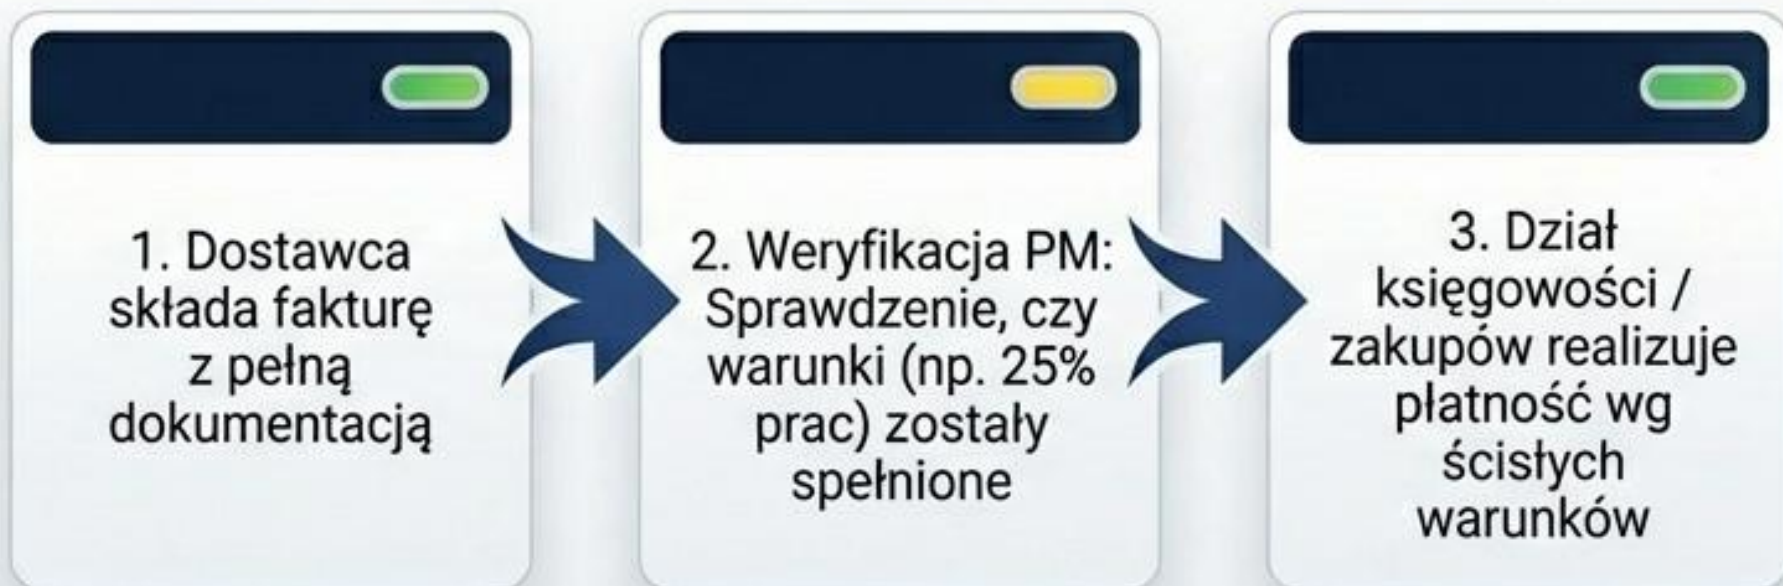

Organizational Process Assets (OPA) Updates

Korespondencja



Formalne powiadomienia na piśmie: ostrzeżenia o słabych wynikach, wytyśnienia klauzul, ewentualne wezwania do rozwiązania umowy.

Harmonogramy płatności




Wnioski zrealizowane i procesowane wyłącznie na podstawie pisemnej akceptacji kamieni milowych przez PM-a.

Ocena wydajności dostawcy



Piśmy zapis historyczny. Podstawa do: kar, premii, wcześniejszego rozwiązania umowy lub wpisania na listę kwalifikowanych/zakazanych dostawców.

ZAMKNIĘTY CYKL INTERAKCJI ZMIAN ZAMÓWIEŃ NA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

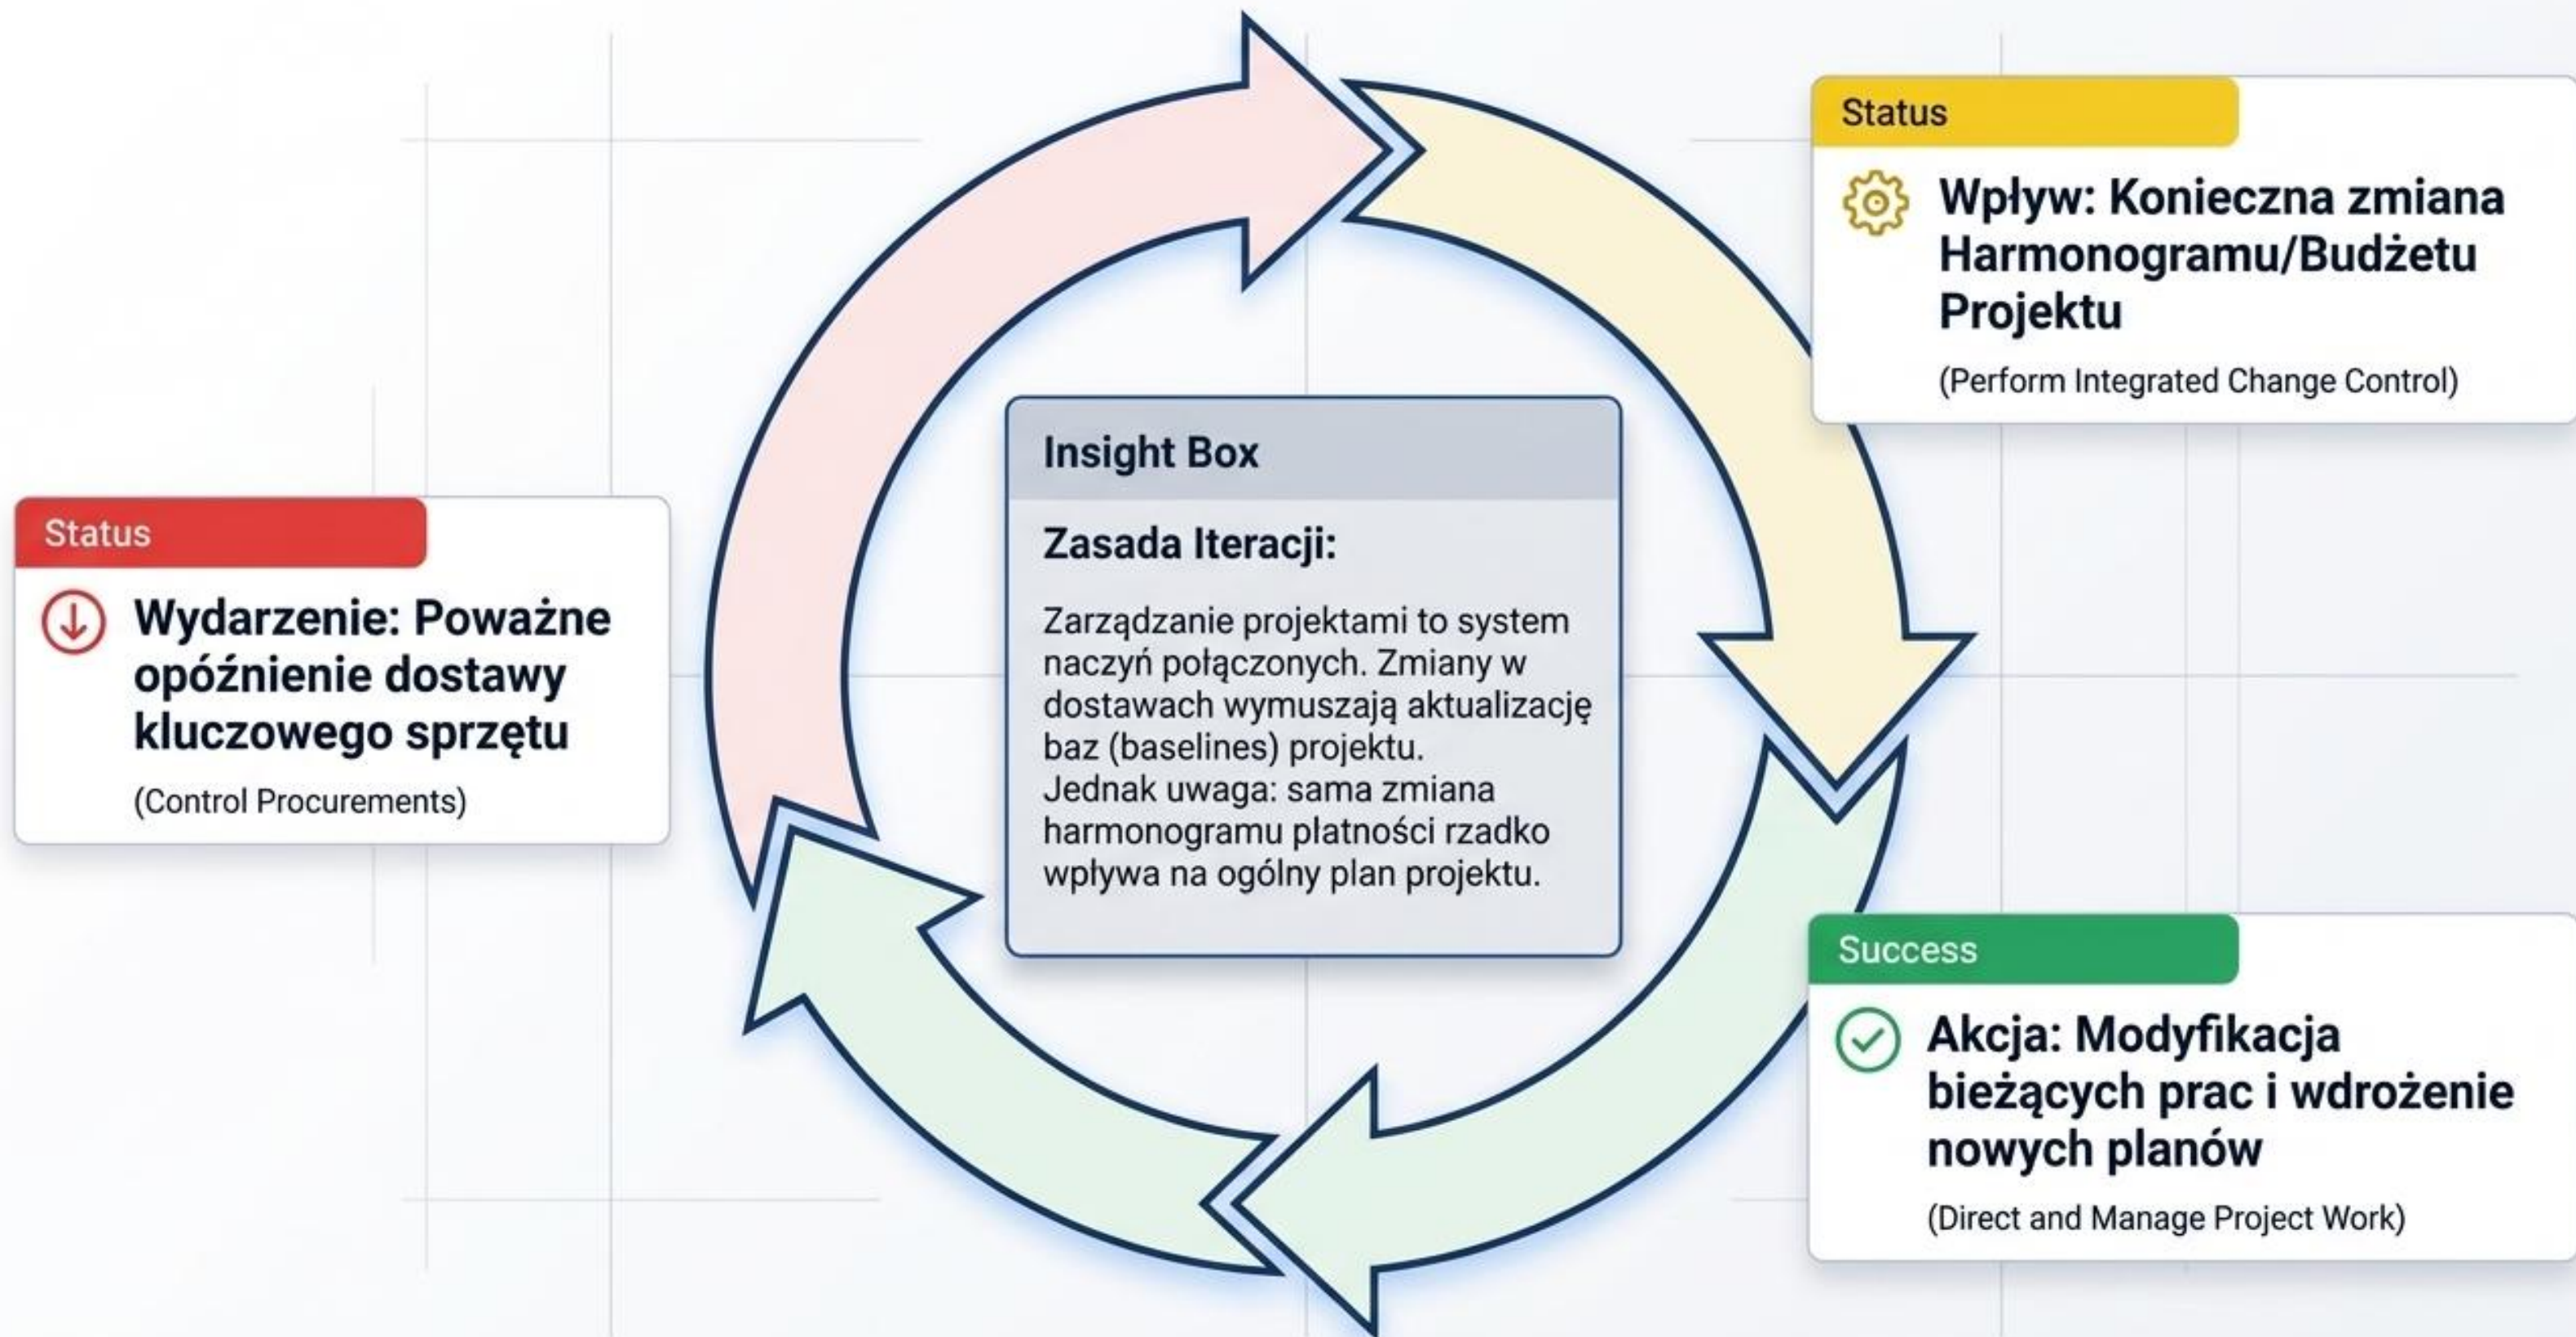

PMBOK® Exam Spotlight - Złote Reguły



Solidarność: Kupujący i Sprzedający są solidarnie odpowiedzialni za monitorowanie kontraktu i ochronę własnych praw prawnych.



Roszczenia: Preferowaną metodą rozwiązywania sporów roszczeniowych są zawsze negocjacje. Alternatywą (ADR) jest arbitraż – sąd to ostateczność.



Odpowiedzialność PM: Nawet jeśli administracją umowy i wypłatami zajmuje się Dział Zakupów, to PM ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną realizację celów kontraktu i akceptację wyników pracy (deliverables).
