


[Certyfikat PMP]

Kontroling komunikacji projektu

Transformacja danych, zarządzanie przekazem
i optymalizacja przepływu informacji według PMBOK®

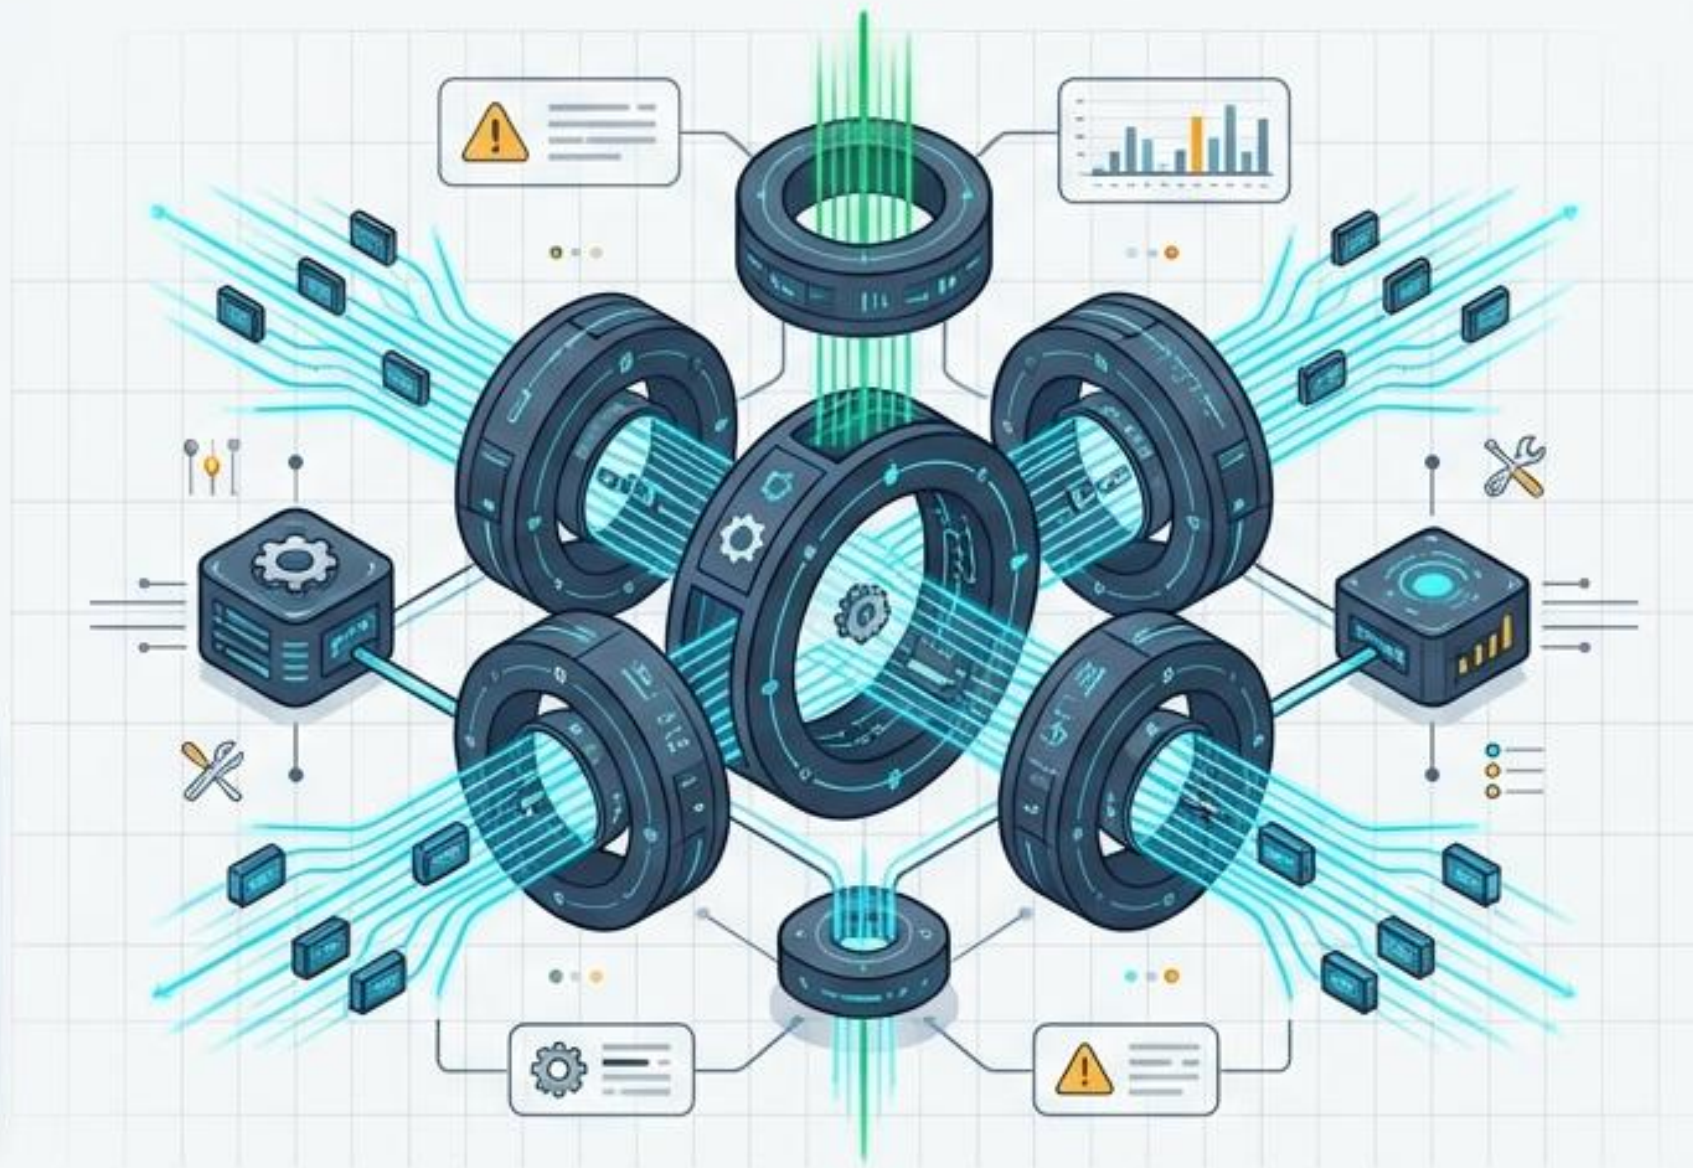

Autor:
dr Zbigniew Galar


Skuteczny kontroling mierzy wydajność i zarządza wpływem

Grupa procesów **Monitorowania i Kontrolowania** skupia się na identyfikowaniu odchyleń od planu projektu. **Kontroling komunikacji** ocenia i kontroluje wpływ przekazywanych wiadomości.

[PMBOK® ZASADA EGZAMINACYJNA]



Architektura Procesu: Przepływ Informacji (ITTO)

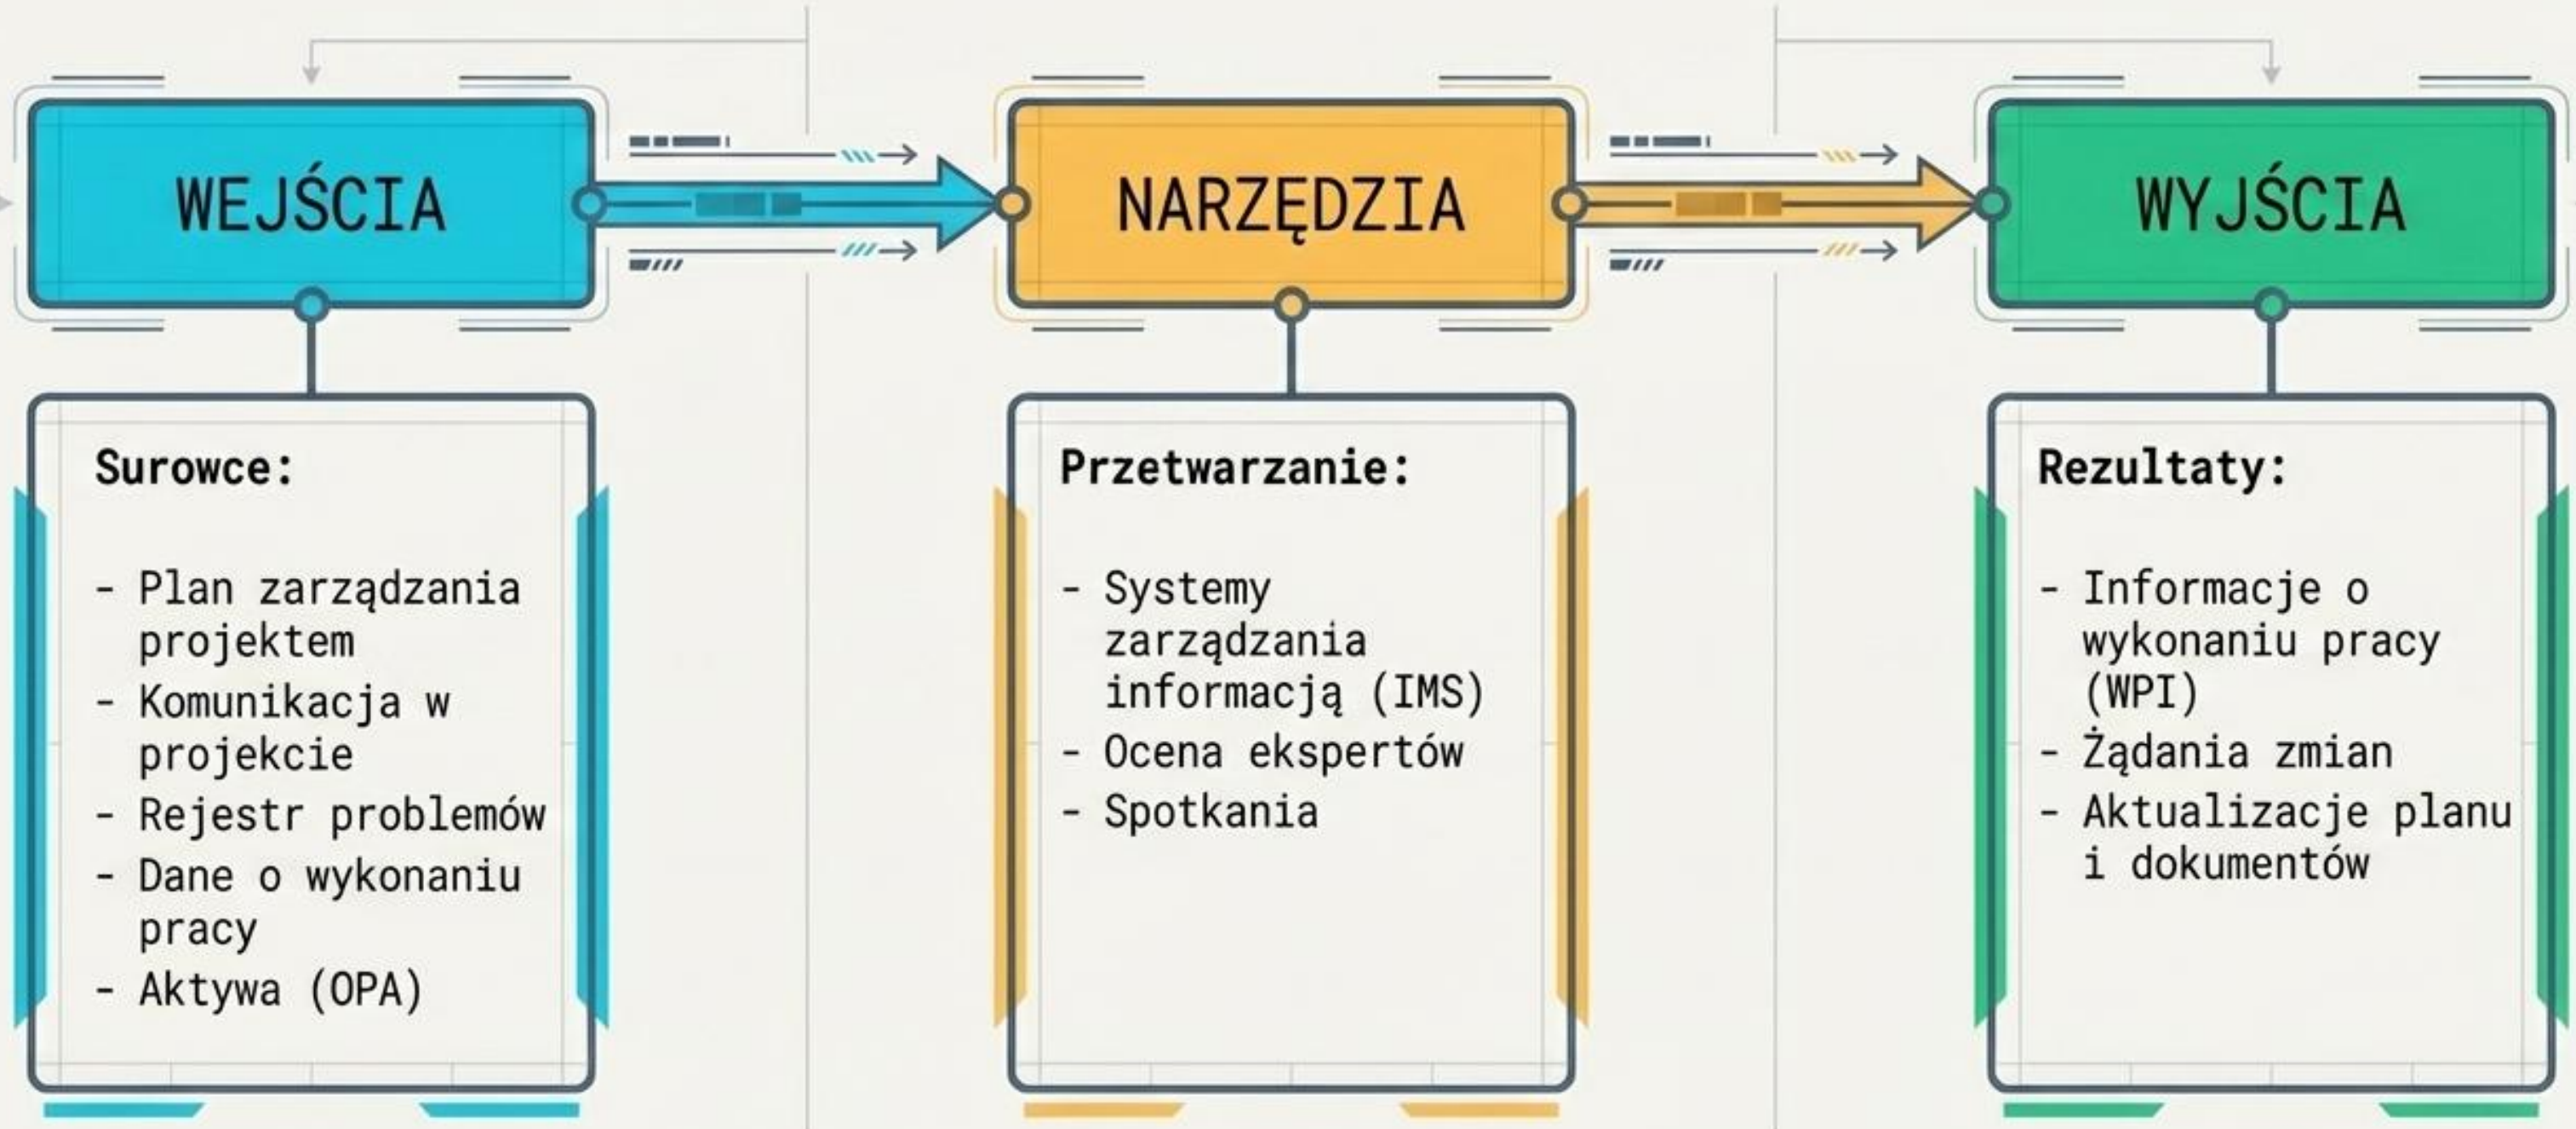

Paliwo dla procesu: Wejścia analityczne



Plan zarządzania projektem

Baza odniesienia. Zawiera bazowe dane o kosztach, harmonogramie i zakresie do porównań i identyfikacji odchyleń.

Dane o wykonaniu pracy (Work Performance Data)

Surowe fakty, pomiary i obserwacje z realizacji projektu.

Rejestr problemów (Issue Log)



Kluczowe narzędzie na spotkaniach statusowych. Wskazuje, kto odpowiada za problem, jaki jest termin i co blokuje postęp.

[Wskazówka: Utrzymuje odpowiedzialność interesariuszy]

Dane ewaluacji sni procesów

Sablony informacji, zwaczy prokuracje konsultacji, gości zakres i dane i sakadań perobetta.

Aktywa procesów (OPA)

Szablony raportowania, polityki komunikacyjne, standardy bezpieczeństwa danych i zasady retencji.


Silnik przetwarzania: Systemy i Eksperci

3-step pipeline

WEJŚCIA

NARZĘDZIA

WYJŚCIA

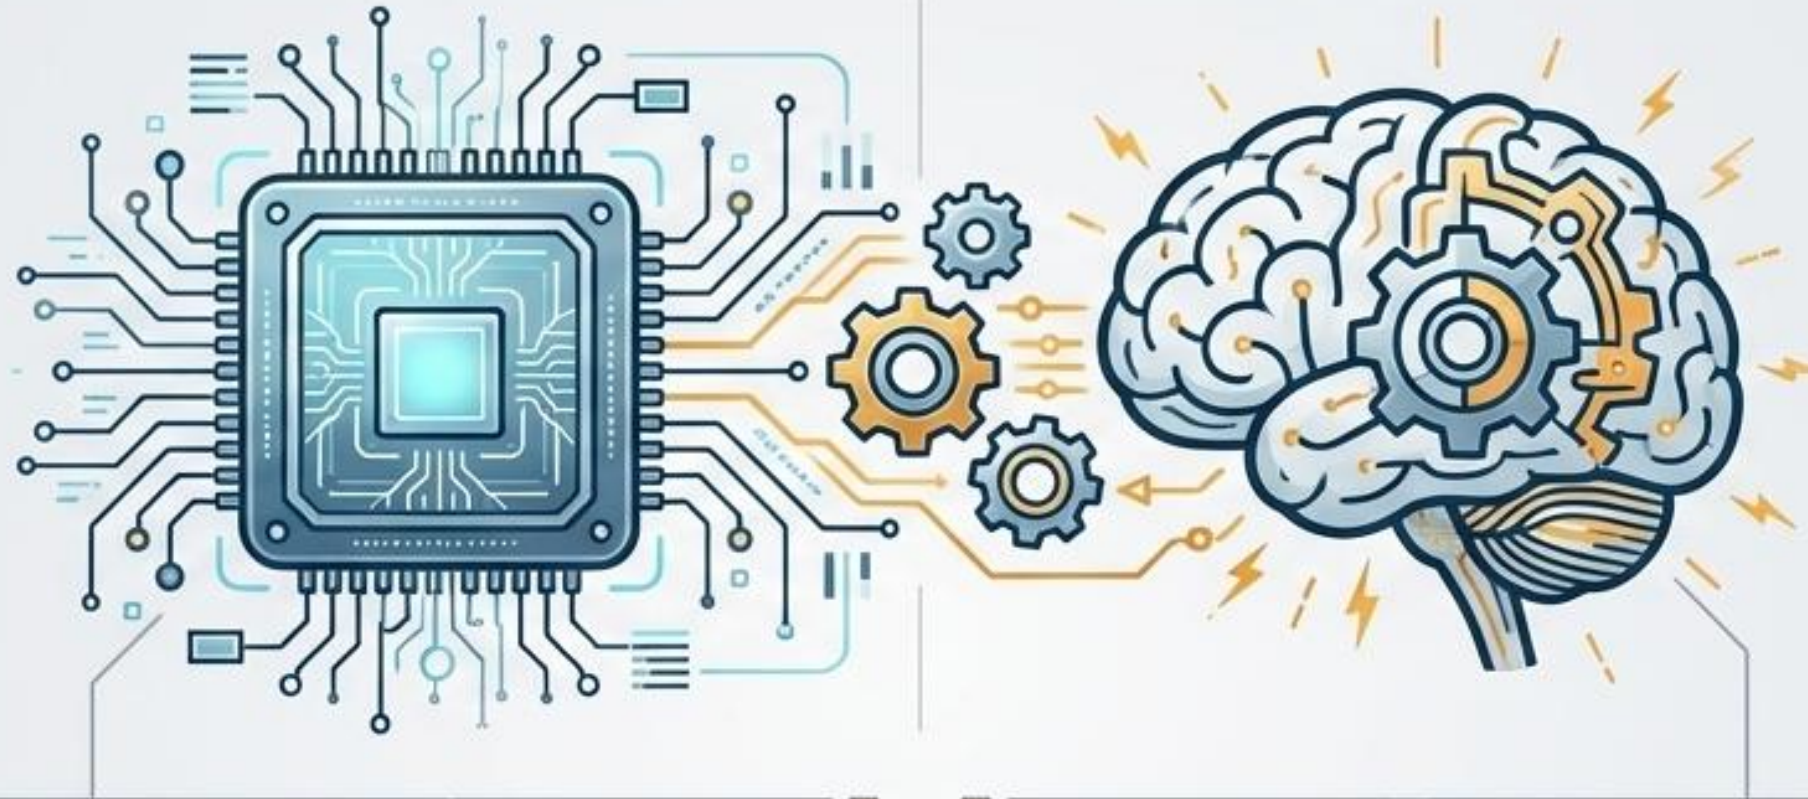

Systemy Zarządzania Informacją (IMS)

[NARZĘDZIE]



Rola: Rejestrowanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o kosztach, harmonogramie i wydajności.



Formaty: Analizy arkuszy kalkulacyjnych, prezentacje, raporty tabelaryczne, wykresy.



Ocena Ekspertów (Expert Judgment)

[ZASOBY LUDZKIE]



Rola: Interpretacja zebranych danych przez zespół, PMO, konsultantów i interesariuszy.



Cel: Podejmowanie decyzji korygujących, wyrównanie prac z planem bazowym i spełnienie oczekiwań interesariuszy.

Anatomia skutecznego spotkania statusowego

Prawdziwy Cel

Wymiana informacji i formalna aktualizacja postępów. To NIE jest demonstracja produktu (show-and-tell). Do prototypów używaj osobnych spotkań.

Limit Obciążenia

Maksymalnie 3-4 spotkania statusowe w miesiącu (np. dla zespołu, interesariuszy, zarządu).

Unikaj bezcelowego powielania.

Złote Zasady Prowadzenia (Zadania PM-a)



1. Publikuj i bezwzględnie trzymaj się agendy.
2. Limituj poboczne wątki (rabbit trails) i nieistotne rozmowy.
3. Regularnie podsumowuj dyskusję.
4. Rozsyłaj notatki i przypisuj zadania po spotkaniu (tworzy ślad dokumentacyjny i przypomina o odpowiedzialności).



Studium Przypadku: Pułapka Braku Złych Wieści



Syndrom Chicken Little

Kierownik projektu ignoruje ostrzeżenia i sygnały o opóźnieniach od wysoce wykwalifikowanych ekspertów z zespołu.

TA6__85



Kardynalny Błąd

Zatajanie prawdziwego statusu projektu przed komitetem sterującym z obawy przed przekazaniem złych wieści i wiarą, że niebo wcale nie spada.

TA6__86



Skutek

Miliony dolarów stracone na skazany na porażkę projekt.

TECHNEAL_Y5RSES_113

TA6__86




Lekcja

Transparentność i uczciwość w raportowaniu to absolutny priorytet. Złe wieści przekazane zbyt późno to showstopper dla Twojej kariery.

TA6__86

Rezultaty kontroli: Wyjścia z procesu

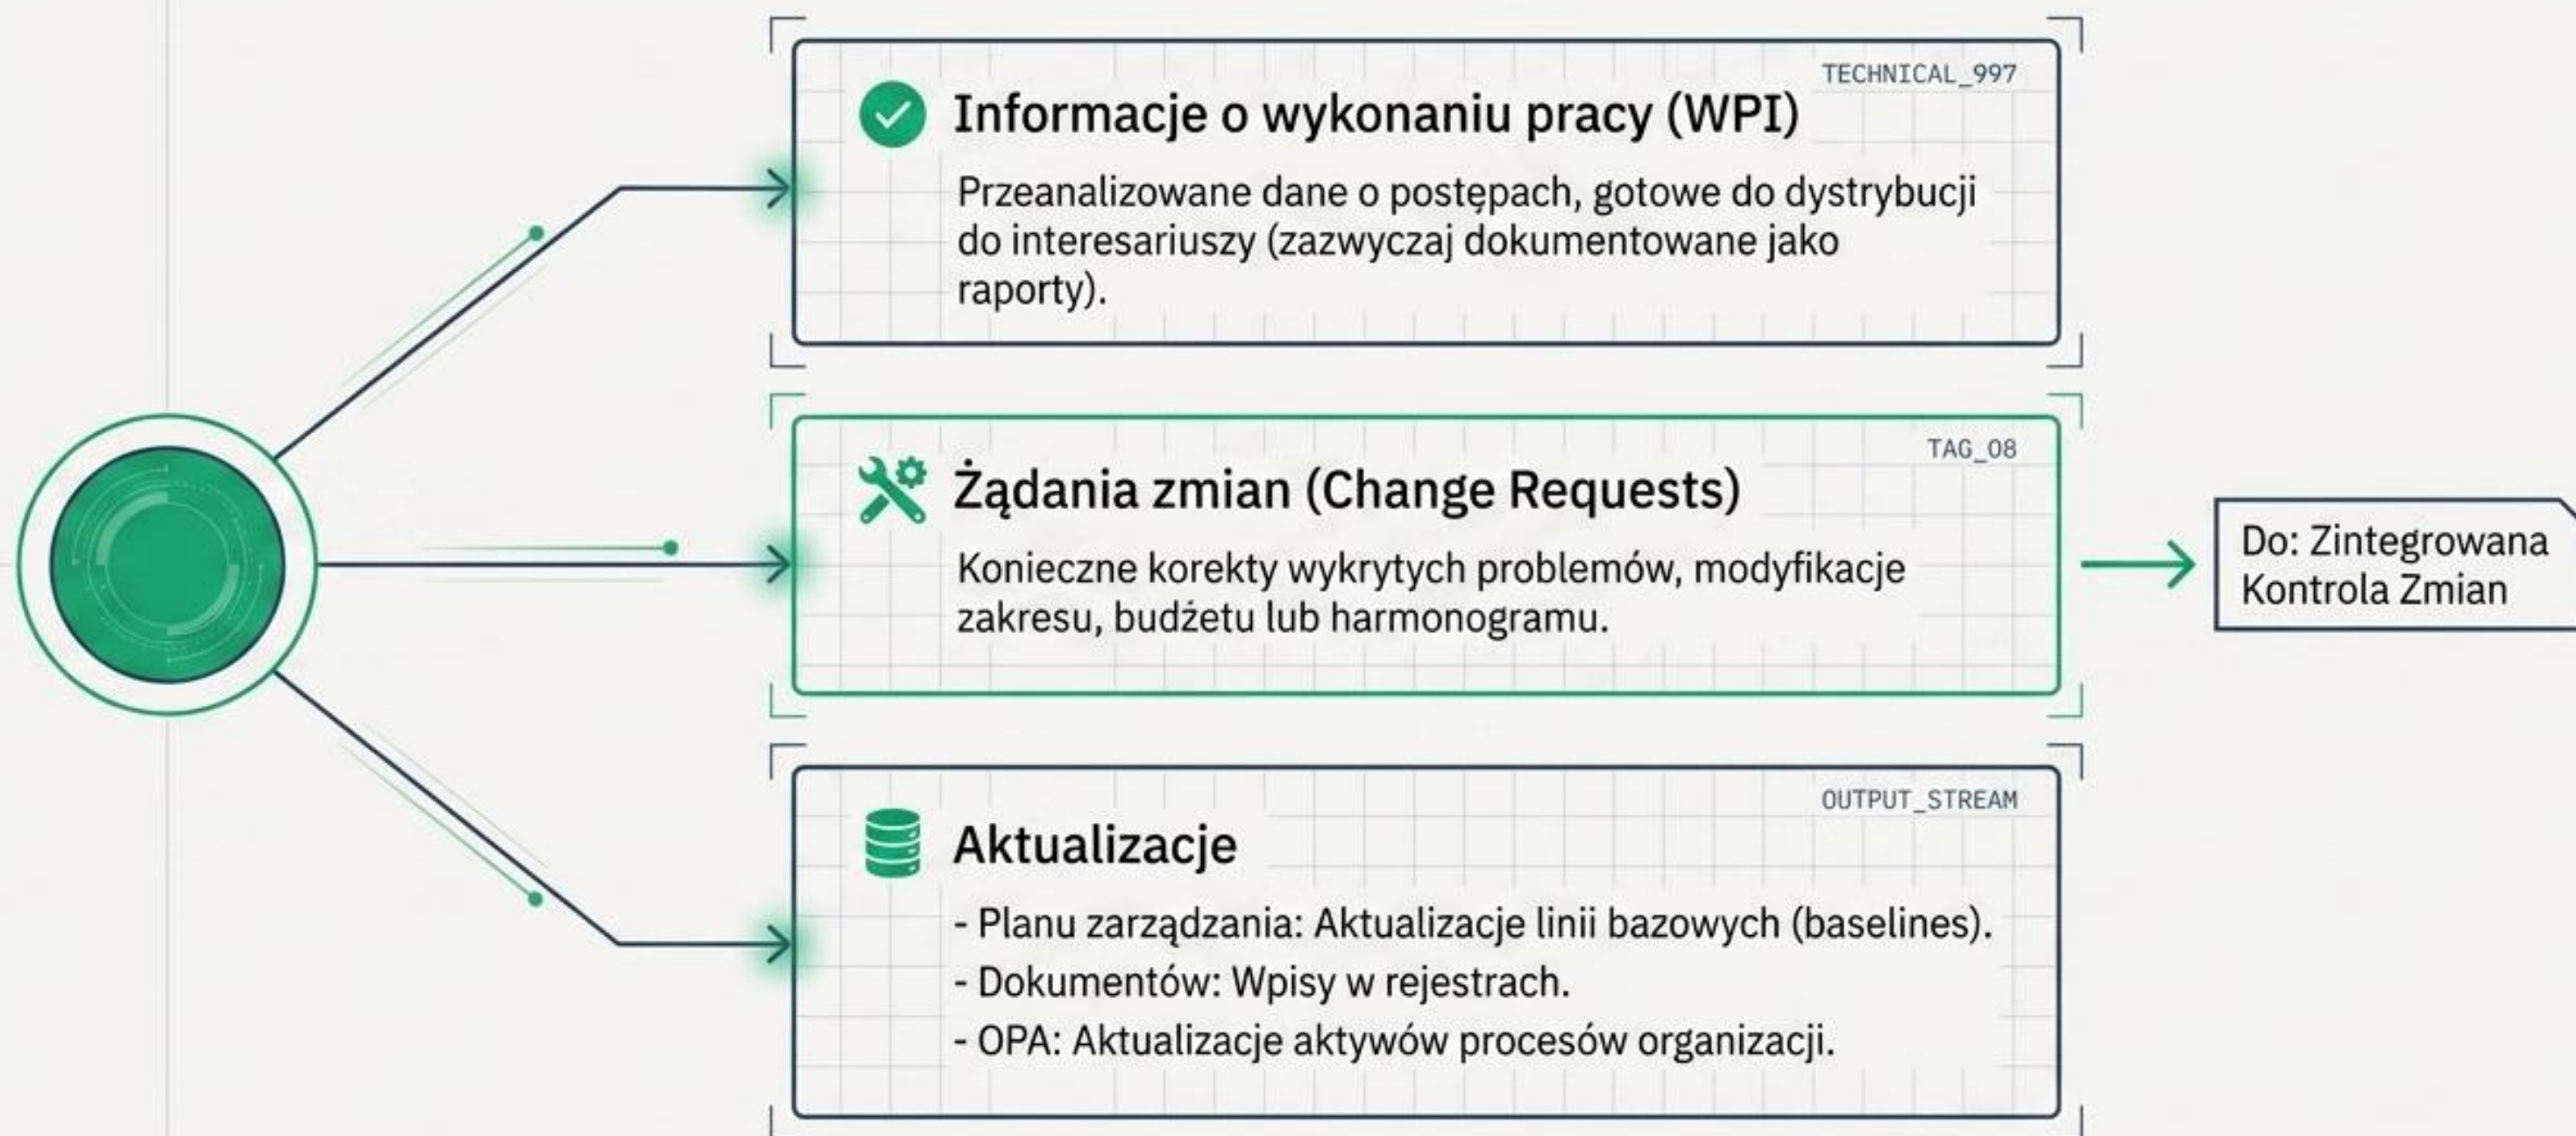

Ewolucja wskaźników: Klucz do egzaminu PMP



UI []

Aby zdać egzamin PMP, musisz bezbłędnie rozróżniać Dane o wykonaniu pracy (WPD), Informacje o wykonaniu pracy (WPI) oraz Raporty o wykonaniu pracy (WPR). Są one wejściami lub wyjściami w wielu procesach grup Wykonania oraz Monitorowania i Kontrolowania.

TAG []

Jest to logiczny przepływ od czystej, surowej obserwacji w fazie Wykonania, przez analitykę w fazie Kontroli, aż po fizyczną manifestację dla interesariuszy.

Matryca Diagnostyczna: WPD vs. WPI vs. WPR

Dane - WPD	Informacje - WPI	Raporty - WPR
Definicja: Surowe pomiary i obserwacje działań projektowych. Lokalizacja: Wyjście z procesu Direct and Manage Project Work. Wejście do procesów kontroli. Przykłady: % ukończenia, rzeczywiste daty startu/zakończenia, liczba defektów/żądań zmian, poniesione koszty.	Definicja: Przeanalizowane dane (kontekst i status). Lokalizacja: Wyjście z procesów Kontroli. Wejście do procesu Monitor and Control Project Work. Przykłady: Status elementów dostarczanych, status żądań zmian, prognozy (np. szacunek do ukończenia - ETC).	Definicja: Fizyczna lub elektroniczna manifestacja informacji (WPI). Lokalizacja: Tworzone dla interesariuszy w procesie Monitor and Control Project Work. Przykłady: Prezentacje statusowe, dashboardy projektowe.

Komunikacja jako centralny układ nerwowy projektu

