


Certyfikat PMP: Kontrola zmian projektu

Autor: dr Zbigniew Galar

System filtracji i nawigacji
w cyklu życia projektu.

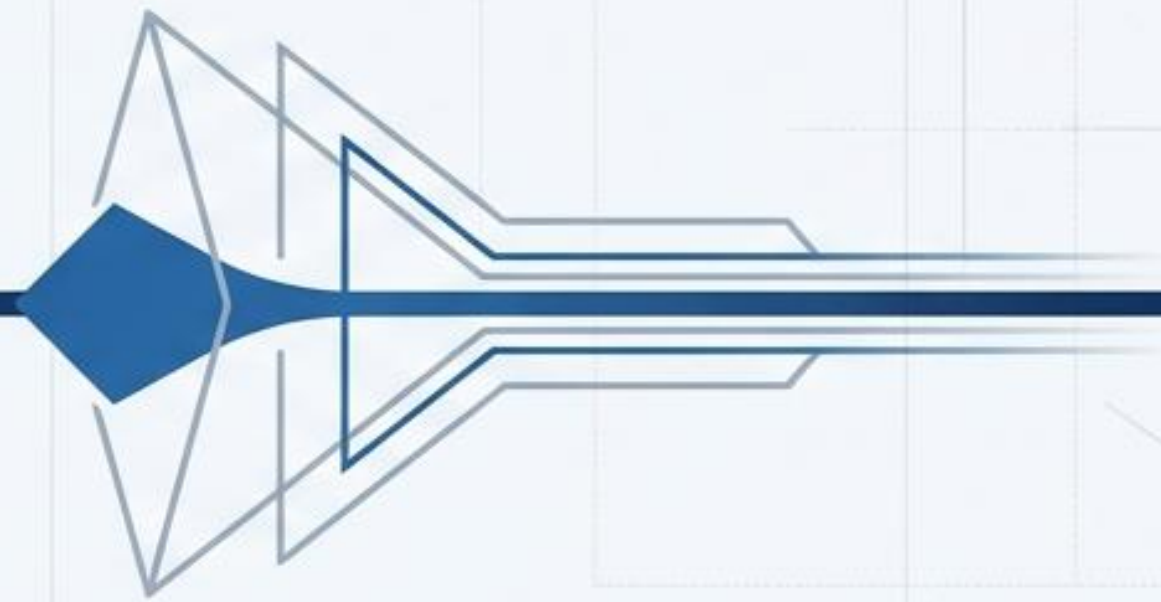

Nieuniknioność zmian niszczy projekty pozbawione rygorystycznej kontroli

Źródła zmian:
Żądania interesariuszy,
błędy planowania,
uwarunkowania dostawców, nowe technologie.



**Skutki
braku
kontroli**

(Żelazny Trójkąt):
Koszt, Harmonogram,
Zakres, Jakość.



Real World Scenario

Scenariusz z życia: Marcus i Kendra.

Marcus zgodził się na „drobne poprawki” (zmiana wyglądu strony), co doprowadziło do żądań modyfikacji całej aplikacji.

Wynik: Pelzanie zakresu (scope creep) i opóźnienia innych projektów.

Moral: Nigdy nie zgadzaj się na zmiany bez formalnej procedury.

Zintegrowana kontrola zmian to główna strefa dowodzenia

Proces ten działa jako nadrzędny nadzorca (overseer) wszystkich procesów Monitorowania i Kontrolowania. To jedyna brama, przez którą jakakolwiek zmiana może wpłynąć na projekt.



Macierz diagnostyczna: Konfiguracja a Kontrola Zmian

⚠ Pułapka egzaminacyjna PMP: Te terminy nie są synonimami.



Kontrola Konfiguracji (Configuration Control)


- **Skupienie:** Specyfikacje fizyczne i cechy produktów (Deliverables).
- **Zarządzanie:** Przez system zarządzania konfiguracją (PMIS).
- **Cel:** Weryfikacja, czy produkt spełnia zdefiniowane wymagania funkcjonalne.



Kontrola Zmian (Change Control)

- **Skupienie:** Zarządzanie projektem (Linie bazowe, koszt, czas, zakres).
- **Zarządzanie:** Przez procedury i Radę Kontroli Zmian (CCB).
- **Cel:** Analiza wpływu zmian na ograniczenia projektowe.

Trzy filary zarządzania konfiguracją

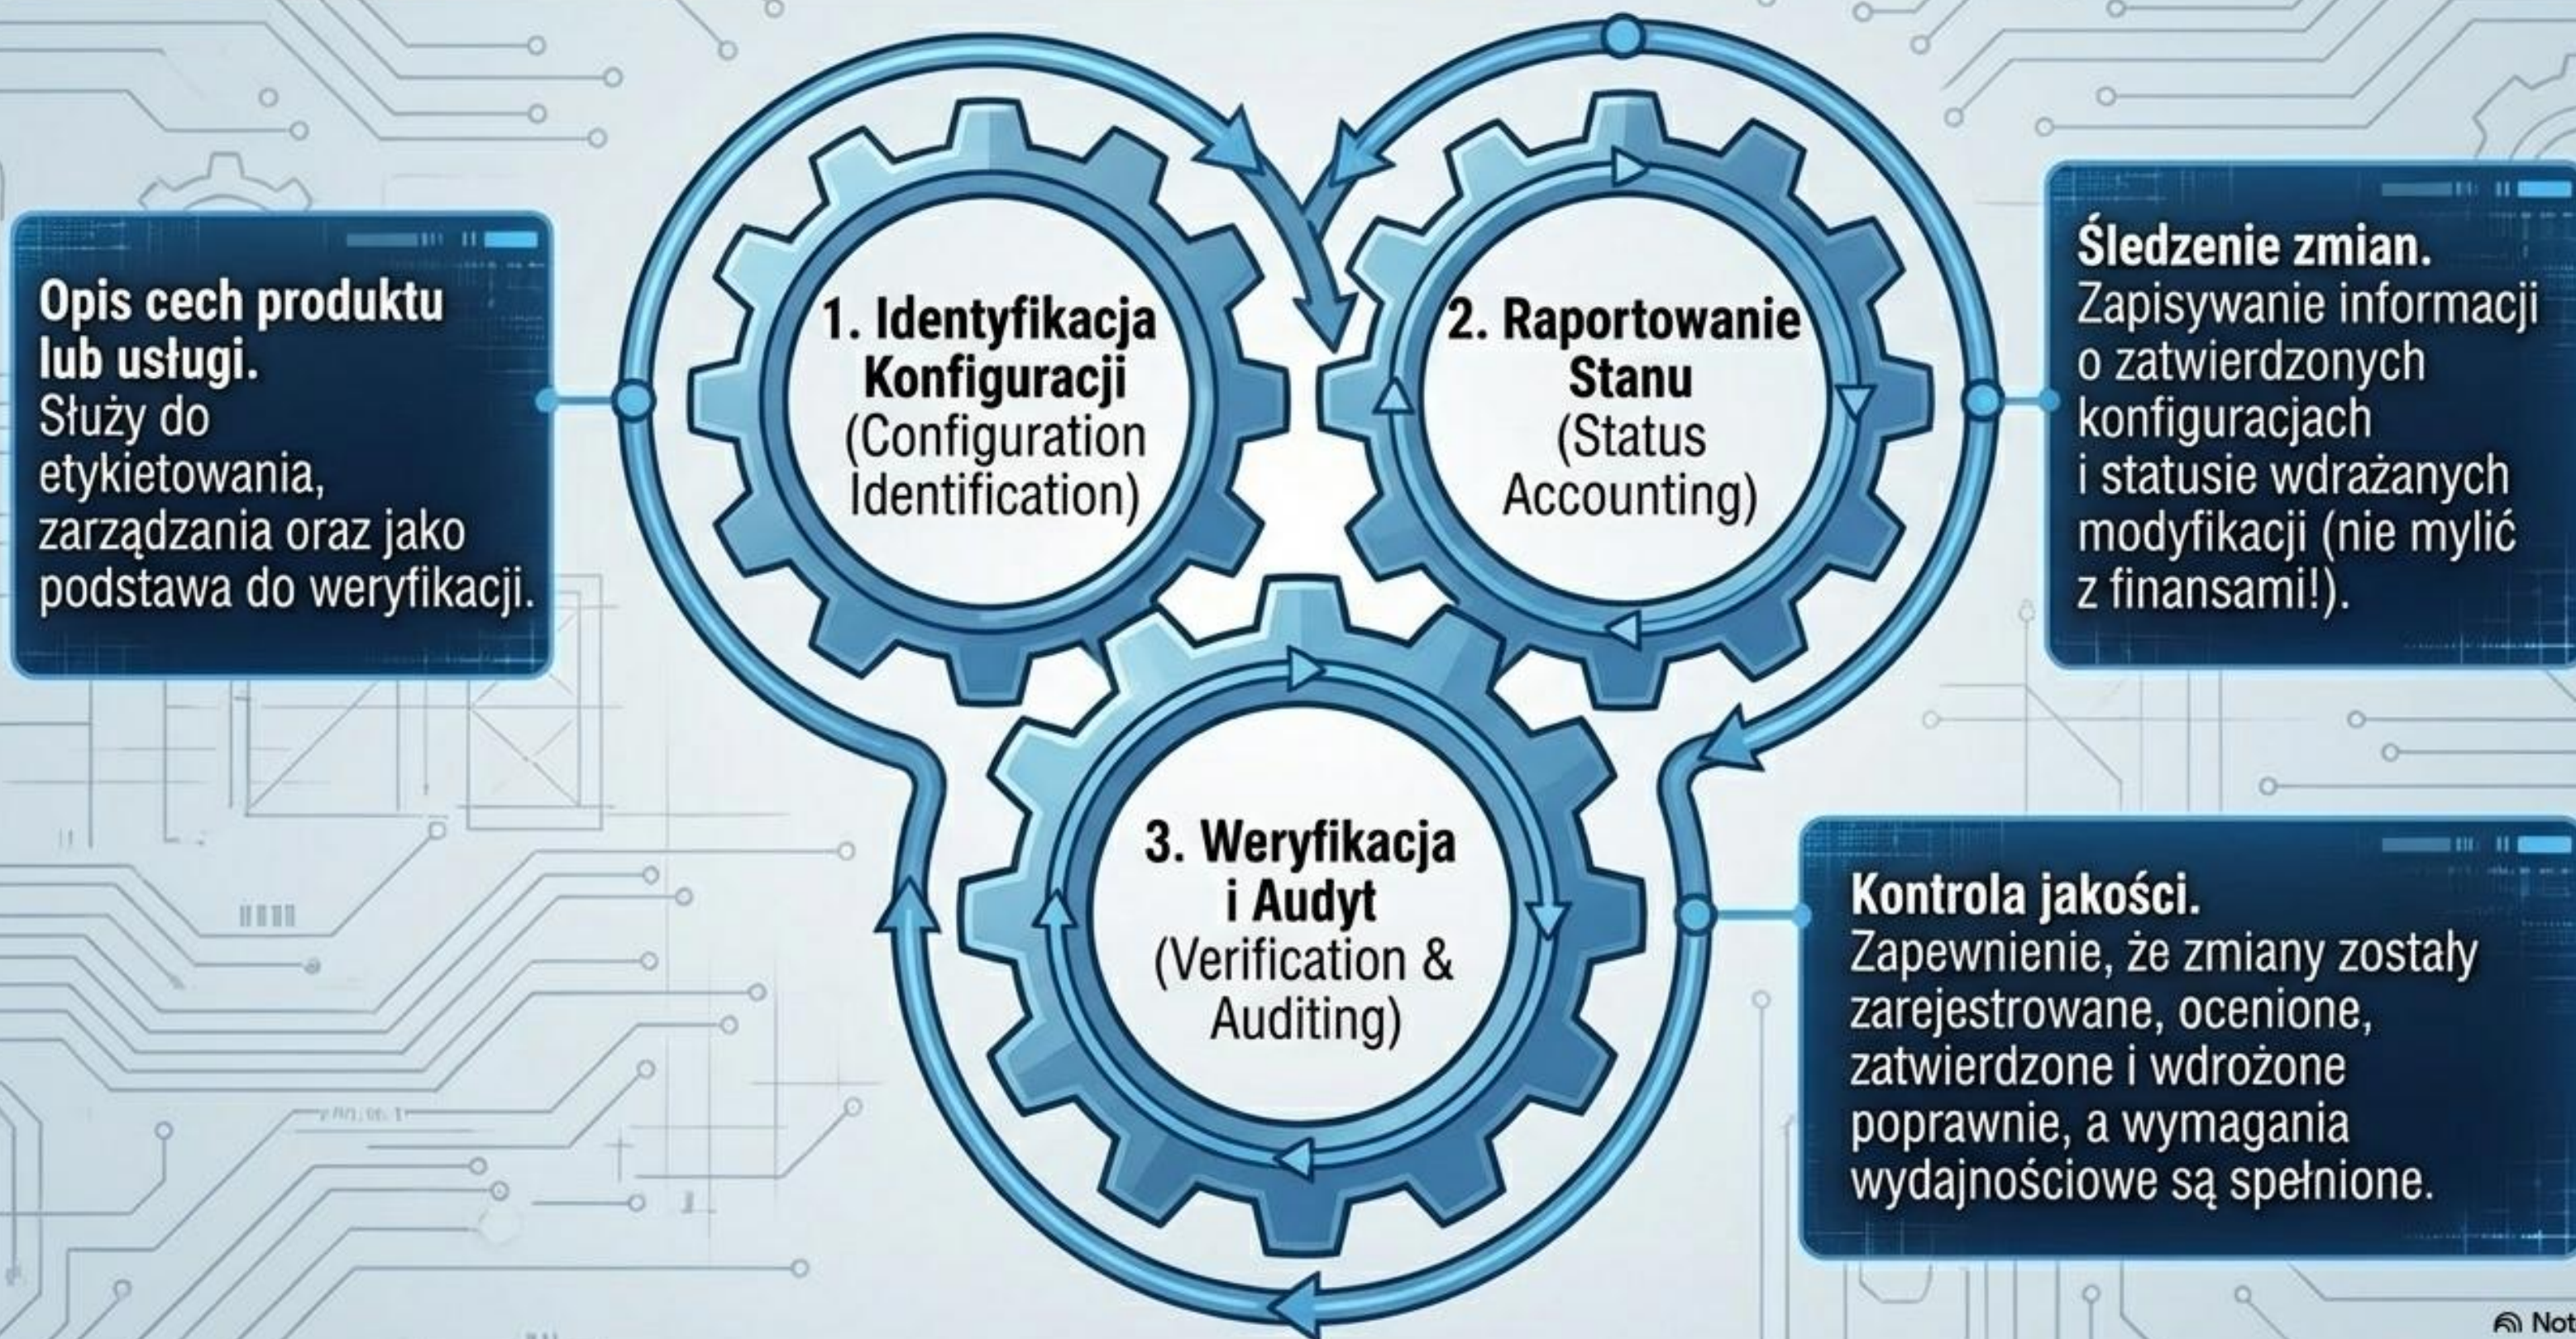

System kontroli zmian wymaga rygorystycznej dokumentacji

Udokumentowane procedury opisujące, jak produkty dostarczane i dokumentacja są kontrolowane, zmieniane i zatwierdzane. Zawiera poziomy uprawnień (kto może zatwierdzić co).



Złota Zasada PMBOK®: Wszystkie wnioski o zmianę muszą być na piśmie. Odrzucaj ustne prośby interesariuszy – brak zapisu oznacza brak możliwości precyzyjnego oszacowania czasu i kosztów.

Rada Kontroli Zmian (CCB) decyduje o ostatecznym losie wniosku

CCB to oficjalna grupa (interesariusze, menedżerowie, eksperci) uprawniona do przeglądu wniosków.

Zgłoszony Wniosek



Zatwierdź / Odrzuć: Jasne decyzje na podstawie analizy wpływu.

Odrocz:


Scenariusz Ricardo: Wniosek o instalację nowego systemu operacyjnego w sklepie. CCB odracza decyzję (Defer) do czasu potwierdzenia przez Ricardo zgodności sprzętowej i gotowości dostawcy.



Protokoły Awaryjne:

Zmiany awaryjne: PM podejmuje decyzję natychmiast (np. problem techniczny w weekend), ale wniosek musi zostać formalnie udokumentowany przez CCB po fakcie.

Ścieżka decyzyjna wniosku o zmianę

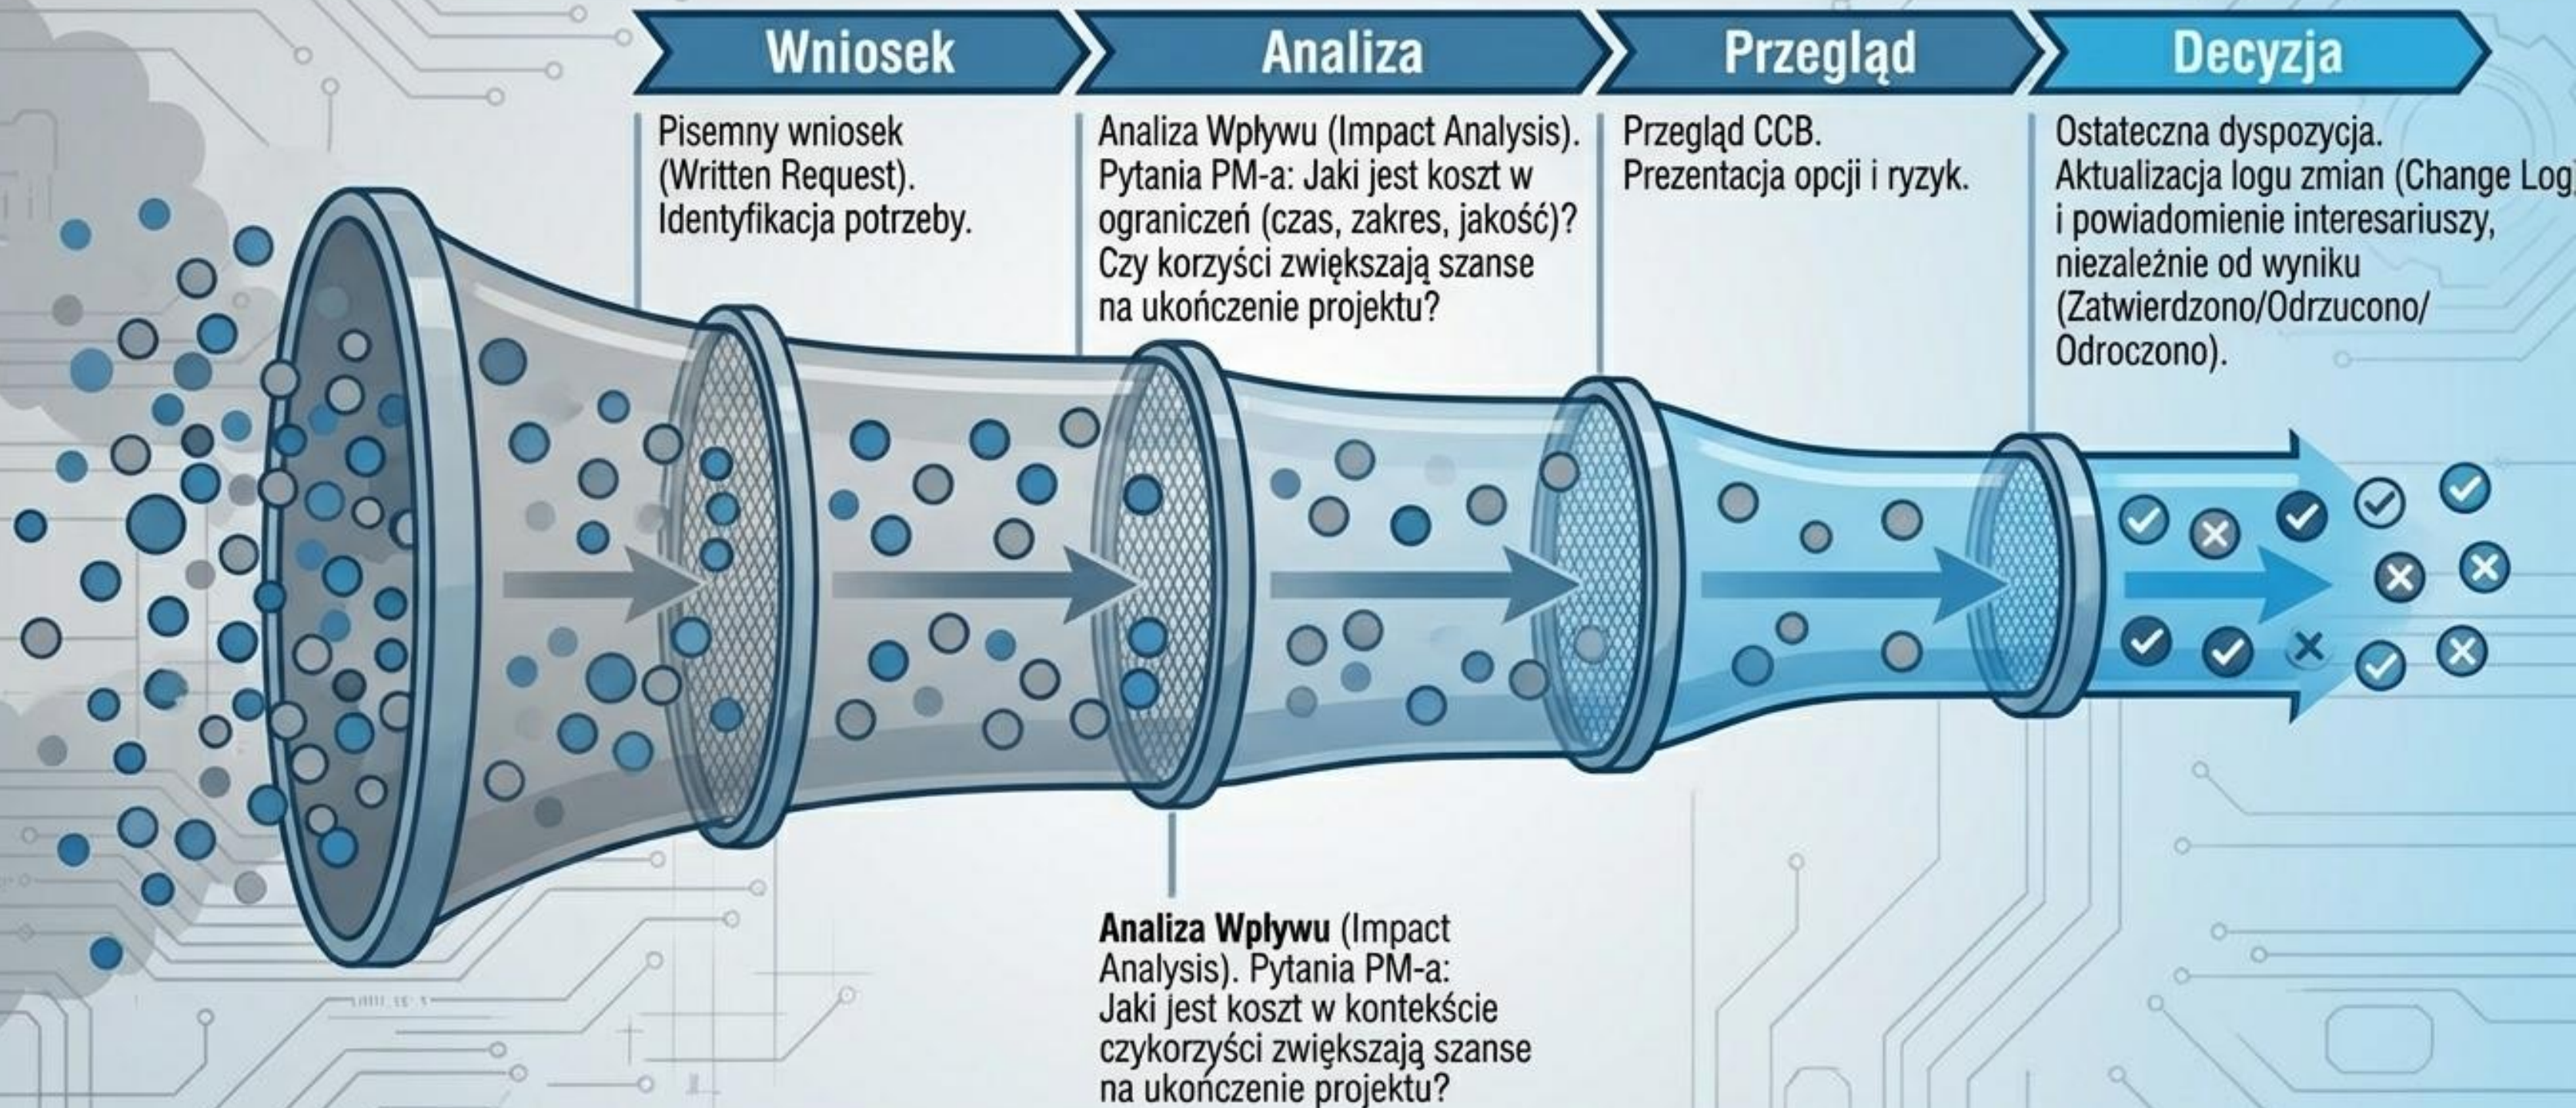


Silnik procesu: Wejścia, Narzędzia i Wyjścia (ITTO)



Ochrona linii bazowej przed zmianą historii

Linia bazowa pomiaru wydajności (Performance Measurement Baseline) to zatwierdzony plan używany do mierzenia odchyleń. Jeśli wniosek wymaga zmiany linii bazowej, nowa trajektoria obowiązuje tylko w przyszłości.

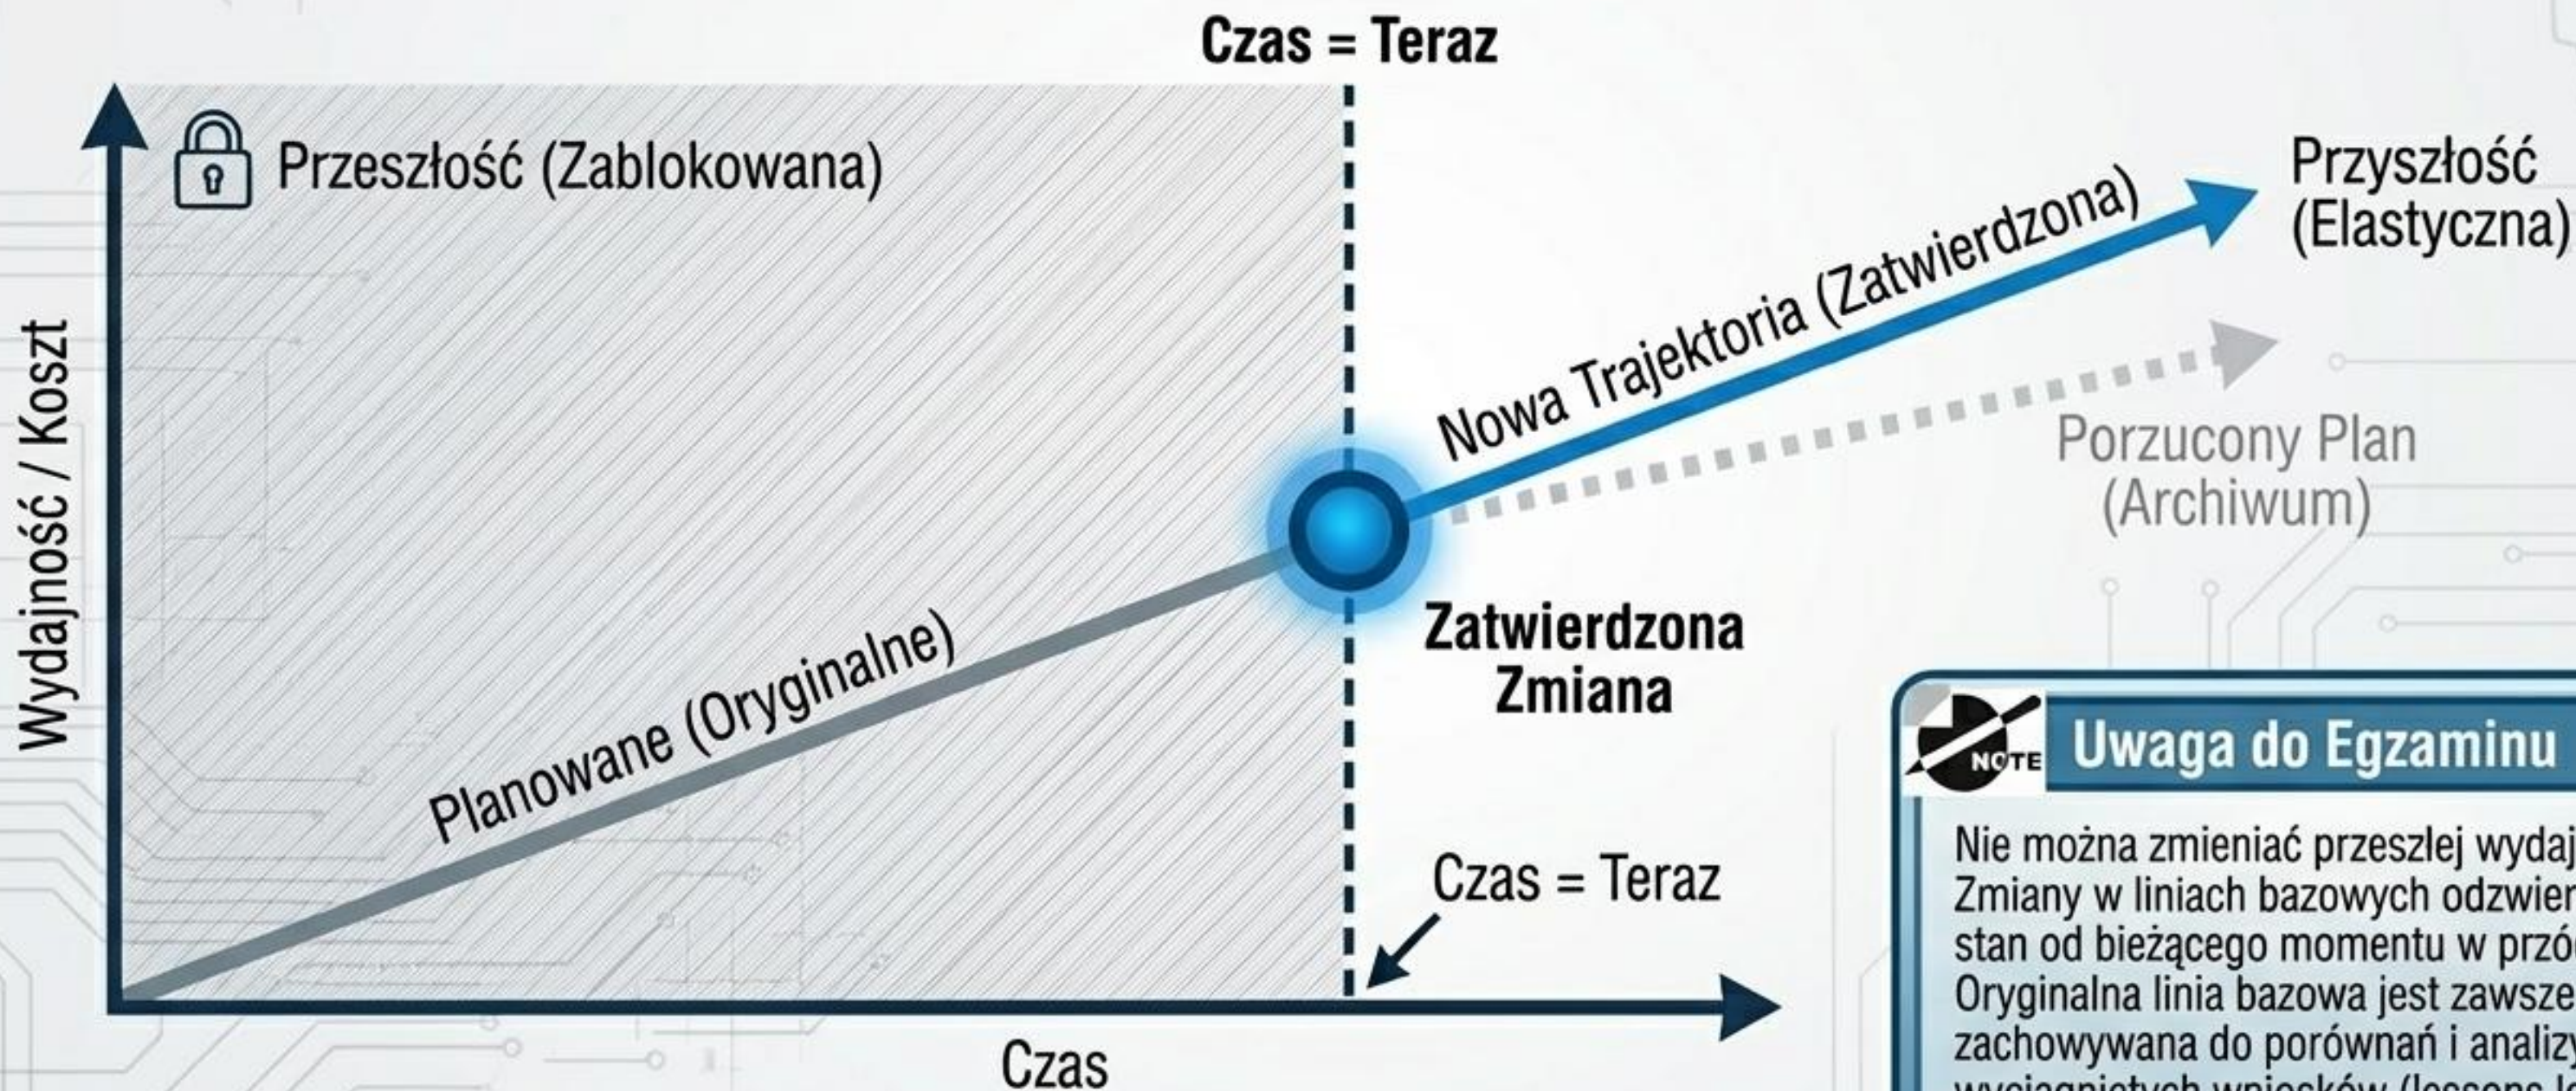


 **Uwaga do Egzaminu**

Nie można zmieniać przeszłej wydajności! Zmiany w liniach bazowych odzwierciedlają stan od bieżącego momentu w przód. Oryginalna linia bazowa jest zawsze zachowywana do porównań i analizy wyciągniętych wniosków (lessons learned).

Wdrażanie zatwierdzonych zmian w fazie realizacji

Zatwierdzenie zmiany to nie koniec procesu — to początek nowej pracy.

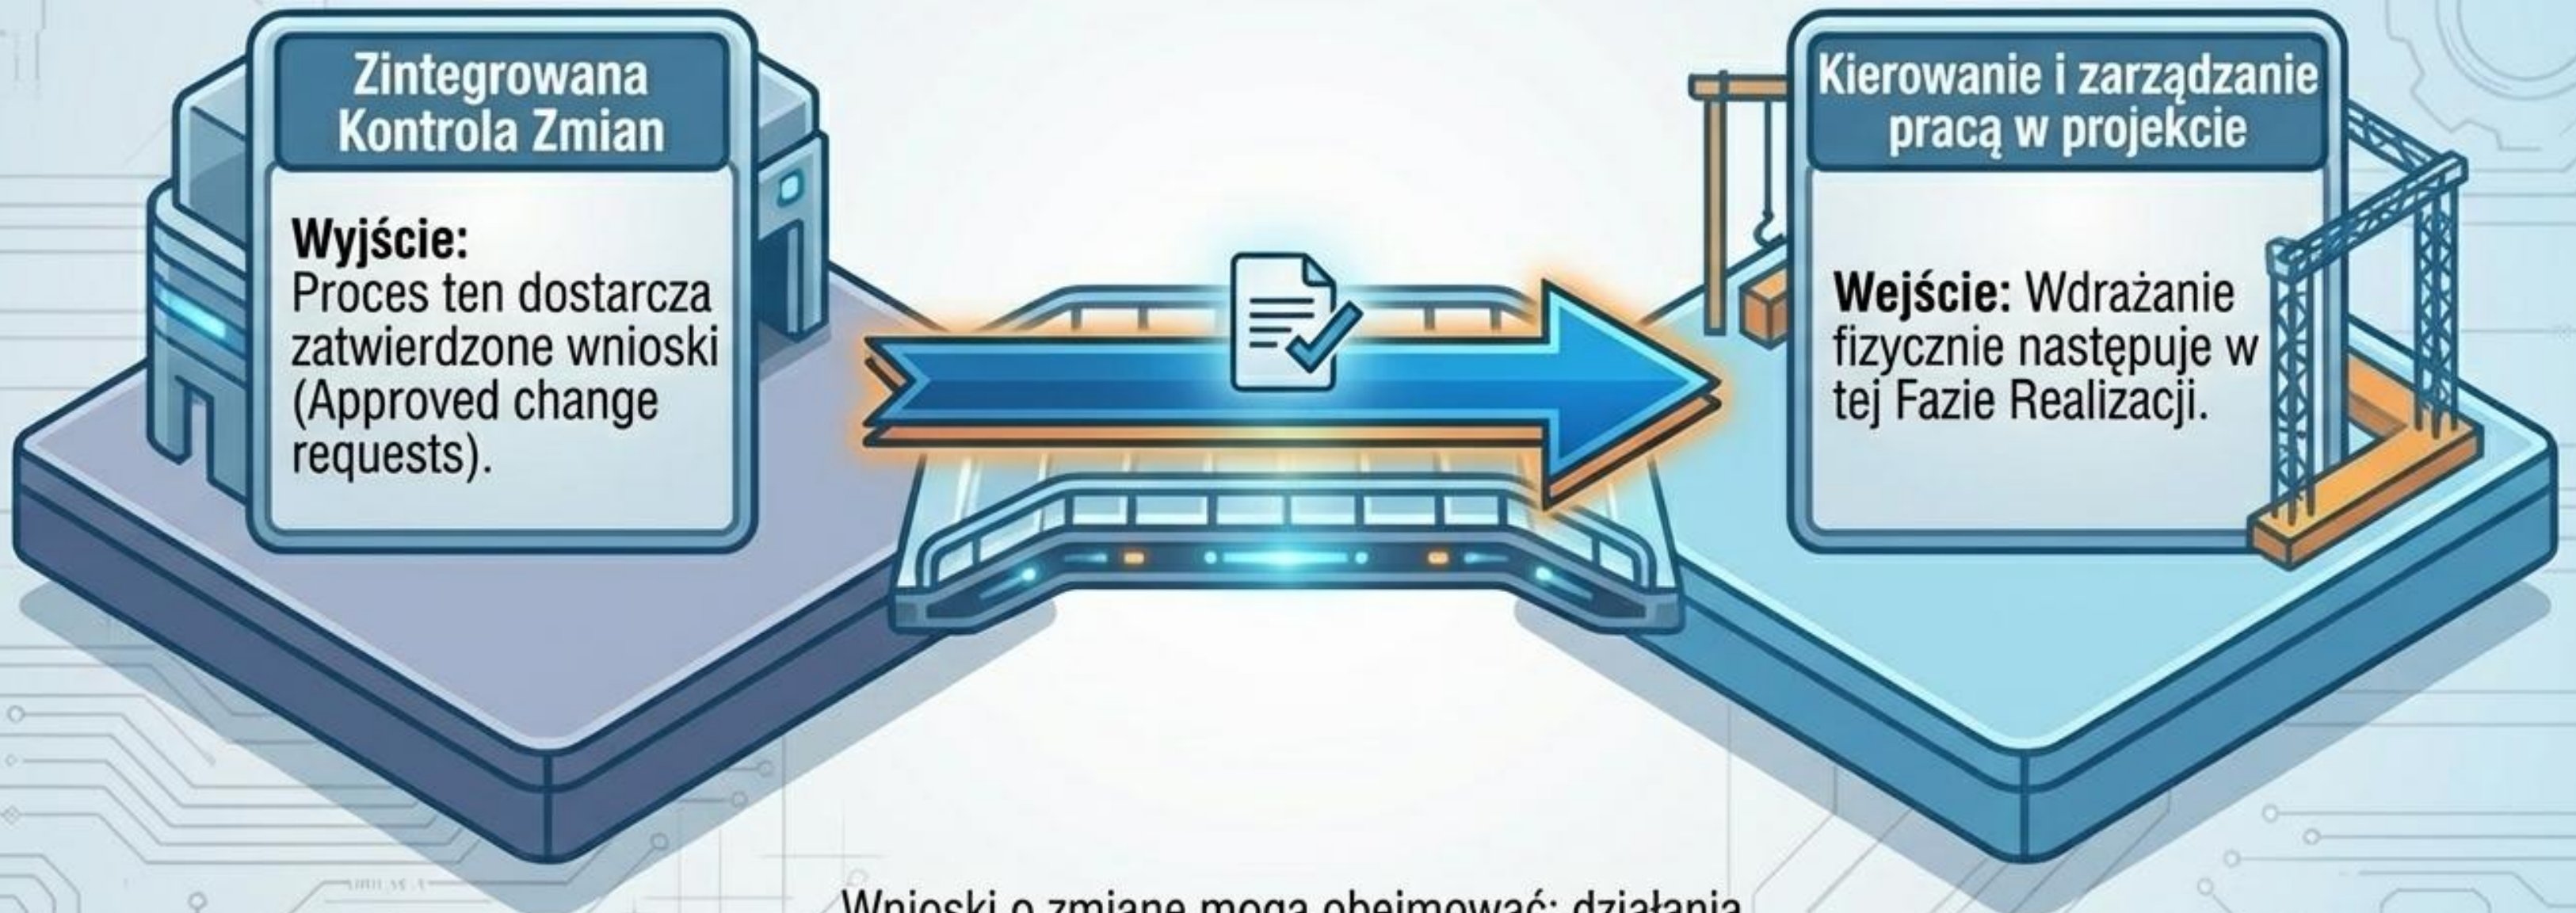

Wnioski o zmianę mogą obejmować: działania naprawcze, działania zapobiegawcze lub naprawę wad.

Kontrola zamówień i wydajności zewnętrznych dostawców

Zarządzanie relacjami z dostawcami wymaga ciągłego monitorowania wydajności i wdrażania korekt w przypadku naruszeń umowy.

Monitorowanie Wydajności Zewnętrznej

Dostawca
Zewnętrzny



Monitorowanie
Wydajności



Scenariusz Jill:

Pierwszy dostawca dostarczył uszkodzone opakowania i zepsutą żywność. Jill zidentyfikowała nowego dostawcę oferującego wyższą jakość, ale po wyższej cenie.

Integracja z Kontrolą Zmian

Rada Kontroli Zmian (CCB)



Jill musiała złożyć formalny wniosek o zmianę kosztów (Cost change request) do CCB. Ponieważ wpływ na całkowity budżet był nieznaczny, zmiana została zatwierdzona, chroniąc jakość projektu.

Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy chroni zaufanie

W długich projektach interesariusze łatwo tracą koncentrację. Ciągłe zaangażowanie pomaga utrzymać wsparcie dla projektu i sprawnie zarządzać ewolucją zmian.




Spotkania i Komunikacja

Entuzjazm PM-a i regularne spotkania (Status meetings) zapobiegają dryfowaniu zainteresowania.

Ekosystem kontroli projektu chroni cel główny

Kontrola zmian to nie tylko biurokracja — to zintegrowany system obronny zarządzania oczekiwaniami i integralnością projektu.

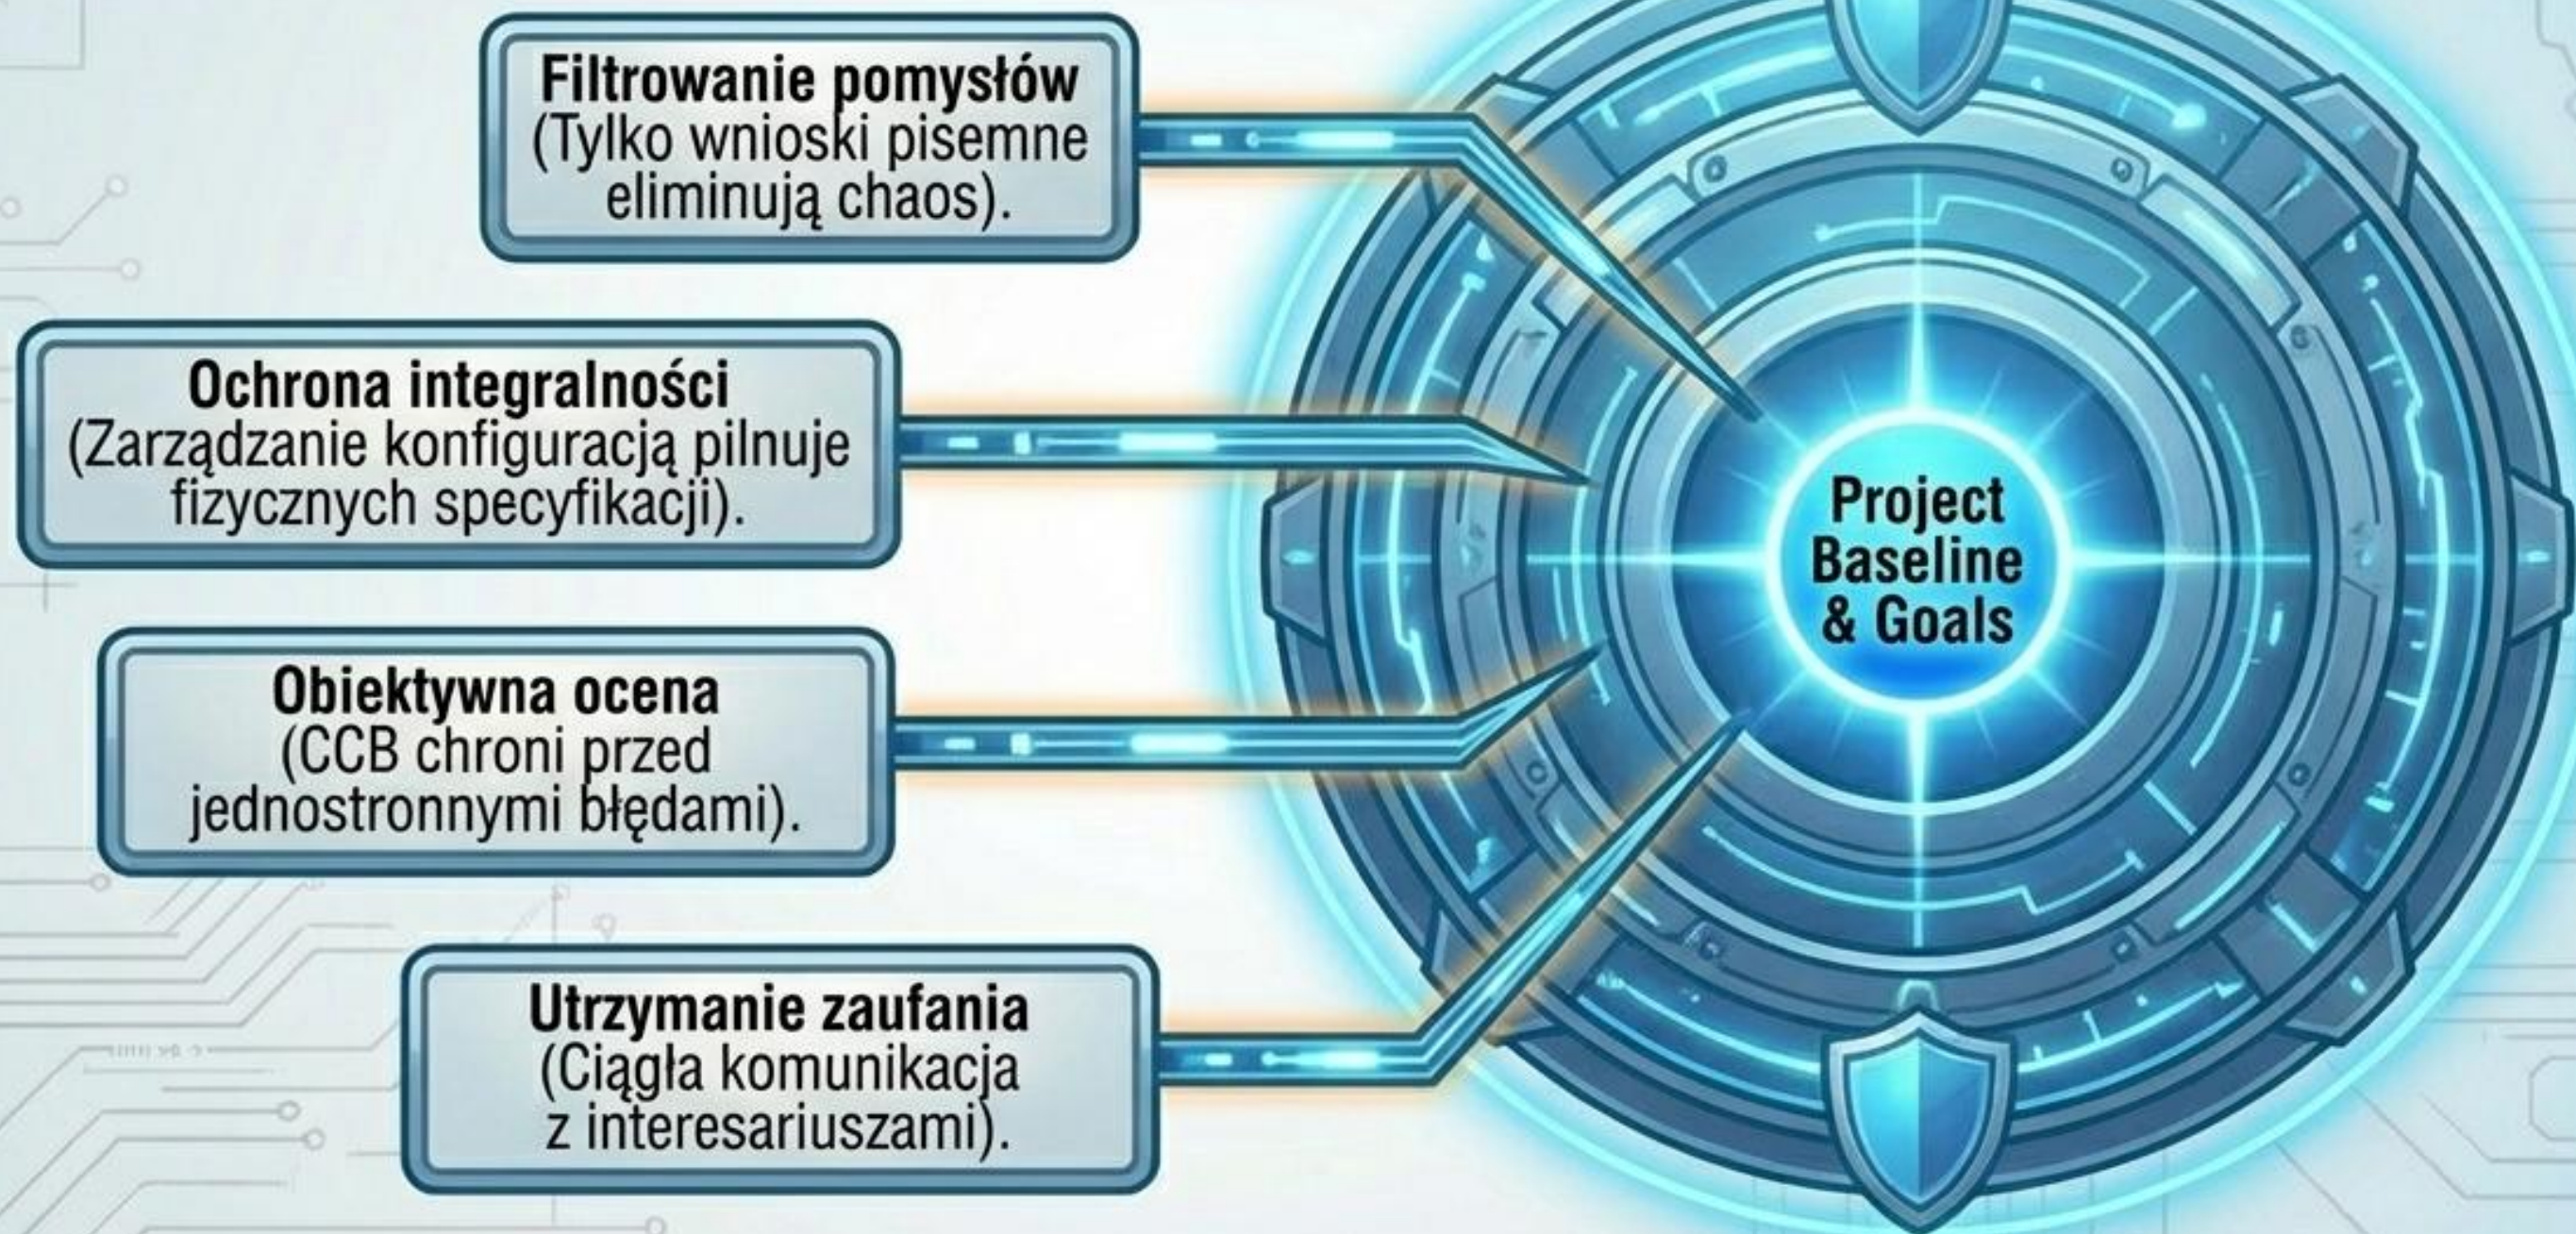

Egzamin PMP: Absolutne minimum (Cheat Sheet)



Rola CCB

Rada Kontroli Zmian to grupa interesariuszy, która analizuje wnioski oraz podejmuje decyzje o ich zatwierdzeniu, odrzuceniu lub odroczeniu.



Forma Wniosków

Wszystkie wnioski o zmianę muszą mieć formę pisemną, bez żadnych wyjątków.



Zasada Linii Bazowych

Zmiany działają tylko w przód. Nie można modyfikować przeszłej wydajności; zawsze zachowuj oryginalną linię do „lessons learned”.



Różnica Pojęciowa

Kontrola Zmian dotyczy zarządzania projektem i dokumentami. Kontrola Konfiguracji skupia się na specyfikacjach technicznych i fizycznych cechach dostarczanych produktów.
