


Certyfikat PMP: Kontrola efektów pracy

Zarządzanie wydajnością, ryzykiem
i kosztami w fazie monitorowania

dr Zbigniew Galar

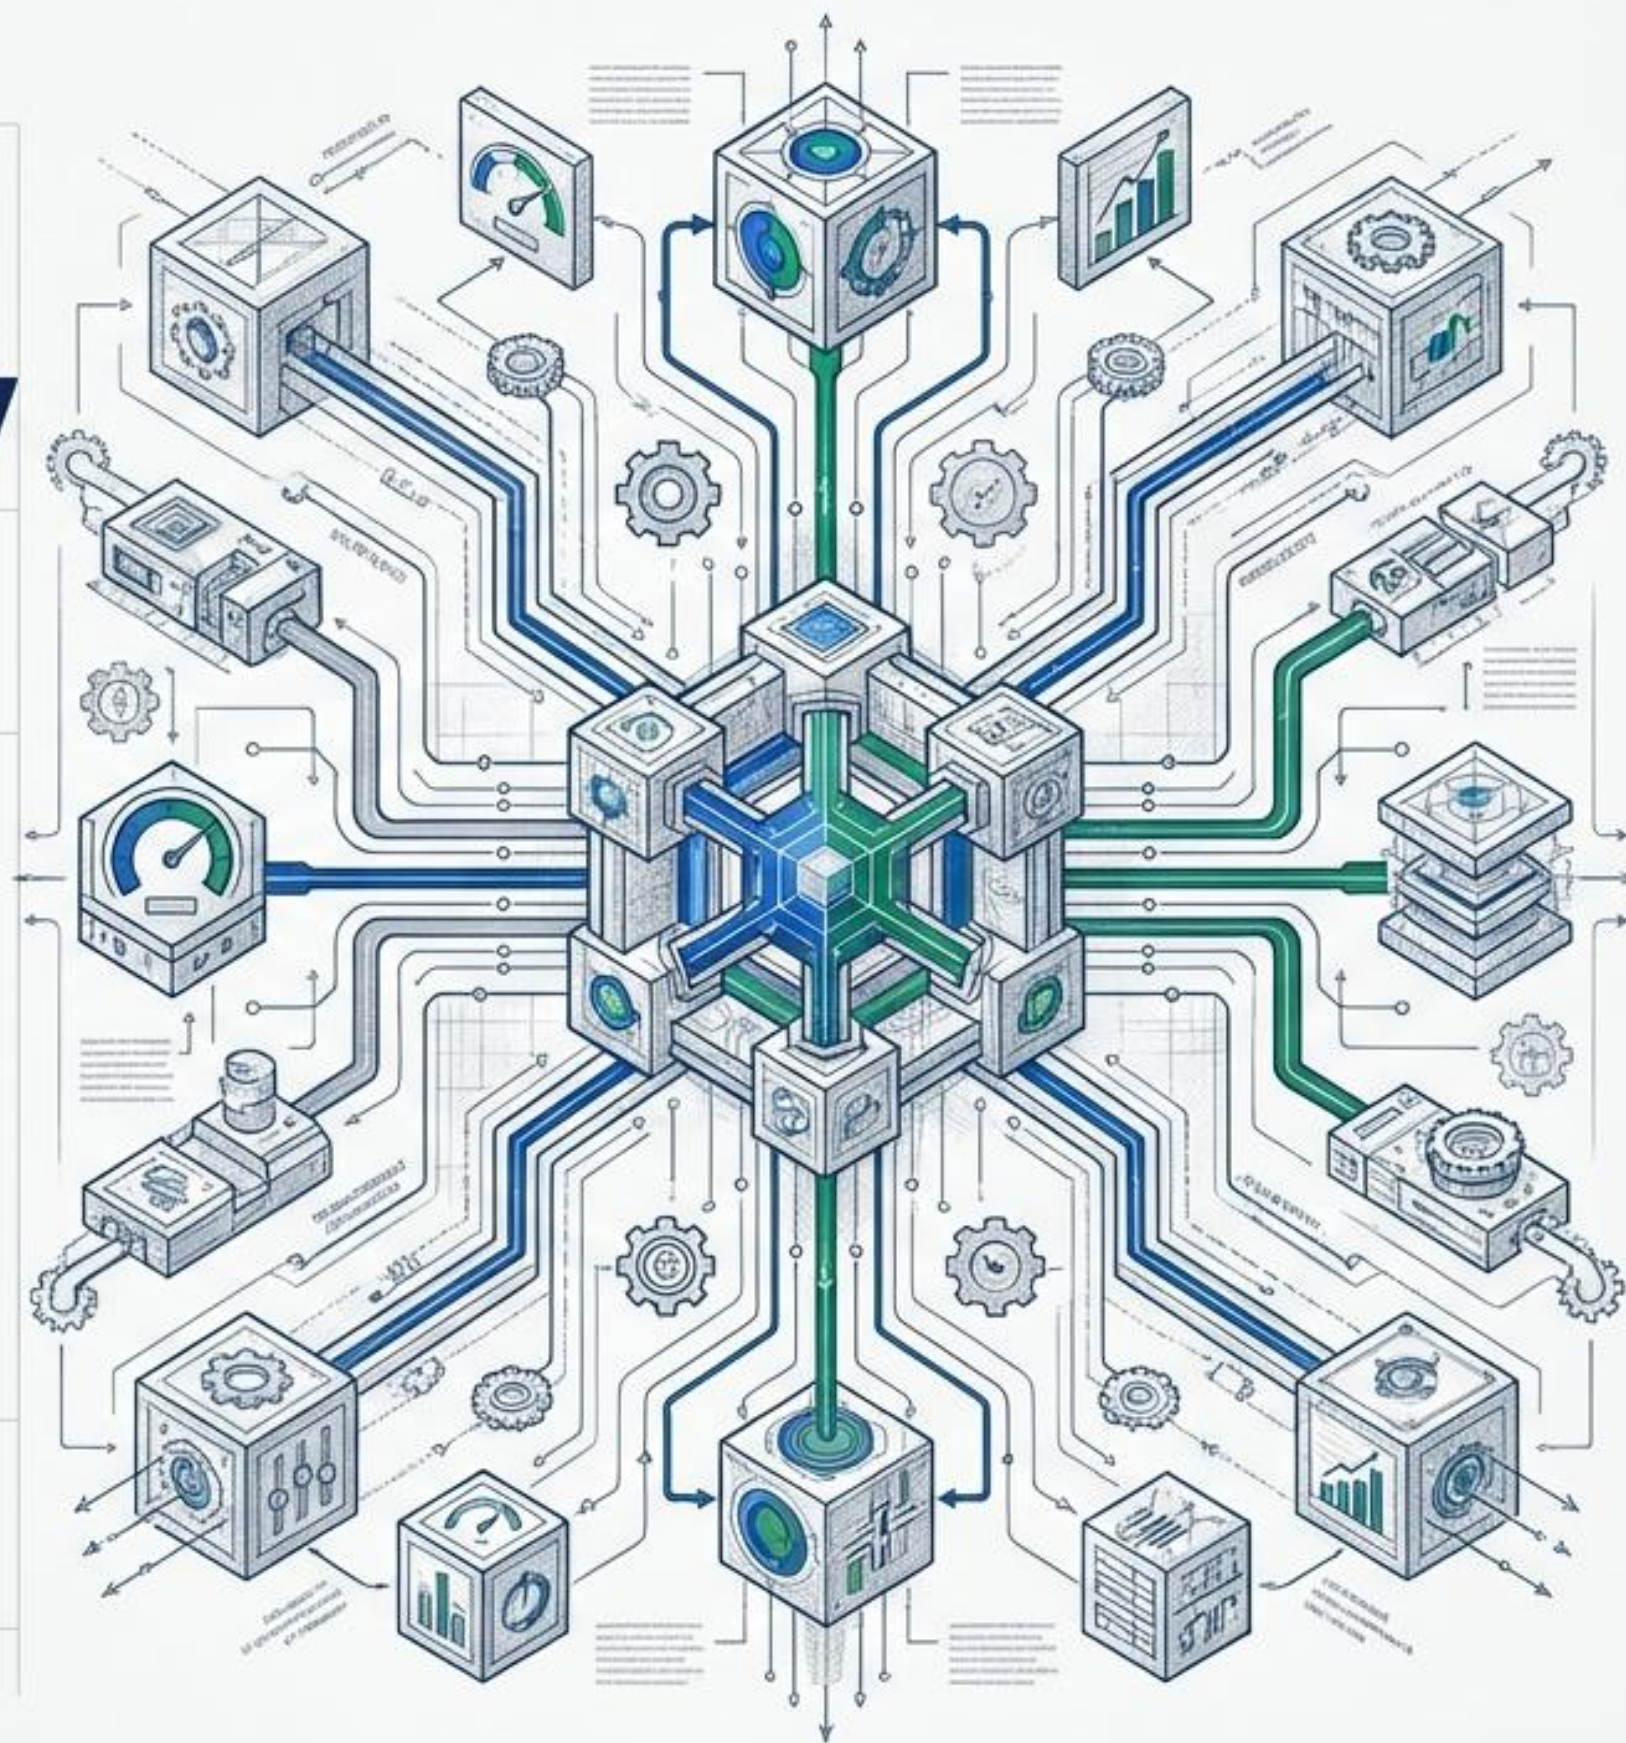

Wymiary Kontroli Projektu



Jakość

Zapewnienie zgodności produktów (deliverables) ze standardami jakości.



Wartość Wypracowana

Pomiary i prognozy odchyleń (EVM).



Ryzyko

Aktualizacja rejestru, śledzenie wyzwalaczy i planów reakcji.



Zmiany

Ocena działań korygujących i komunikacja statusu do interesariuszy.

Niezbędnik Kierownika Projektu (Wiedza i Umiejętności)

Pomiary Wydajności



Narzędzia do śledzenia:
EV (Wartość Wypracowana),
CPM (Ścieżka Krytyczna),
PERT.

Limity Kontrolne



Progi (thresholds) i tolerancje wyznaczające granice akceptowalnych odchyłeń.

Techniki Analityczne



Analiza kosztów oraz analiza odchyłeń i trendów (Variance & Trend Analysis).

Zarządzanie



Zarządzanie planem projektu, technikami wprowadzania zmian i Zintegrowaną Kontrolą Zmian.

Architektura Procesu Kontroli (ITTO)



Kontrola Ryzyka: Radar Projektu



Identyfikacja i skanowanie: Wykrywanie nowych ryzyk w trakcie cyklu życia projektu.

Monitorowanie wyzwalaczy (Triggers): Śledzenie sygnałów świadczących o zbliżającym się zdarzeniu.

Zamykanie (Close-out): Usuwanie z radaru ryzyk, które straciły na aktualności.

Ryzyka resztkowe: Śledzenie pozostałości po wdrożeniu planów reakcji.

Rezerwy (Reserves): Aktualizacja rezerw na nieprzewidziane wydatki (contingency reserves) w oparciu o aktualną sytuację.

Surowce Kontroli Ryzyka (Wejścia)

Plan zarządzania projektem:
Strategia i wytyczne dla całego projektu.

Rejestr ryzyk:
Baza danych śledząca rankingi, właścicieli ryzyk, wyzwalacze oraz zaplanowane reakcje.

Dane o wykonaniu pracy:
Surowe fakty (Work Performance Data) – np. aktualny status produktów, poniesione koszty, postęp w harmonogramie.

Rejestr ryzyk: Baza danych śledząca rankingi, właścicieli ryzyk, wyzwalacze oraz zaplanowane reakcje.

Raporty o wykonaniu pracy:
Przetworzone dane (Work Performance Reports) – raporty statusowe wspierające podejmowanie decyzji.



Matryca Narzędzi Diagnostycznych

	Co badamy?	Kto to robi?	Kiedy stosować?
Ocena ponowna ryzyka (Risk Reassessment)	Aktualność i priorytety ryzyk oraz planów reakcji.	Zespół projektowy (działanie wewnętrzne).	Regularnie, na każdym spotkaniu statusowym.
Audyty ryzyka (Risk Audits)	Skuteczność wdrożonych planów reakcji oraz samego procesu zarządzania ryzykiem.	Wyspecjalizowani audytorzy (często z zewnątrz).	Okresowo, zgodnie z planem audytów w cyklu życia projektu.
Analiza odchyleń i trendów (Variance & Trend Analysis)	Różnice między wynikami rzeczywistymi a planowanymi.	Narzędzie analityczne (EVM).	Gdy potrzebna jest prognoza wydajności i wykrycie nowych potencjalnych ryzyk.

Pomiary Techniczne w Praktyce

Plan: Kamień milowy zdefiniowany w planowaniu (np. Moduł oprogramowania musi drukować kod kreskowy).



Wykonanie - Odchylenie: Rzeczywiste osiągnięcie techniczne (Brak działającego kodu kreskowego po zakodowaniu).



Odchylenia techniczne to system wczesnego ostrzegania. Niewykonanie specyfikacji technicznej natychmiast sygnalizuje zbliżające się ryzyko dla całego projektu (np. pełzanie zakresu - scope creep).

Anatomia Reakcji: Plany Awaryjne vs. Obejścia



Działanie przewidziane w rejestrze ryzyk.



Czym jest Obejście? To nieplanowana reakcja na negatywne zdarzenie, mająca na celu opanowanie sytuacji w sposób produktywny i wydajny po fakcie.

Mechanizm Wyjść: Przekuwanie Danych w Akcję



Zgłoszenia Zmian (Change Requests):
Formalne wnioski o działania korygujące (corrective) lub zapobiegawcze (preventive).
Ważne: Wszystkie podlegają Zintegrowanej Kontroli Zmian.

Aktualizacje Dokumentów Projektu:
Główne uderzenie idzie w Rejestr Ryzyk. Należy zaktualizować: nowe oceny prawdopodobieństwa/wpływu, przypisanie nowych właścicieli, status zamkniętych ryzyk oraz wyniki wdrożonych reakcji.

Kontrola Kosztów: Strażnik Budżetu



Złote Zasady Strażnika



Ochrona Linii Bazowej: Zapobieganie włączaniu nieautoryzowanych lub błędnych kosztów do linii bazowej (Cost Baseline).



Zarządzanie Zmianą: Monitorowanie wszystkich wniosków o zmianę wpływających na koszty.



Twarde Limity: Upewnienie się, że budżet nie przekracza całkowitych autoryzowanych środków dla projektu lub fazy.



Komunikacja: Bieżące informowanie interesariuszy o zatwierdzonych zmianach i ich wpływie finansowym.

Fundamenty Kontroli Kosztów (Wejścia)



Synteza: Zintegrowana Bramka Kontroli Zmian



Podsumowanie Złotych Zasad PMP (Faza Kontroli)

