


Certyfikat PMP: Kontrola zakresu projektu

Zrozumienie, weryfikacja i obrona Linii Bazowej Zakresu




dr Zbigniew Galar

Kontekst: Faza Monitorowania i Kontroli

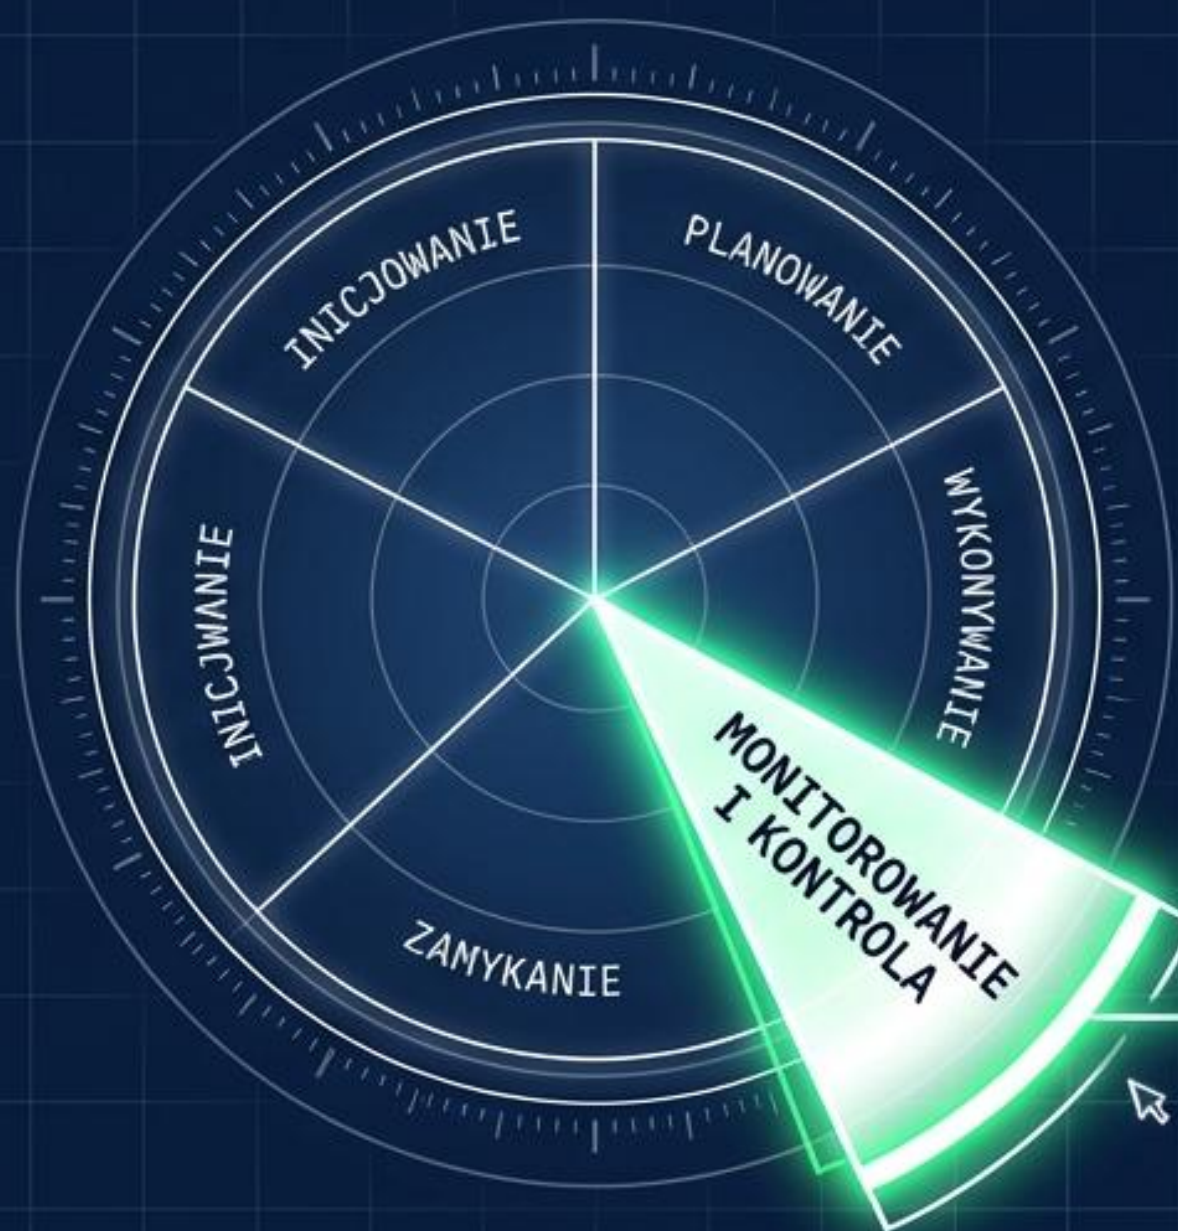

Pułapka Egzaminacyjna PMP: Triada Weryfikacji

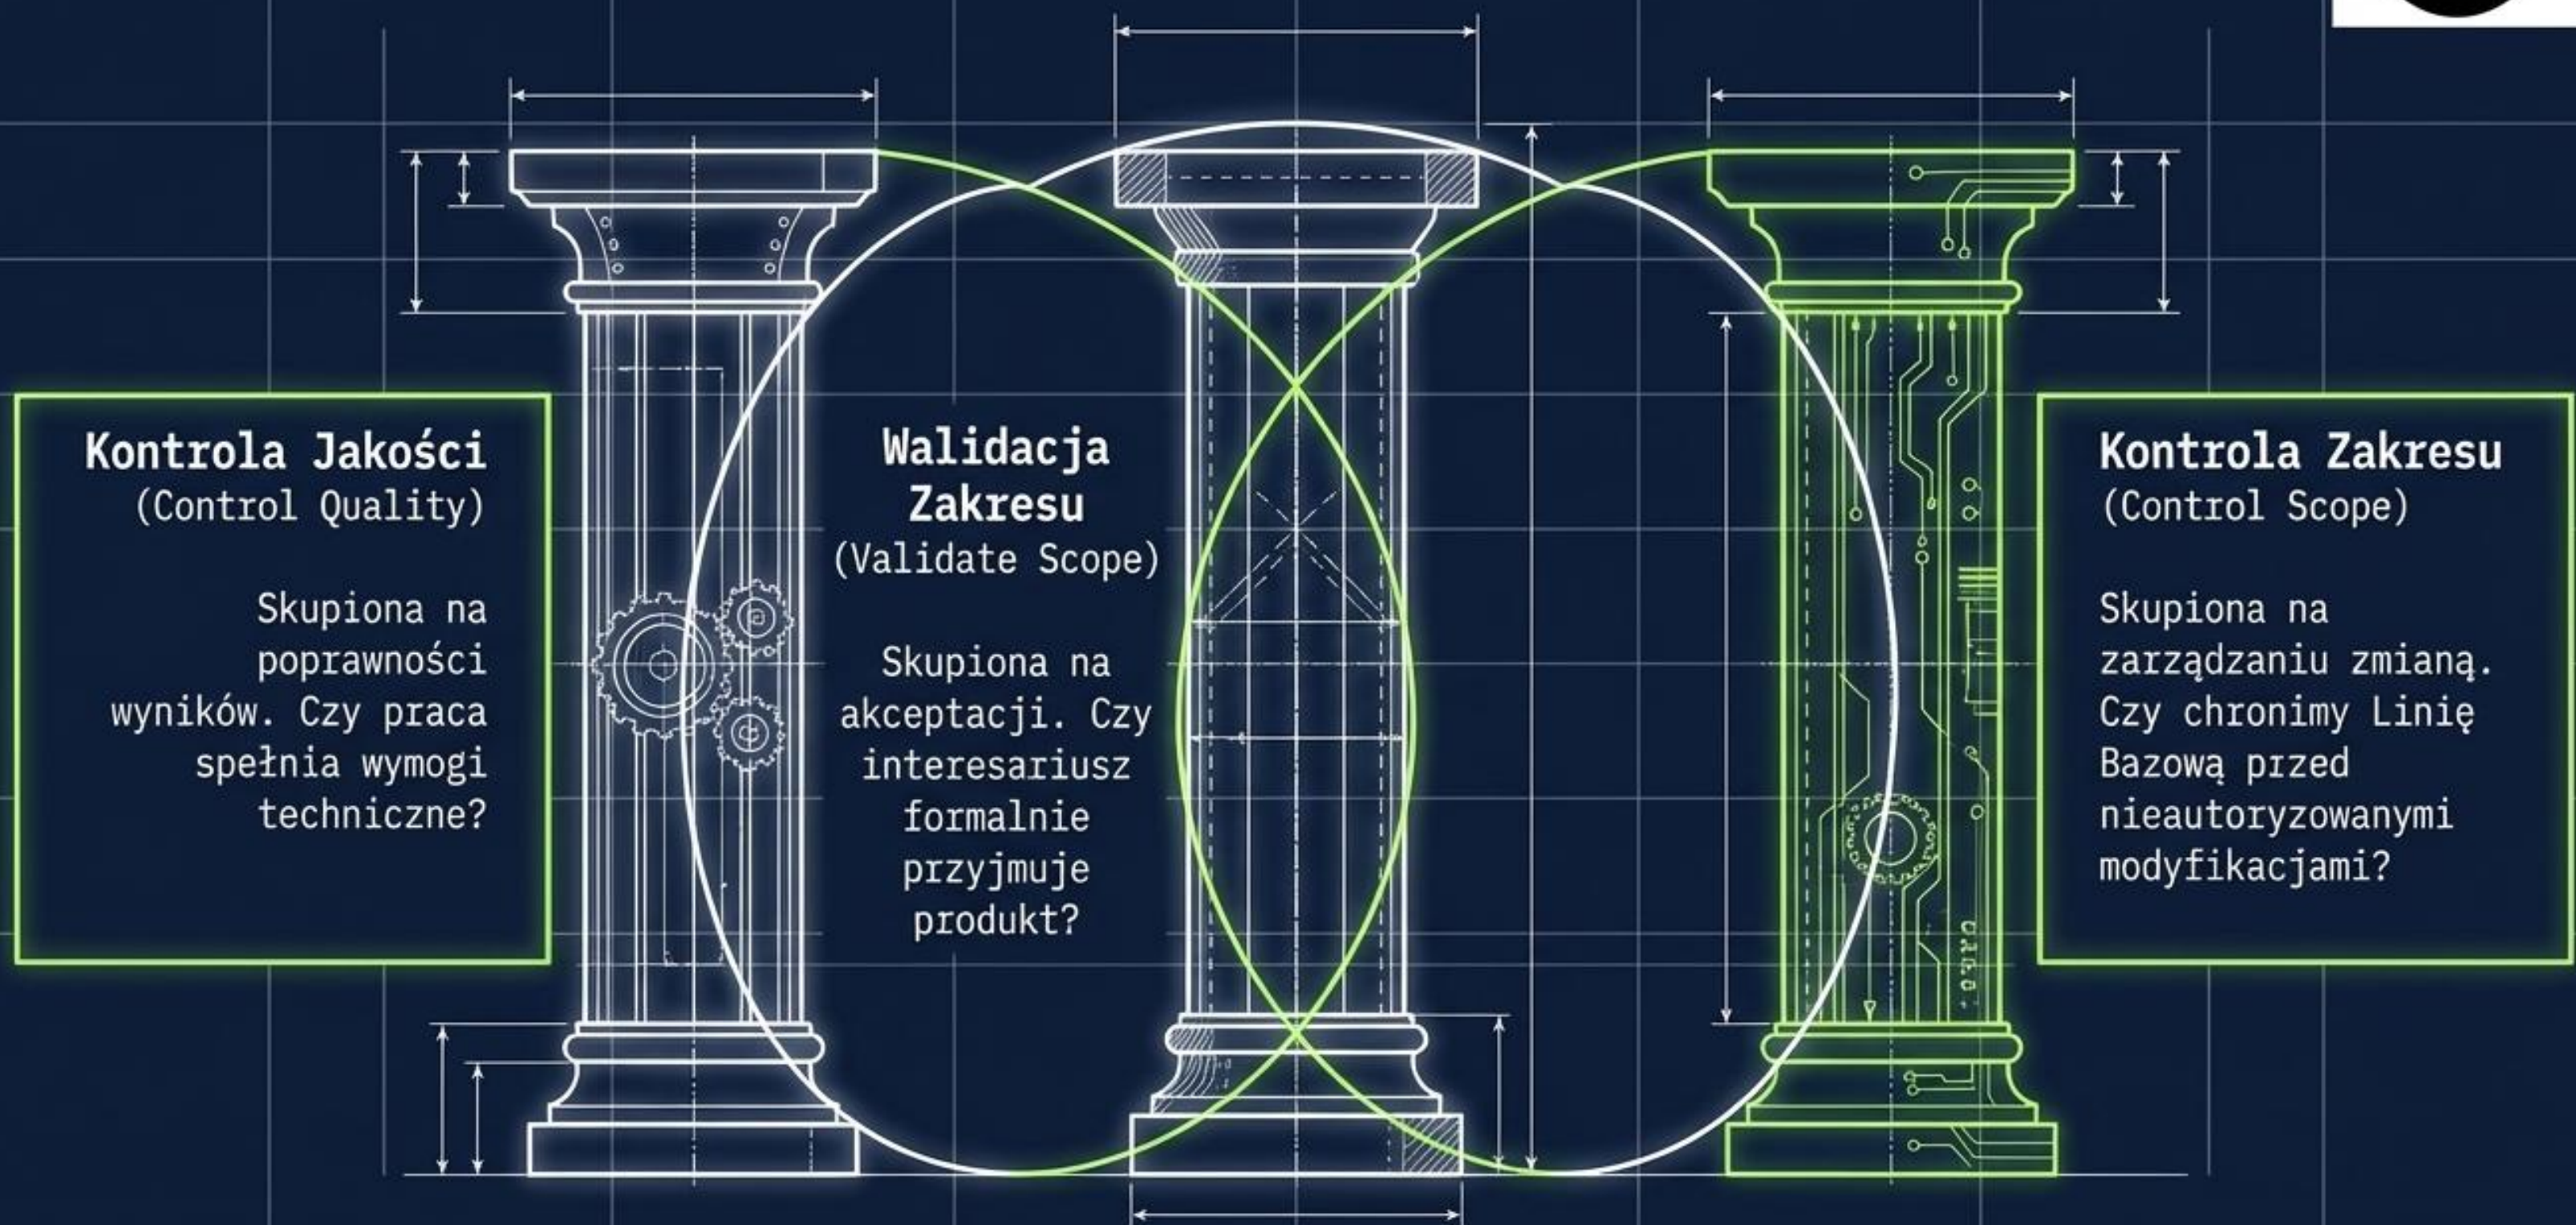

Matryca Diagnostyczna: Quality vs. Scope Validation

	Control Quality (Kontrola Jakości)	Validate Scope (Walidacja Zakresu)
Główny cel	Poprawność i dokładność wyników (Accuracy).	Formalna akceptacja (Acceptance). ✓
Co sprawdzamy?	Wymagania jakościowe i standardy.	Oczekiwania i potrzeby interesariuszy.
Kto sprawdza?	Zespół projektowy / Dział Jakości.	Klient / Sponsor / Interesariusze.
Kluczowy wynik	Zweryfikowane produkty (Verified Deliverables).	Zaakceptowane produkty (Accepted Deliverables).



Exam Spotlight!

Proces: Walidacja Zakresu (Validate Scope)

Definicja:

Formalna akceptacja ukończonych produktów (deliverables) oraz uzyskanie podpisu (sign-off) potwierdzającego spełnienie oczekiwań.

Narzędzia:


Inspekcje (Inspection) oraz techniki grupowego podejmowania decyzji.



Zasada Egzaminacyjna

Nawet jeśli projekt zostanie anulowany, proces Validate Scope **musi** zostać przeprowadzony. Zapewnia on informacje historyczne dokumentujące stopień zaawansowania przerwanych prac.

Silnik Walidacji Zakresu: Przepływ ITTO

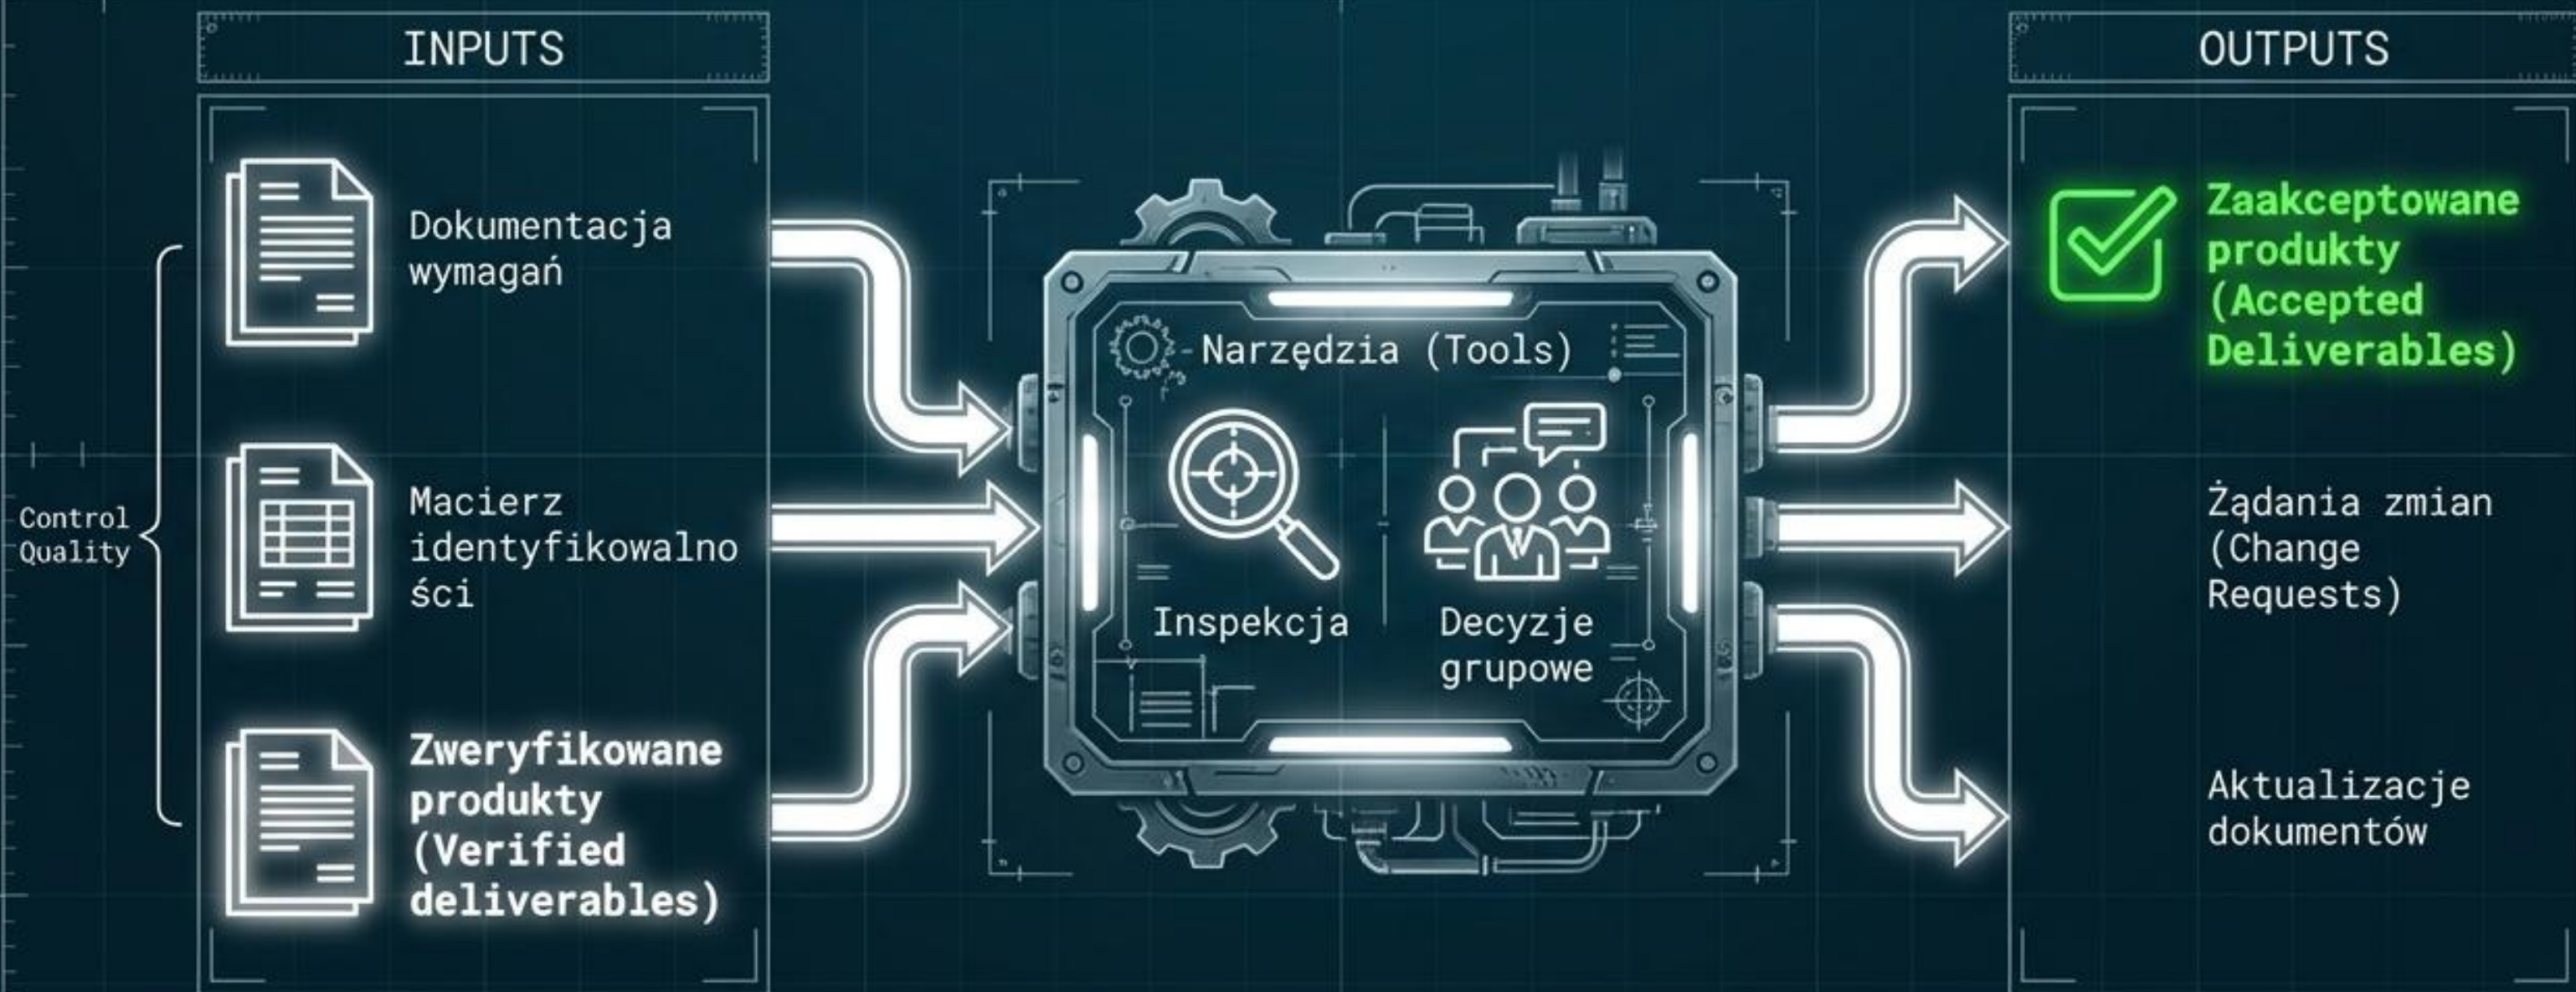

Proces: Kontrola Zakresu (Control Scope)



Złota Zasada:

Zmiana zakresu produktu (cechy, funkcjonalność) zawsze wymusza zmianę zakresu projektu (praca do wykonania).

Cel procesu:

Monitorowanie statusu projektu/ produktu i aktywne zarządzanie zmianami w Linii Bazowej Zakresu.

Zarządzanie modyfikacjami:

Każda zmiana w zatwierdzonym WBS stanowi zmianę zakresu i wymaga przejścia przez Zintegrowaną Kontrolę Zmian.

Anatomia Celu: Linia Bazowa Zakresu


Formula

NOTE



Wszelkie zmiany w powyższych dokumentach mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez formalny proces kontroli zmian.

Przepływ Kontroli Zakresu

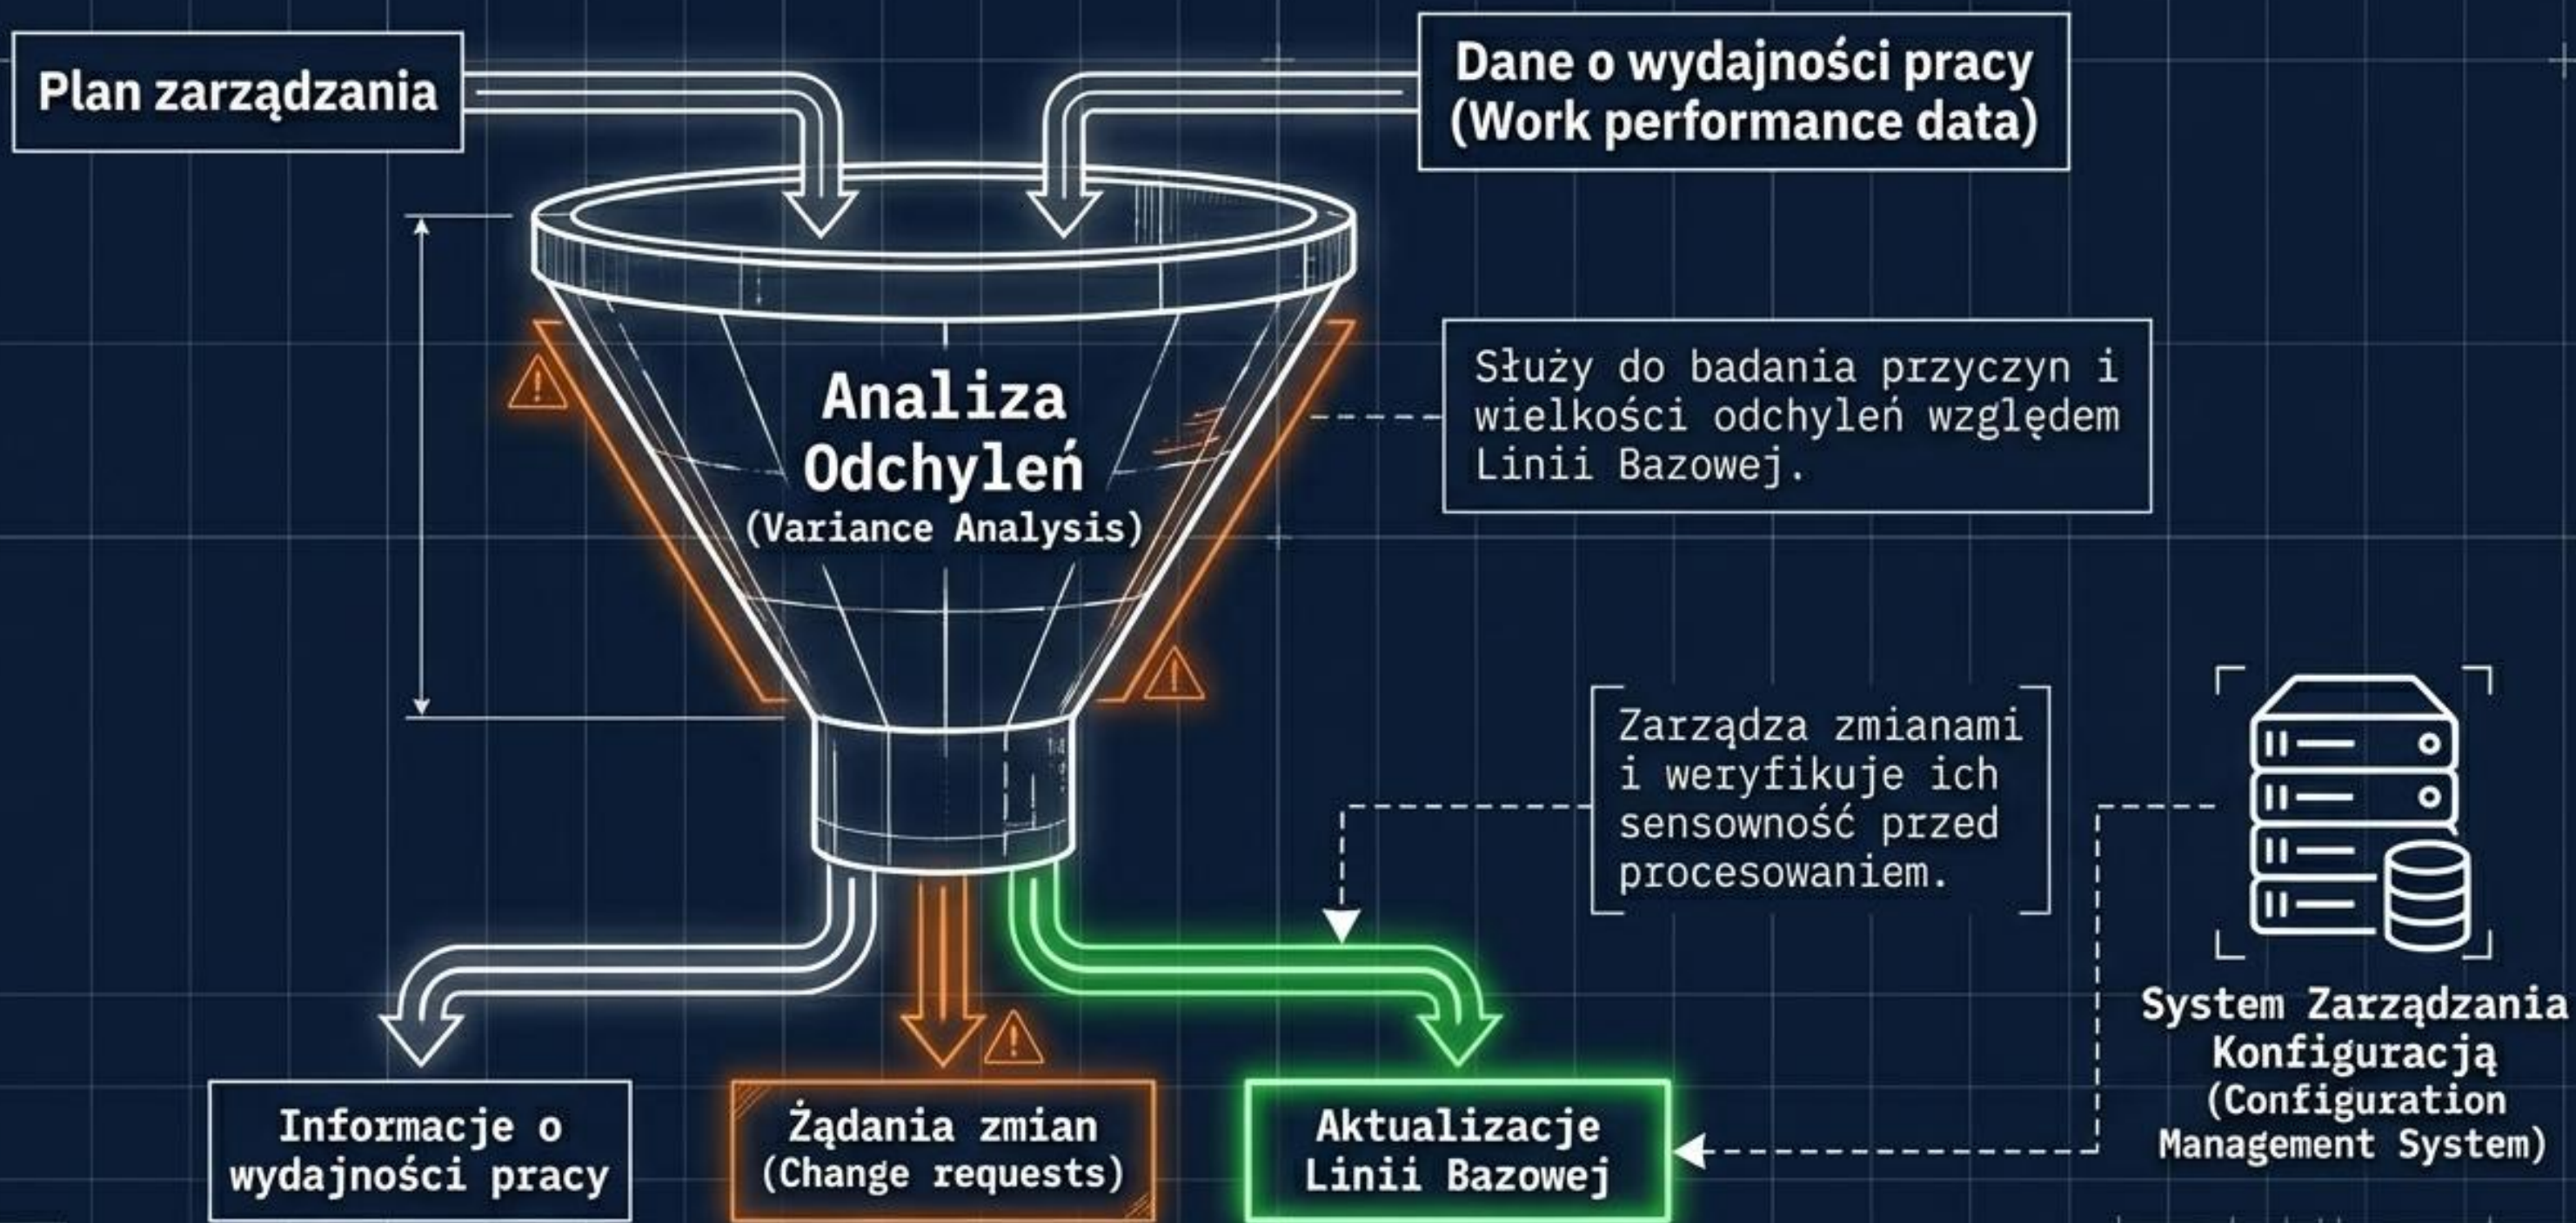

Scope Creep: Cichy Zabójca Projektów



To tylko jedna mała zmiana,
która na nikogo nie wpłynie...
nikt nie zauważy.

Definicja:

Scope Creep to niezatwierdzone, nieudokumentowane zmiany wkradające się do projektu.

Konsekwencje



Przekroczenie budżetu (Koszty)



Opóźnienia w harmonogramie (Czas)



Utrata jakości i zmęczenie zespołu
(Jakość/Morale)

Lekarstwo: Bezwzględna egzekucja procesu kontroli zmian przez Kierownika Projektu.

Zintegrowana Kontrola Zmian (Zapora Sieciowa Projektu)

Wszystkie prośby o zmianę, działania zapobiegawcze i korygujące **muszą** przejść przez proces **Perform Integrated Change Control**.

Żądania Zmian
(Change Requests)

Bariera CCB (Change Control Board):
Złożone zmiany wymagają ewaluacji (czas na estymacje) i decyzji CCB przed wdrożeniem.

Zatwierdzone Zmiany
(Approved Changes)

Brama CCB /
Zintegrowana
Kontrola Zmian

Komunikacja: Po przejściu przez zaporę, interesariusze muszą zostać poinformowani o wpływie zmiany na czas, koszt i jakość.

Studium Przypadku: New Kitchen Heaven (Panel Wskaźników) Real World Scenario

BAC: 2.00 | PV: 1.86 | EV: 1.75 | AC: 1.70



Wskaźnik Kosztów: Dobry zwrot. \$1.03 wartości za każdego wydanego dolara. Prognoza (EAC) to 1.94 (Poniżej budżetu!).



Wskaźnik Czasu: Ostrzeżenie. Praca postępuje w tempie 94% zakładanego planu. Projekt jest opóźniony planu. Projekt jest opóźniony (zakończenie 24 stycznia zamiast 15 stycznia).

Studium Przypadku: Reakcja na Odchylenia

Problem:
Opóźnienie
Harmonogramu
(SPI < 1.0)

Opcja 1:
Zazębianie
harmonogramu
prac




Skutek: **Odrzucone**.
Ryzyko uszkodzenia towaru
i kolizji prac (ekipa
budowlana vs. pracownicy
układający towar).

Opcja 2:
Zwiększenie
zasobów
ludzkich
wykonawcy



Skutek: **Zaakceptowane**.
Wymuszenie dodania
pracowników przez
podwykonawcę zgodnie z
kontraktem, aby
zniwelować opóźnienia
przed otwarciem.

Kontrola Ryzyka a Rezerwy Budżetowe

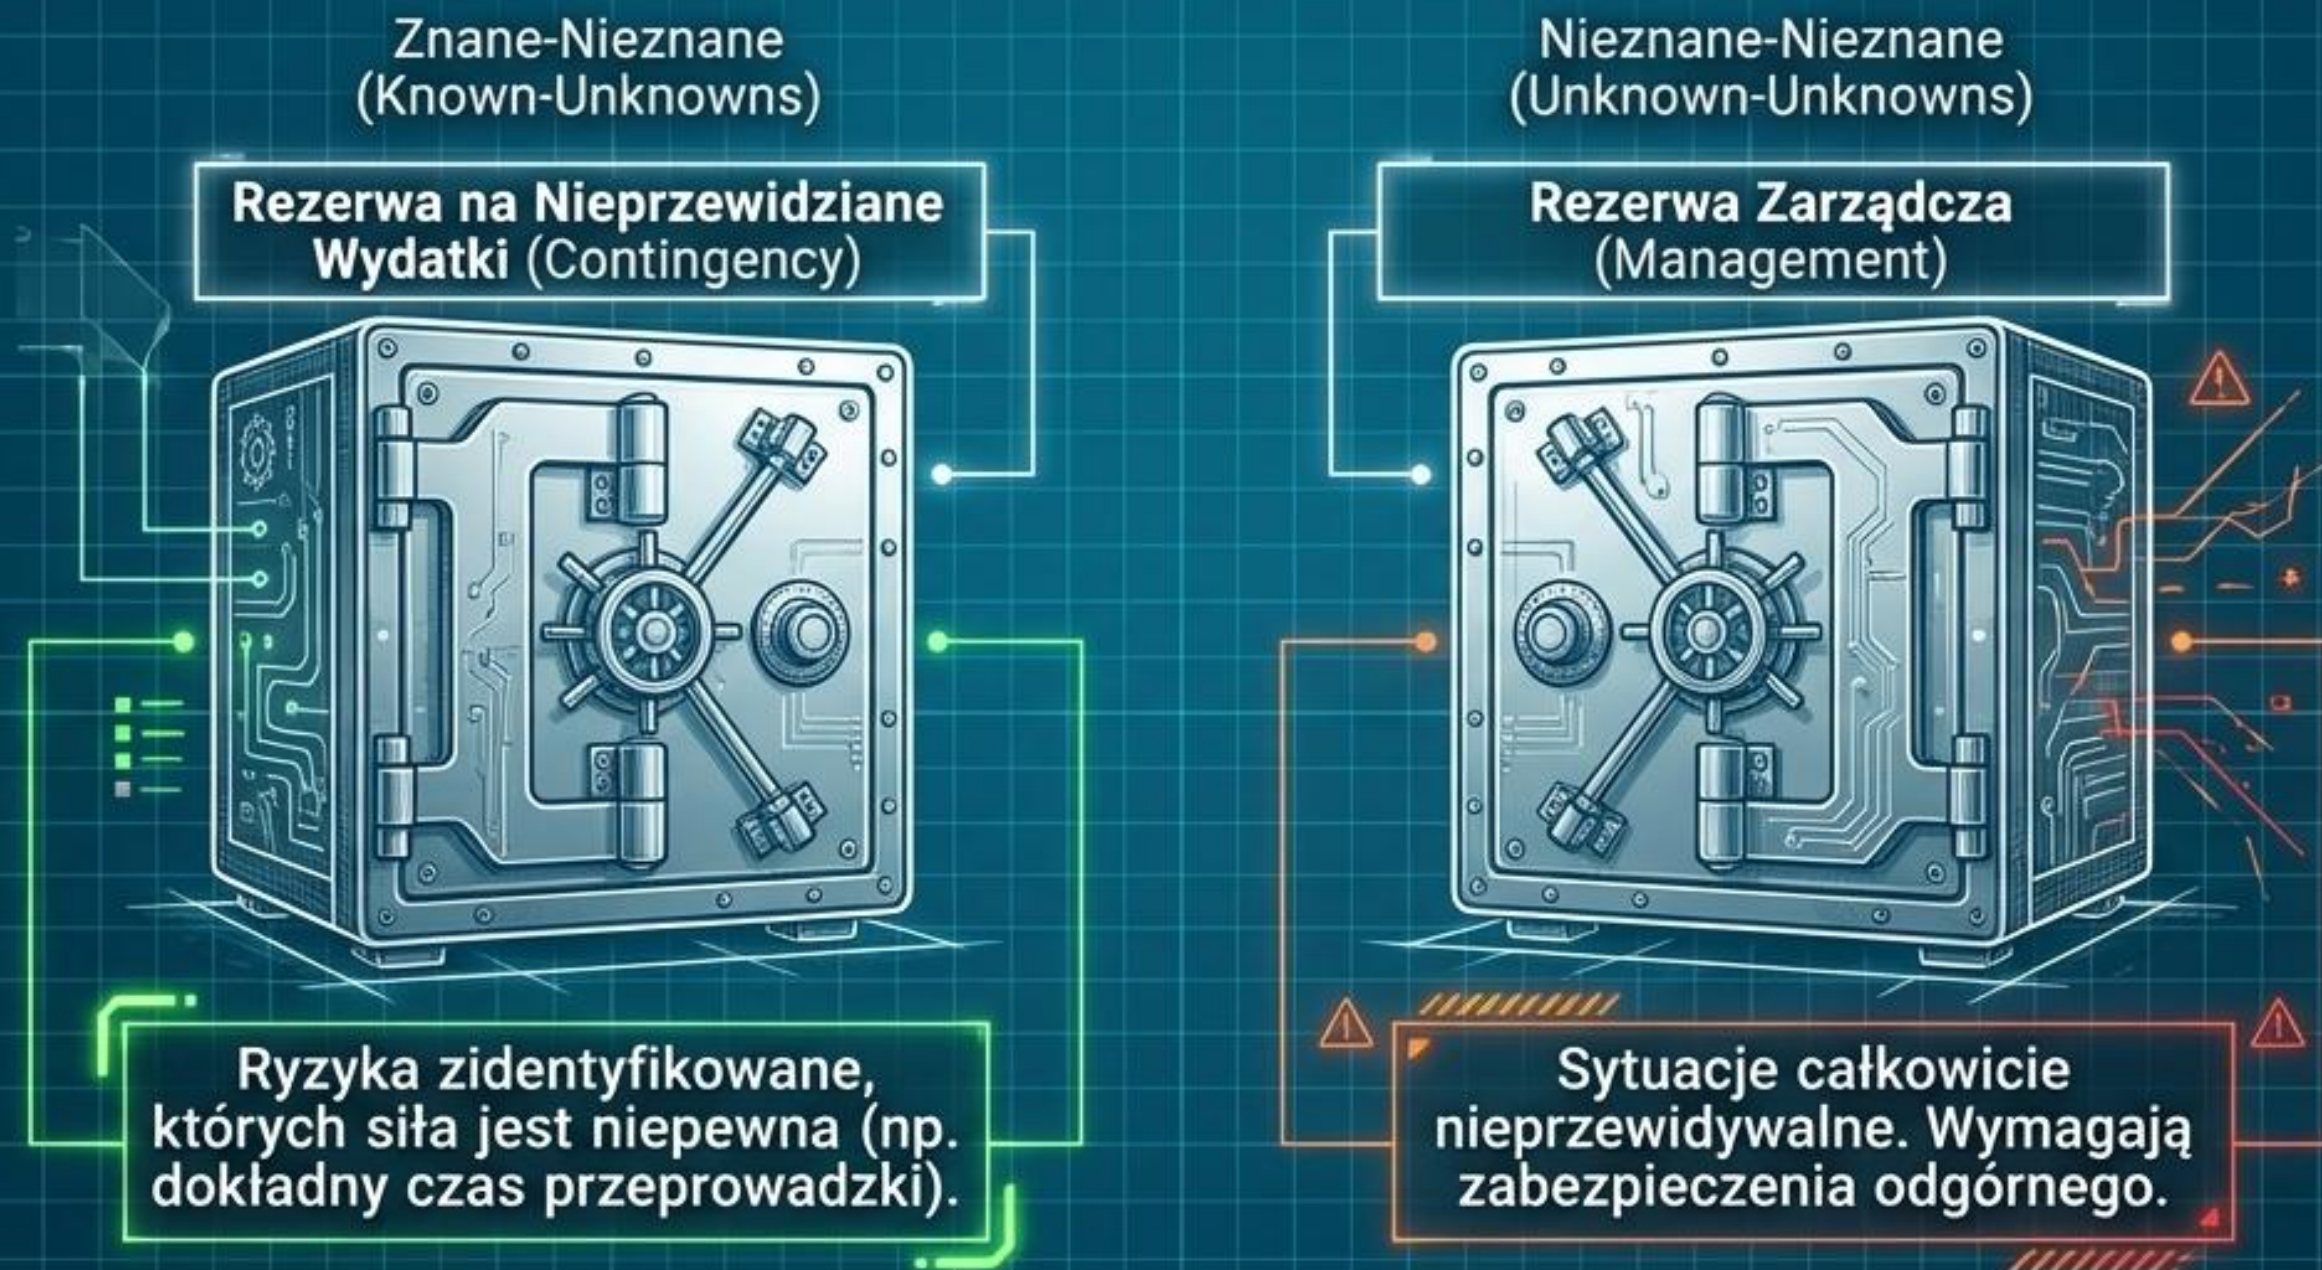

Wniosek: Nawet w prostych projektach (jak przeprowadzka autora, gdzie błąd estymacji przekroczył 100%), brak rezerw czyni skuteczną kontrolę niemożliwą.

Złote Zasady Kontroli Zakresu (Podsumowanie)

Zasada 1: Rozdzielaj Weryfikację.

Kontrola Jakości bada poprawność (accuracy); Walidacja Zakresu dba o formalną akceptację (acceptance).


Zasada 2: Waliduj Zawsze.

Zbieraj formalne podpisy (sign-offs) z akceptacji produktów, nawet jeśli projekt zostanie przerwany.



Zasada 3: Monitoruj Wpływ.

Zmiany w wymaganiach produktu zawsze rezonują na WBS i wymagają analizy odchyleń.



Zasada 4: Zero Tolerancji dla Pełzania.

Każda zmiana bezwzględnie musi przejść przez proces Zintegrowanej Kontroli Zmian (Perform Integrated Change Control). Zapobiega to utracie budżetu i rezerw.

