



Certyfikat PMP: Profesjonalne zakończenie projektu


Złoty standard zamykania procesów i etyki zawodowej

dr Zbigniew Galar



Paradoks ostatniej mili

Zakończenie to najczęściej zaniedbywany etap projektu, mimo że definiuje ostateczny sukces i zadowolenie klienta.

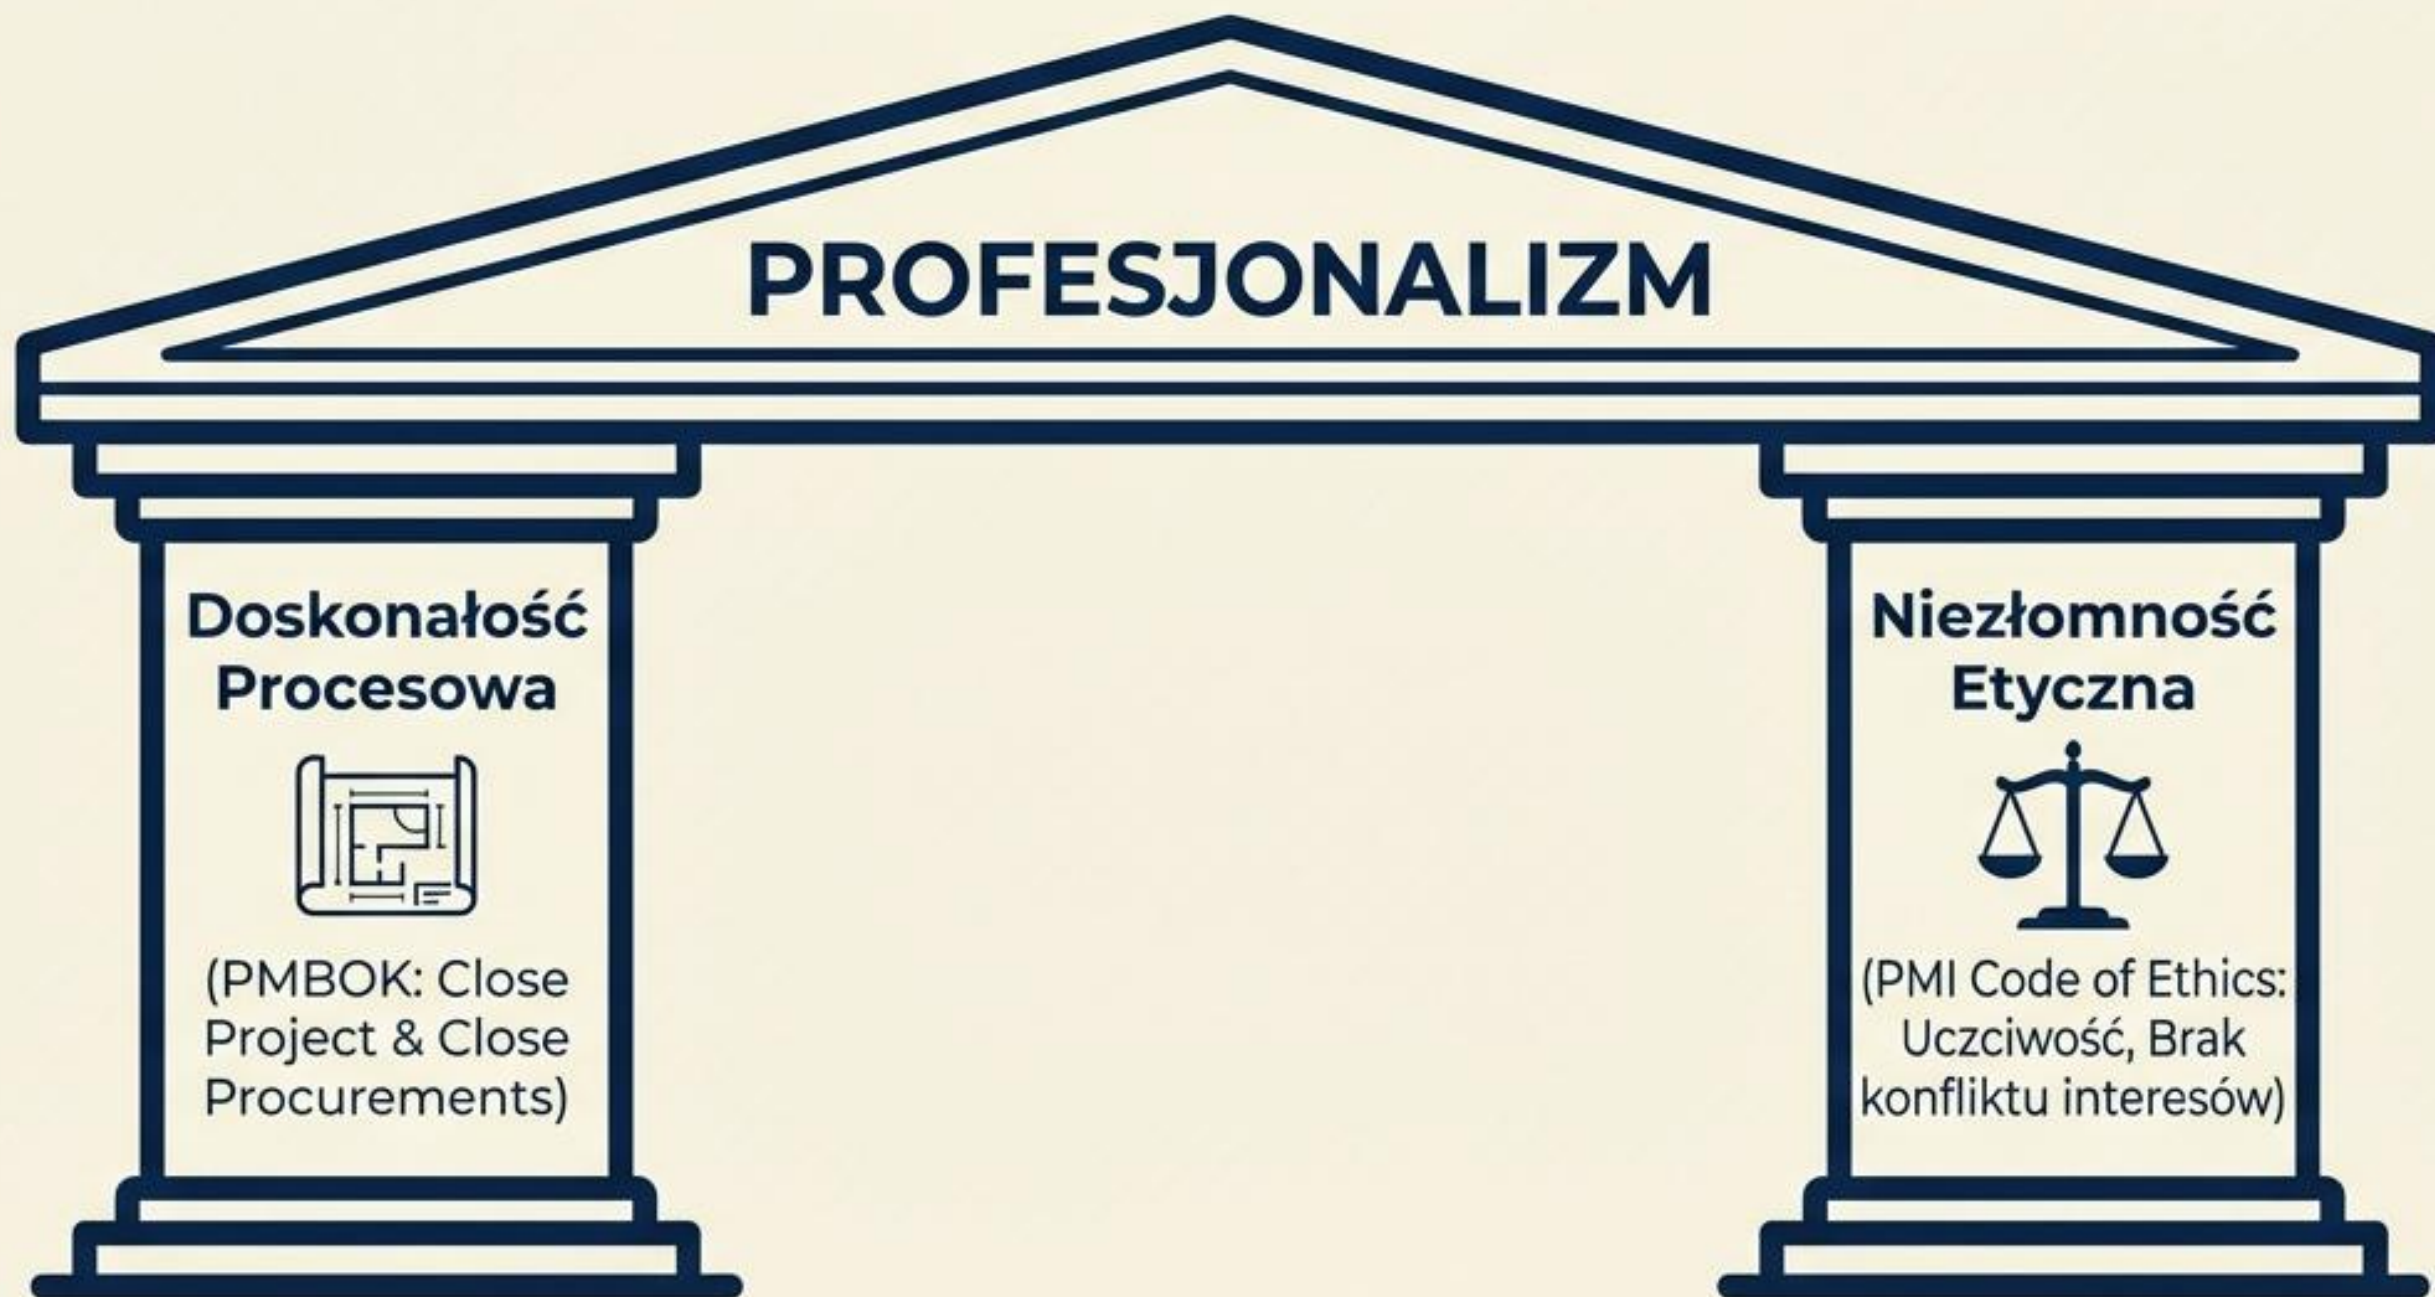

4 Scenariusze zakończenia projektu

Dodanie (Addition)

Projekt ewoluuje w osobną jednostkę biznesową.

Wygazzenie (Extinction)

Najlepsze i najbardziej profesjonalne zakończenie. Projekt zrealizował cele, został zaakceptowany i formalnie zamknięty.

Głodzenie (Starvation)

Odcięcie zasobów i powolna śmierć projektu.

Integracja (Integration)

Rozproszenie zasobów z powrotem do organizacji.

Filar I: Proces zamknięcia (Close Project)



Dziedzictwo wiedzy: Rejestr Doświadczeń (Lessons Learned)



To nie jest narzędzie dyscyplinarne do szukania winnych. To najcenniejszy zasób organizacji.

Zrozumienie sukcesów i porażek.

Zabezpieczenie przed powtarzaniem tych samych błędów w przyszłości.

Wdrażanie sprawdzonych innowacji do nowych inicjatyw.

Zarządzanie oczekiwaniami na mecie



Wniosek: Pytaj głęboko. Komunikacja na bieżąco to jedyny sposób na uniknięcie odrzucenia gotowego produktu podczas końcowego odbioru.

Filar II: Zamykanie kontraktów a etyka kupiecka

Proces (Close Procurements)



Strefa zagrożeń (Konflikt interesów)



Osobisty interes staje ponad dobrem projektu.




Faworyzowanie dostawców (np. powiązania rodzinne przy przetargach).



Wpływy potężnych interesariuszy obiecujących nagrody za uległość.

Anatomia Konfliktu Interesów: Test PM-a

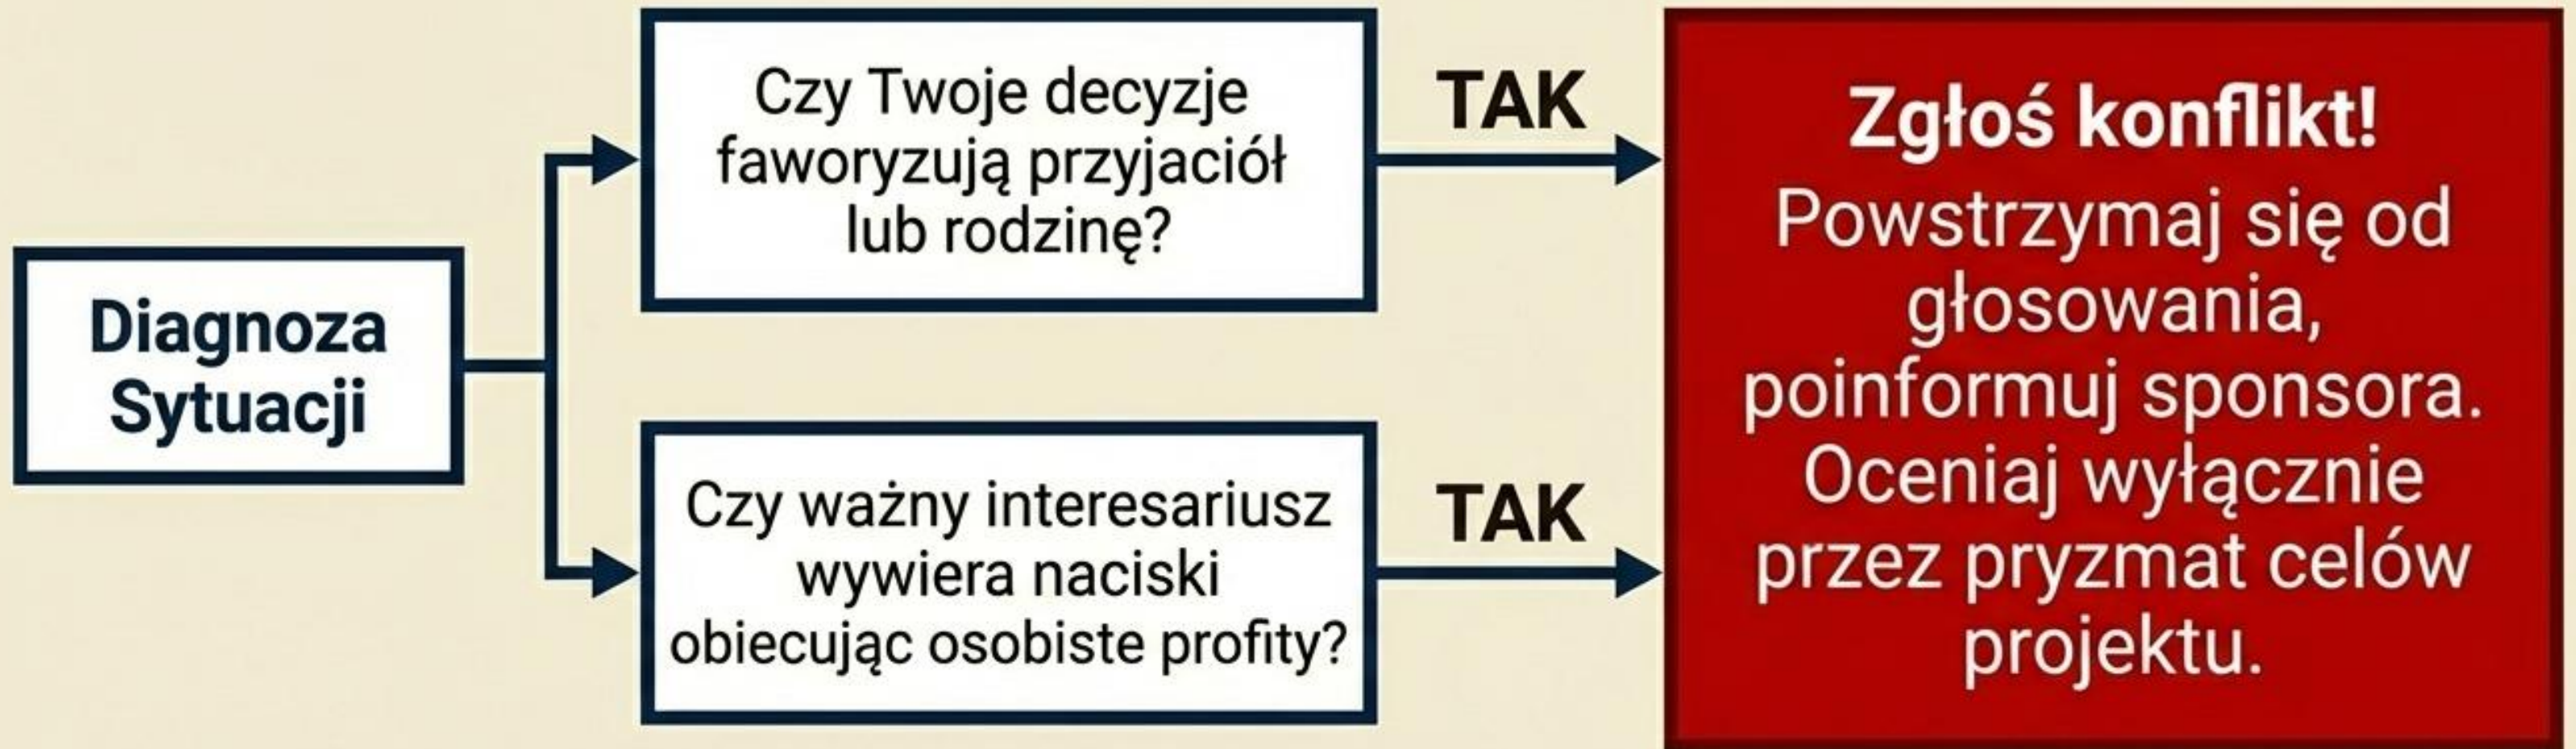

Złota Reguła: Nigdy nie stawiaj osobistych zysków ponad obowiązki zawodowe. Ukrywanie powiązań niszczy projekt i dyskwalifikuje PMP.



**Real World
Scenario**

Prezenty od dostawców: Darmowa konferencja

Kontekst & Sytuacja

**Projekt sieciowy za 1,2 mln \$,
modernizacja Ethernetu.**

Dostawca oferuje PM-owi wyjazd
do Scottsdale na konferencję –
opłacone hotele i gra w golfa.

Werdykt PMP

Odrzucenie oferty.

**Wartość przekracza firmowy
limit 100 \$.**

**Udział to jawny konflikt
interesów uderzający w
obiektywizm komisji przetargowej.**

**Wymówka 'Nie znałem polityki
firmy' nie ratuje statusu PMP.**

Uczciwość w Raportowaniu: Test Prawdy



Pokusa 1: Rozciąganie czasu pracy po zakończeniu projektu, aby zgarnąć premię o wartości 1500 \$.

(Werdykt: Całkowity brak integralności)



Pokusa 2: Raportowanie na zielono, gdy projekt jest w kłopotach lub uderzyło w niego ryzyko.

Profesjonalna decyzja: Czasami trzeba mieć odwagę zabić projekt. Lider informuje o zagrożeniach od razu. Złe wiadomości nie ukryją się same.

Profesjonalista vs. Amator

Profesjonalista (Postawa PMP)	Amator (Brak profesjonalizmu)
• Szczera komunikacja: "Nie wiem, ale się dowiem".	• Przyjmuje sponsorowane wyjazdy do kurortów od oferentów.
• Chroni własność intelektualną i firmowe tajemnice.	• Ujawnia poufne dane firmowe konkurencji.
• Bierze projekty adekwatne do wiedzy, by rosnąć.	• Kieruje się wyłącznie własnym zyskiem.

Odpowiedzialność Zawodowa PMP



Złota Zasada PM-a (Golden Rule)



Traktuj innych tak, jak sam
chciałbyś być traktowany.

Nie ma substytutu dla integralności i uczciwości. Reputację i zaufanie interesariuszy buduje się latami, a traci w ułamku sekundy, zatajając prawdę lub idąc na etyczne kompromisy.

Ostateczna Checklista Zamknięcia (Roadmapa PMP)

Proces

- ☒ Zgodność produktu zweryfikowana
- ☒ Akceptacja formalna zdobyta
- ☒ Lessons learned zebrane
- ☒ Dokumentacja zarchiwizowana
- ☒ Kontrakty rozliczone i zamknięte

Etyka

- ☒ Decyzje wolne od konfliktu interesów
- ☒ Poufność danych (IP) zachowana
- ☒ Stan faktyczny uczciwie zaraportowany
- ☒ Wynik zespołu postawiony wyżej niż osobisty zysk

