

Certyfikat PMP: Dokument Zakresu Projektu

Architektura Planowania
i Zarządzania Wymaganiami



dr Zbigniew Galar



Zakończenie Inicjacji, Start Planowania



Główny Proces: Opracowanie Planu Zarządzania Projektem

Wykonywanie (Executing)

Jak zrealizujemy pracę.

Monitorowanie (Monitoring)

Jak będziemy śledzić postępy.

Kontrolowanie (Controlling)

Jak zareagujemy na odchylenia.

Zamykanie (Closing)

Jak oficjalnie zakończymy projekt.




The diagram illustrates the Project Management Process. At the center is a glowing blue circle with a white border, containing the text 'Plan Zarządzania Projektem (Główny integrator wszystkich planów pomocniczych)'. Four large, stylized blue arrows with white outlines point outwards from this central circle towards the four surrounding process boxes. The background is dark blue with a subtle grid pattern and faint circuit-like lines.


**Plan Zarządzania
Projektem**
(Główny integrator
wszystkich planów
pomocniczych).

Zasada Dopasowania (Tailoring)


Wybór odpowiednich procesów zależy od specyfiki projektu. Planowanie nie jest szablonowe.

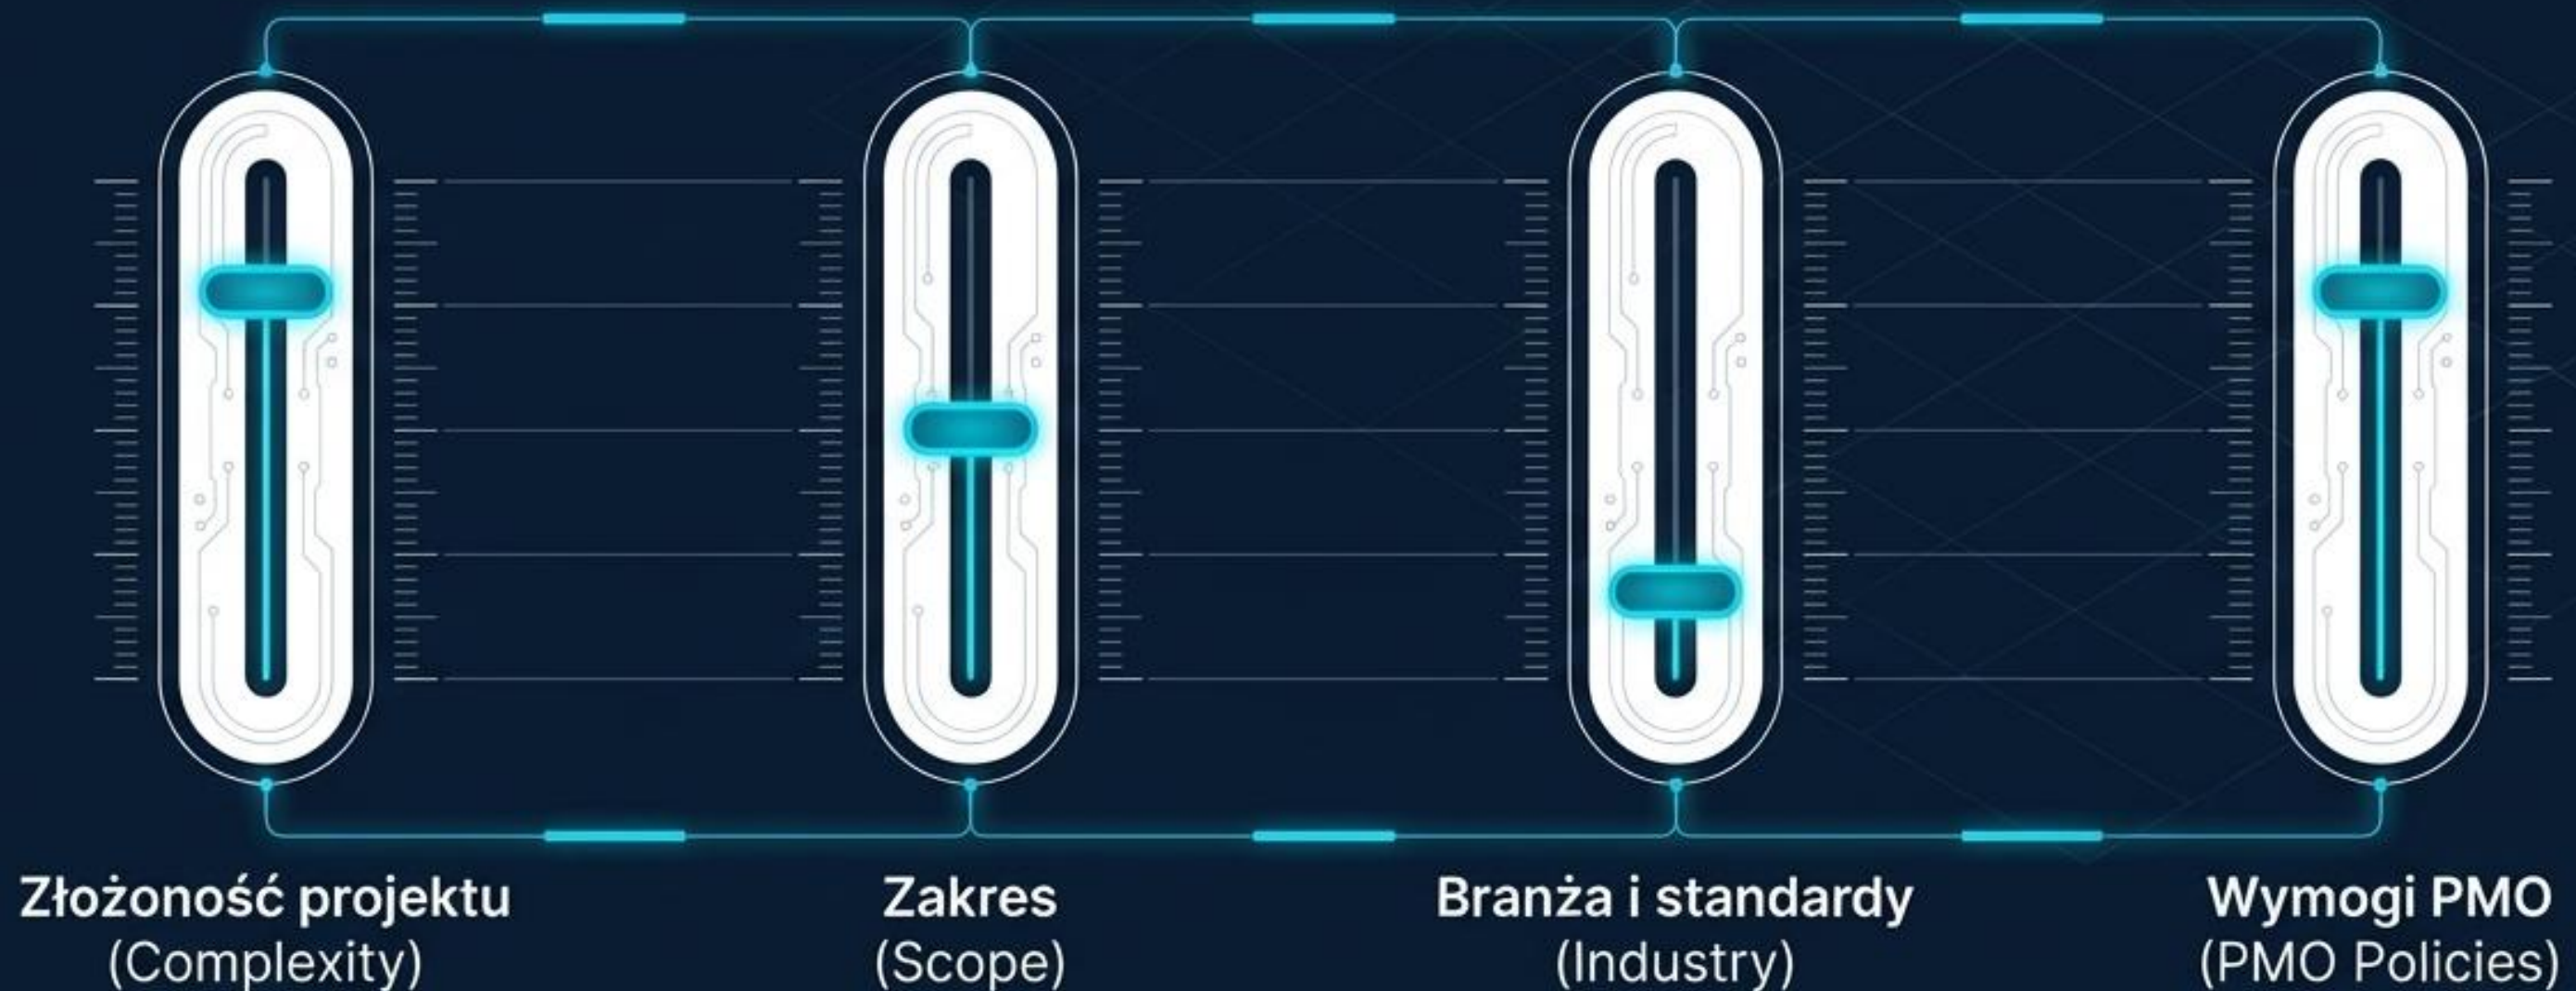


Schemat Przetwarzania: Tworzenie Planu

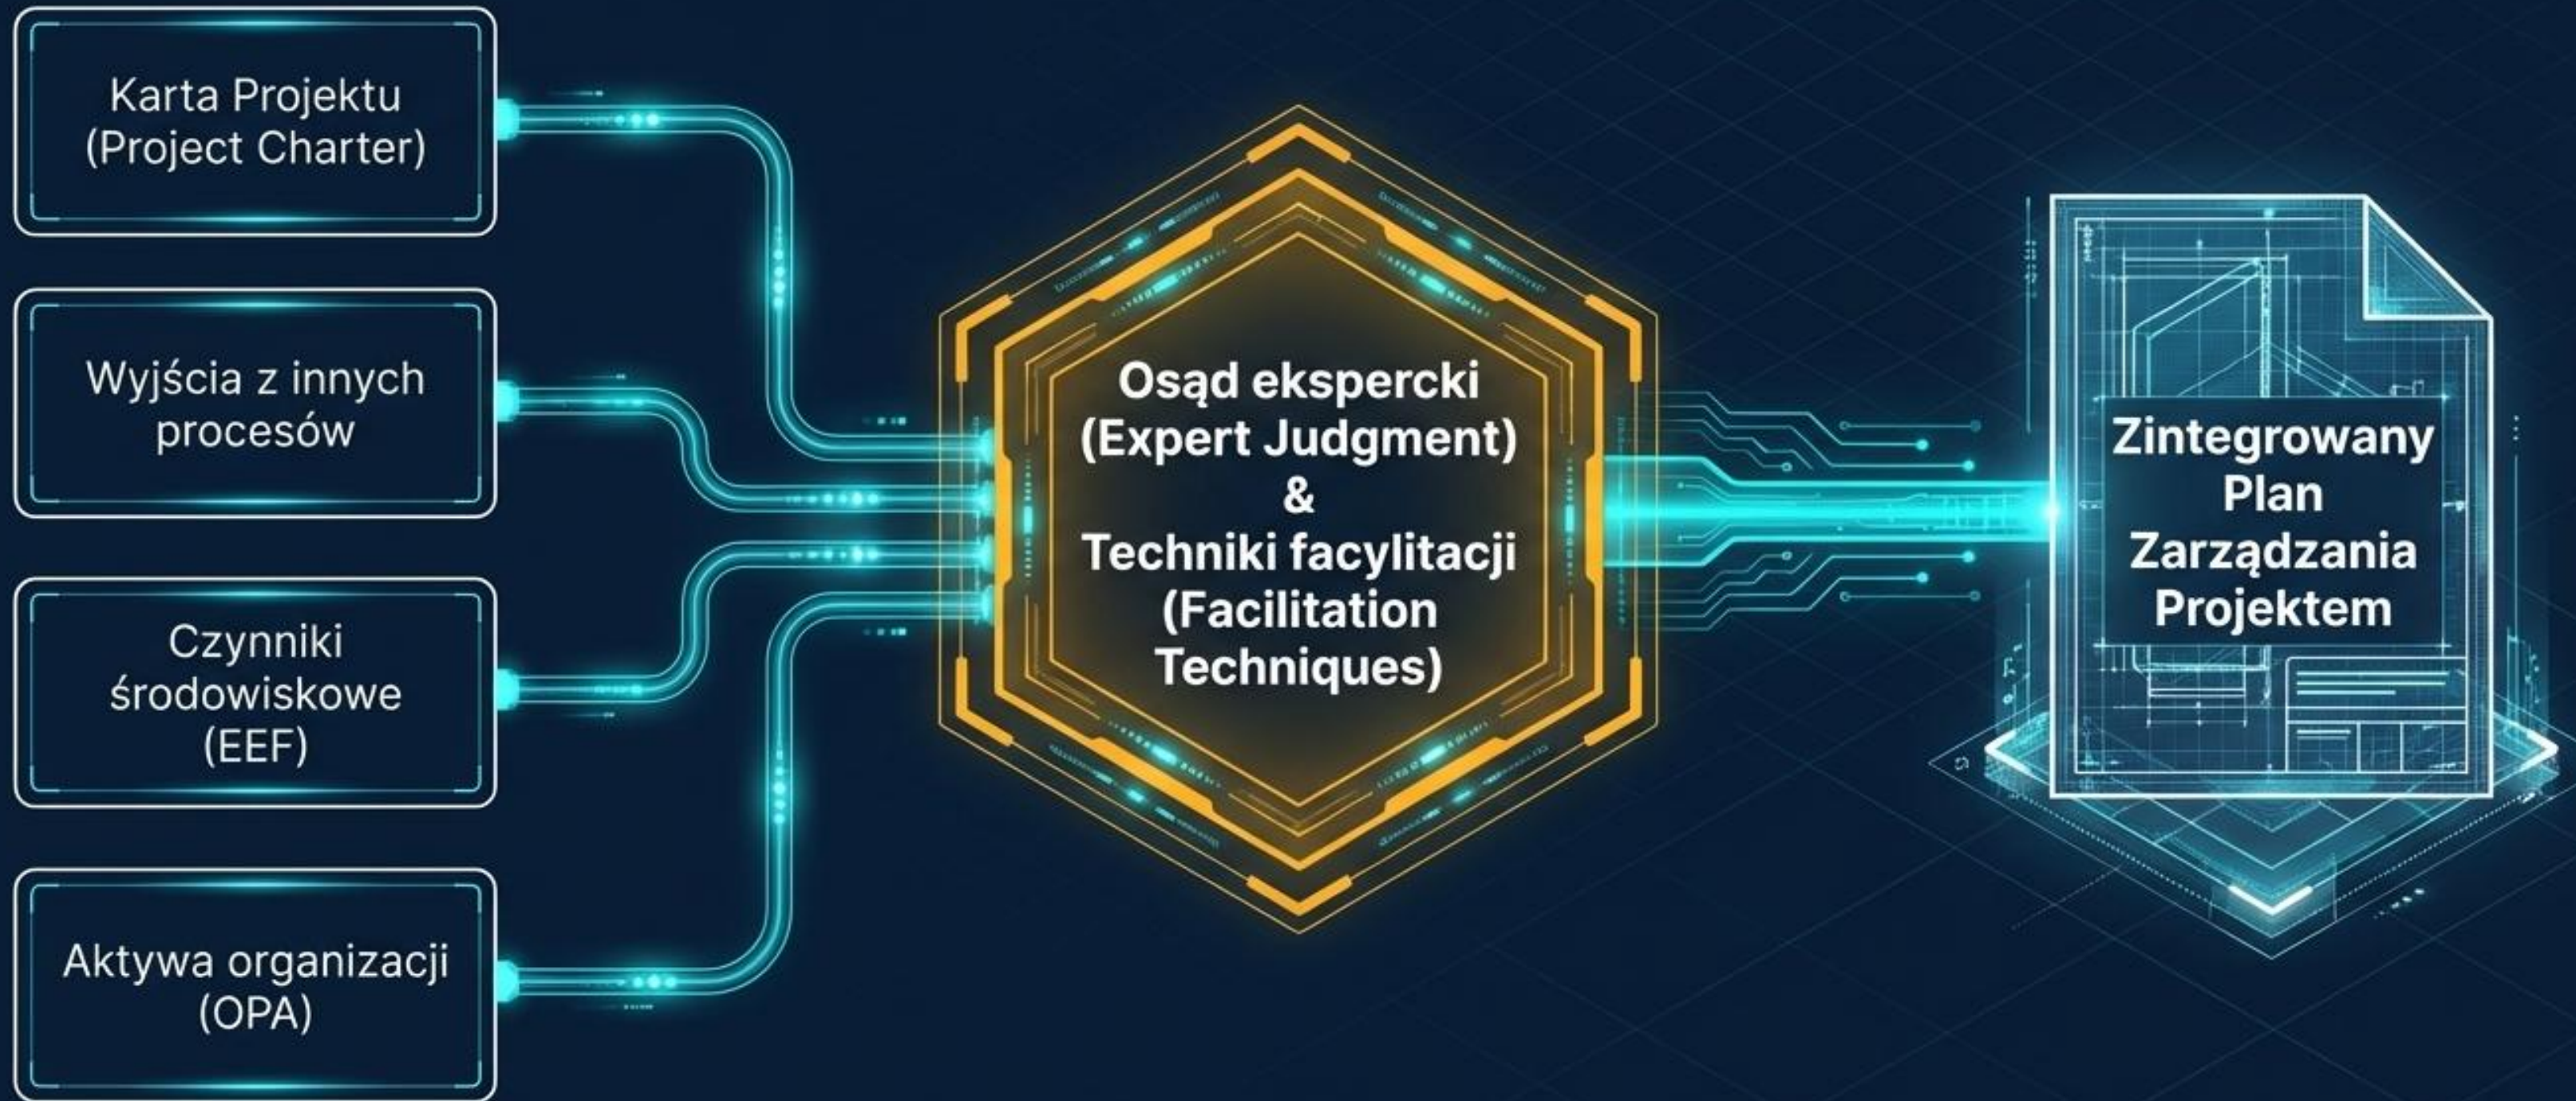

Ekosystem Planu Zarządzania Projektem

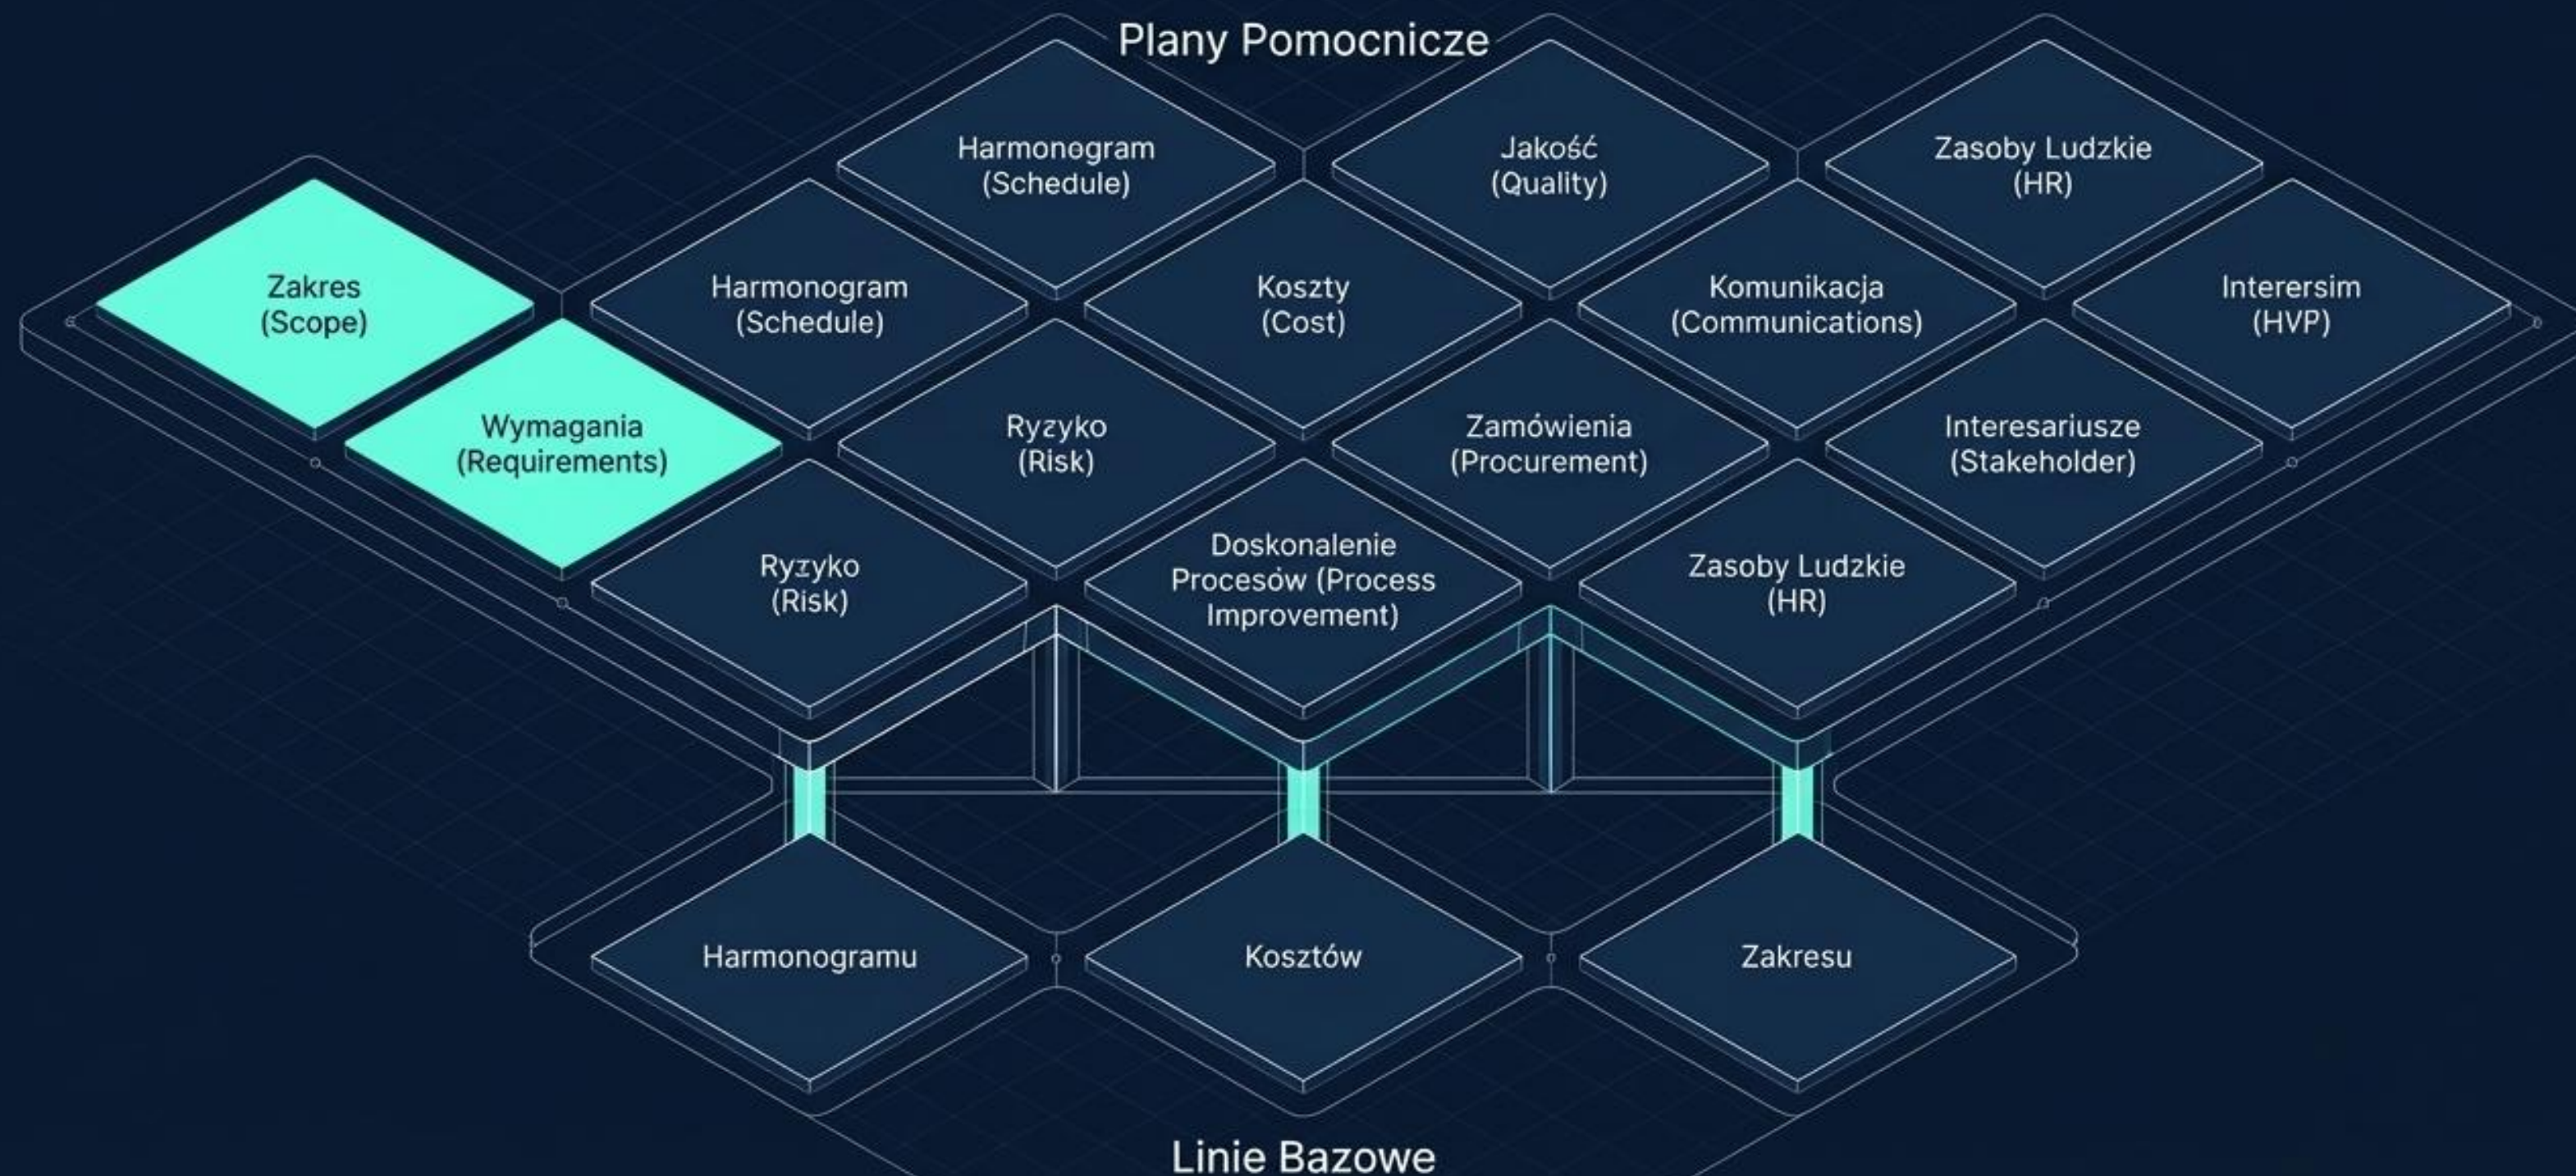

Architektura Systemu Informacyjnego (PMIS)

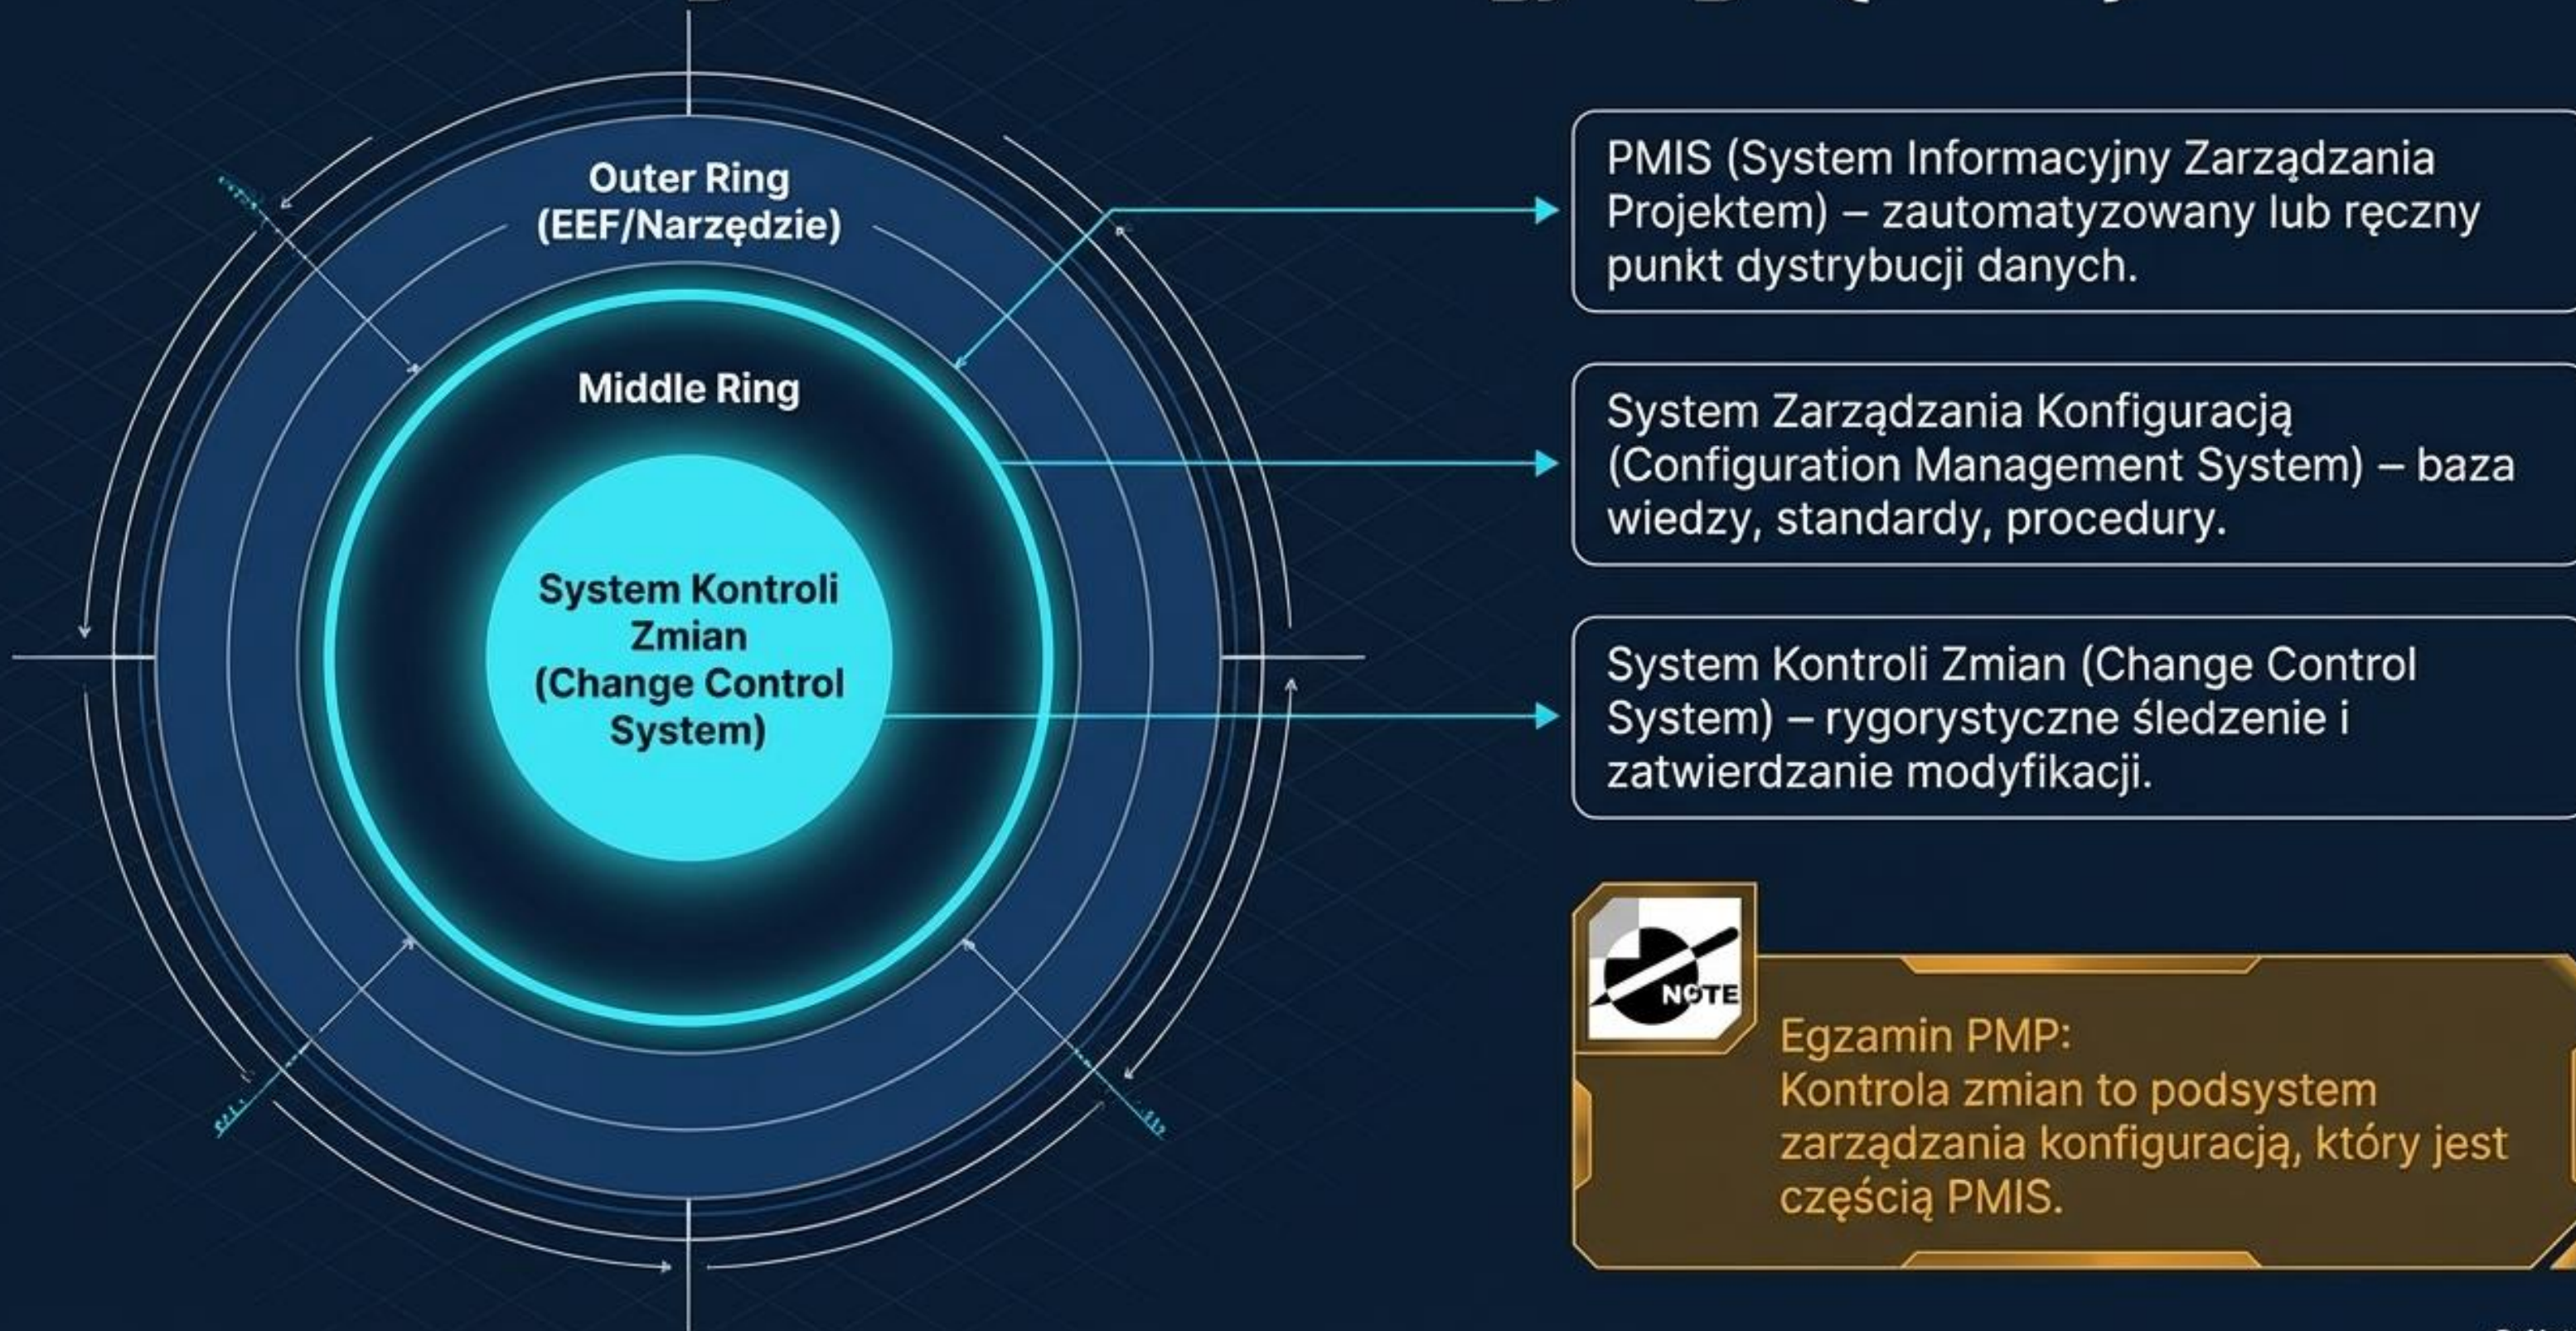

Proces: Planowanie Zarządzania Zakresem

Definiuje i kontroluje, co wchodzi w skład projektu, a co jest poza nim.



Macierz Porównawcza: Zakres vs. Wymagania

		Plan Zakresu	Plan Wymagań
	Główny Cel	Definiowanie deliverables i tworzenie WBS.	Analiza, dokumentowanie i śledzenie potrzeb.
	Co kontroluje?	Zmiany w oświadczeniu o zakresie i weryfikację.	Zmiany w macierzy śledzenia i priorytetyzację wymagań.
	Skupienie	Granice projektu (Co robimy).	Oczekiwania interesariuszy (Dlaczego to robimy i jakie warunki musi spełniać).

Cykl Życia a Planowanie Wymagań

Wszystkie wymagania dla danej fazy muszą być w pełni ukończone i zatwierdzone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Cykl
Sekwencyjny
(Sequential)



Cykl
Nakładający się
(Overlapping)



Wymagania nie są w pełni zdefiniowane przed startem. Stosuje się **stopniowe doprecyzowanie** (*progressive elaboration*) w miarę postępu projektu.

Proces: Zbieranie Wymagań (Od Potrzeb do Danych)




Wymagania to mierzalne, testowalne i identyfikowalne warunki, które musi spełniać produkt, aby zaspokoić cele projektu.

Złota zasada PMBOK® – Nie wszystkie zebrane wymagania znajdą się w końcowym zakresie projektu!

Proces 'Definiowania Zakresu' przefiltruje je w późniejszym etapie.

Taksonomia Wymagań

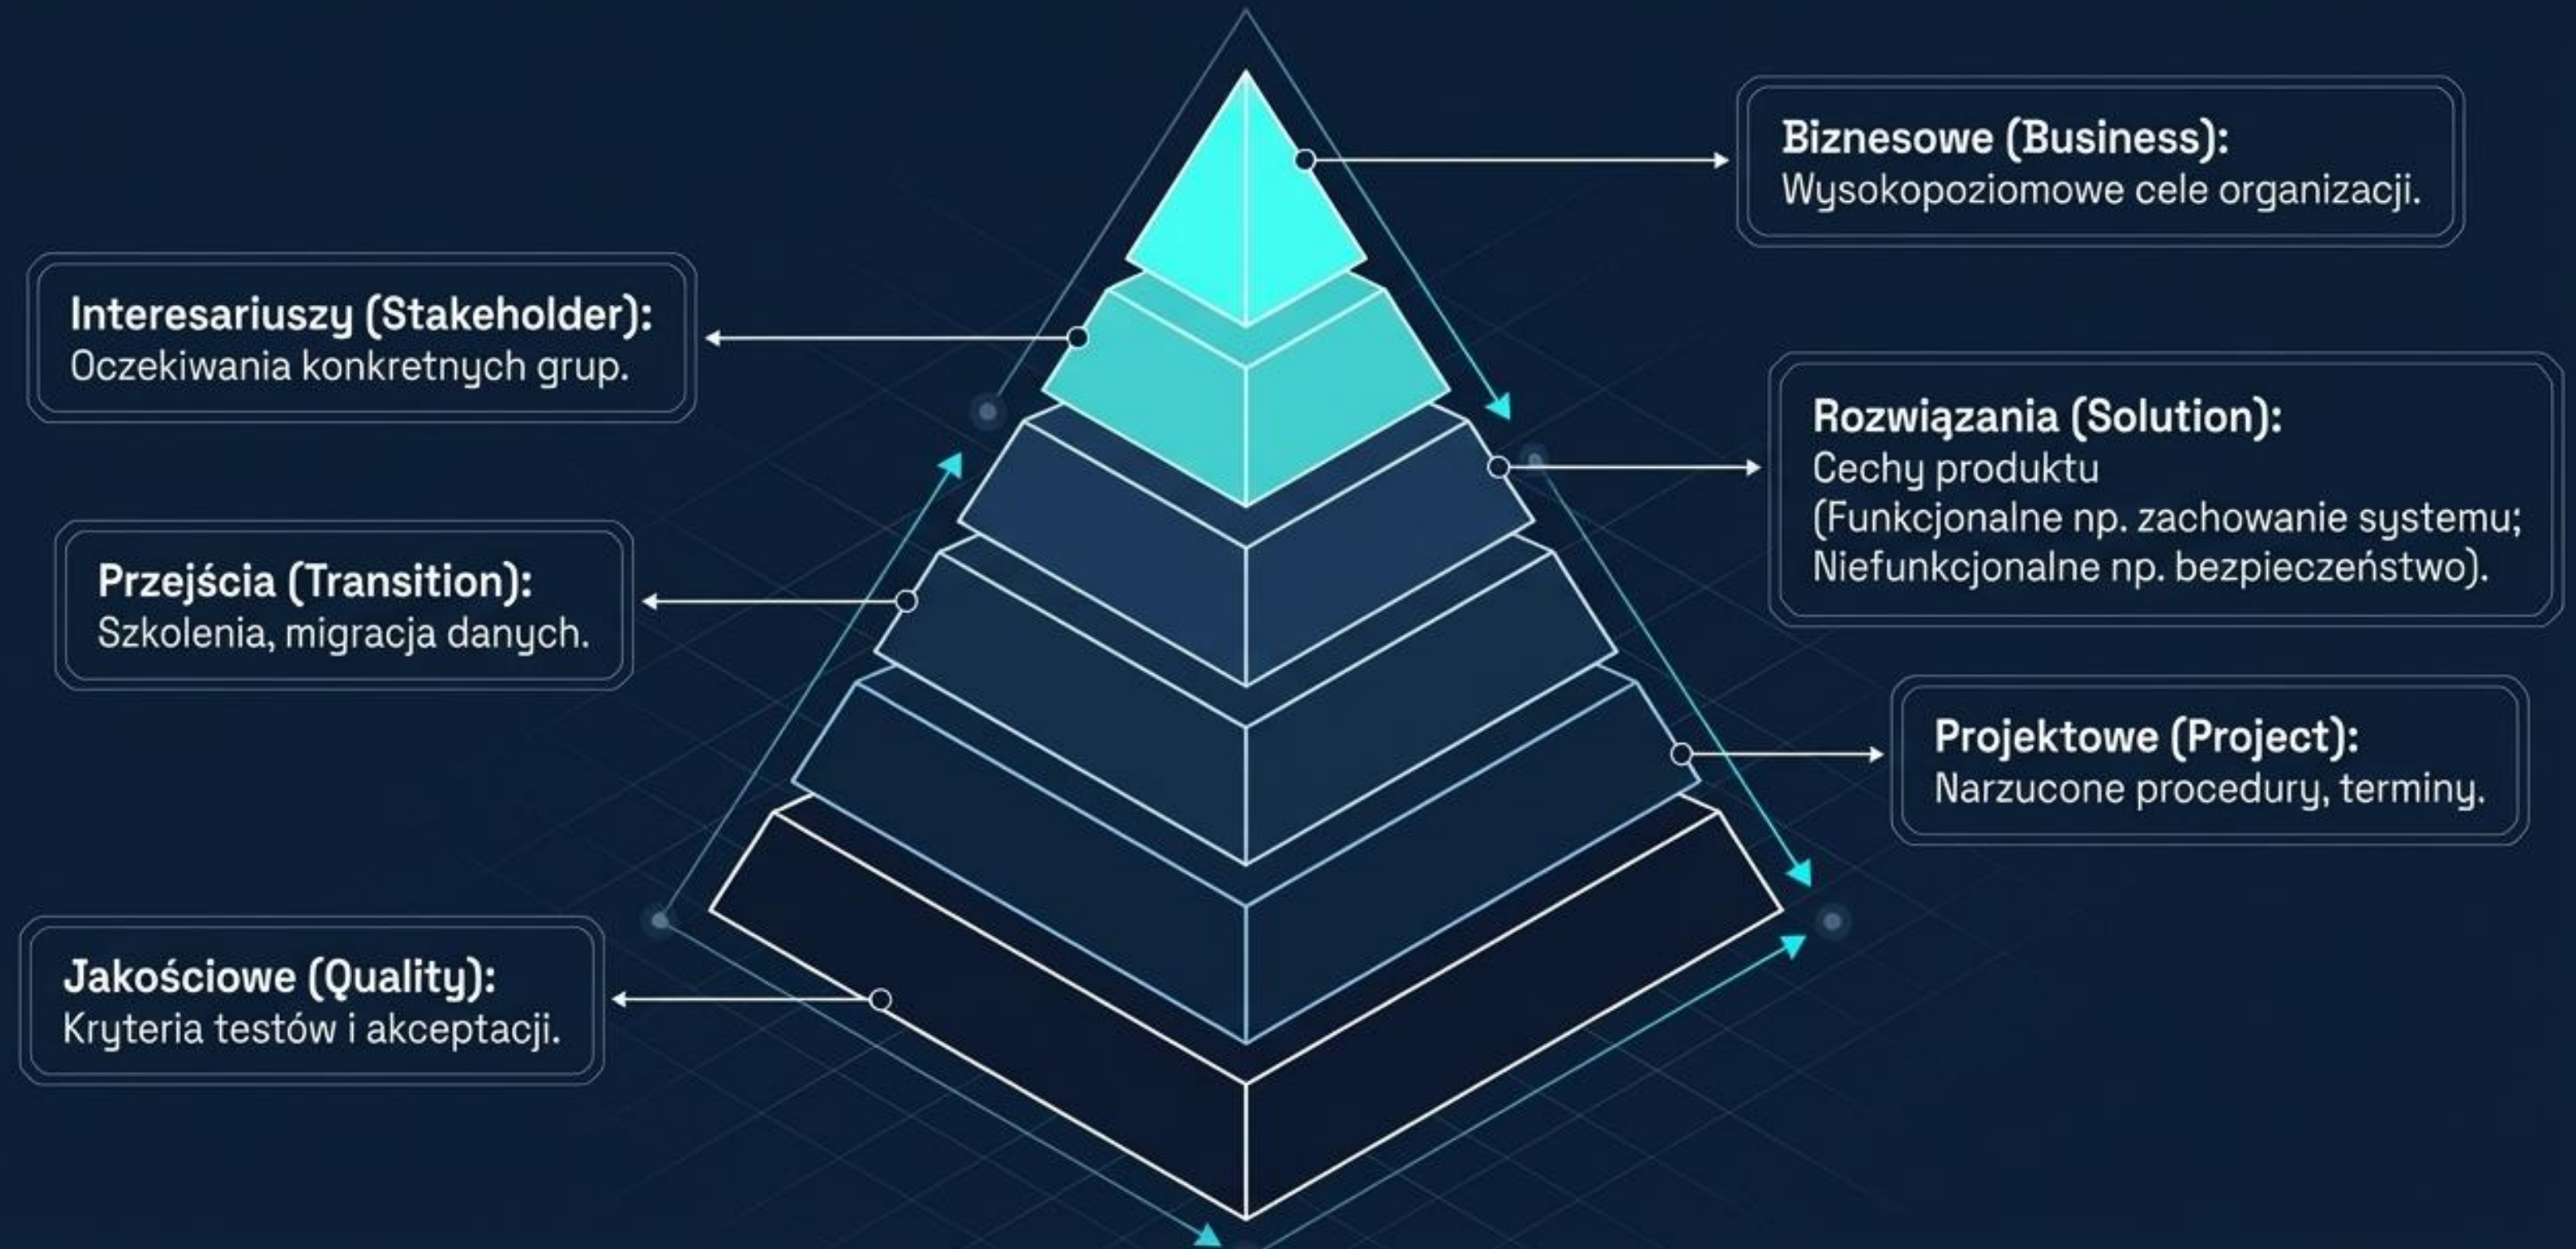

Egzamin PMP: Krytyczne Wskazówki (Spotlights)



Node 1 (Kolejność):

"Develop Project Management Plan" to *pierwszy* proces planowania. Choć wymaga wyjść z innych procesów do ukończenia, jego szkielet powstaje najpierw.



Node 2 (Ewolucja):

Plan Zarządzania Projektem podlega *stopniowemu doprecyzowaniu* (*progressively elaborated*) przez cały cykl życia projektu.



Node 3 (Podstawa):

Wymagania są absolutnym fundamentem do tworzenia WBS, szacowania kosztów, harmonogramu i planowania jakości. Muszą być mierzalne.

Synteza Architektury: Od Wymagania do Linii Bazowej



Podsumowanie Fazy Planowania Zakresu

Master Plan

Plan Zarządzania
Projektem to żyjący
ekosystem 11 planów
pomocniczych i 3 linii
bazowych,
sterujący całym
wykonawstwem.

Architektura Zmian

PMIS zintegrowany z
kontrolą konfiguracji
i kontrolą zmian to
tarcza chroniąca
stabilność projektu.

Rygor Wymagań

Zbieranie wymagań
to nie koncert
życzeń – to proces
transformacji potrzeb
w mierz w mierzalne,
testowalne
fundamenty
struktury WBS.
