


Certyfikat PMP: Proces WBS

Architektura i dekompozycja
fundamentu projektu

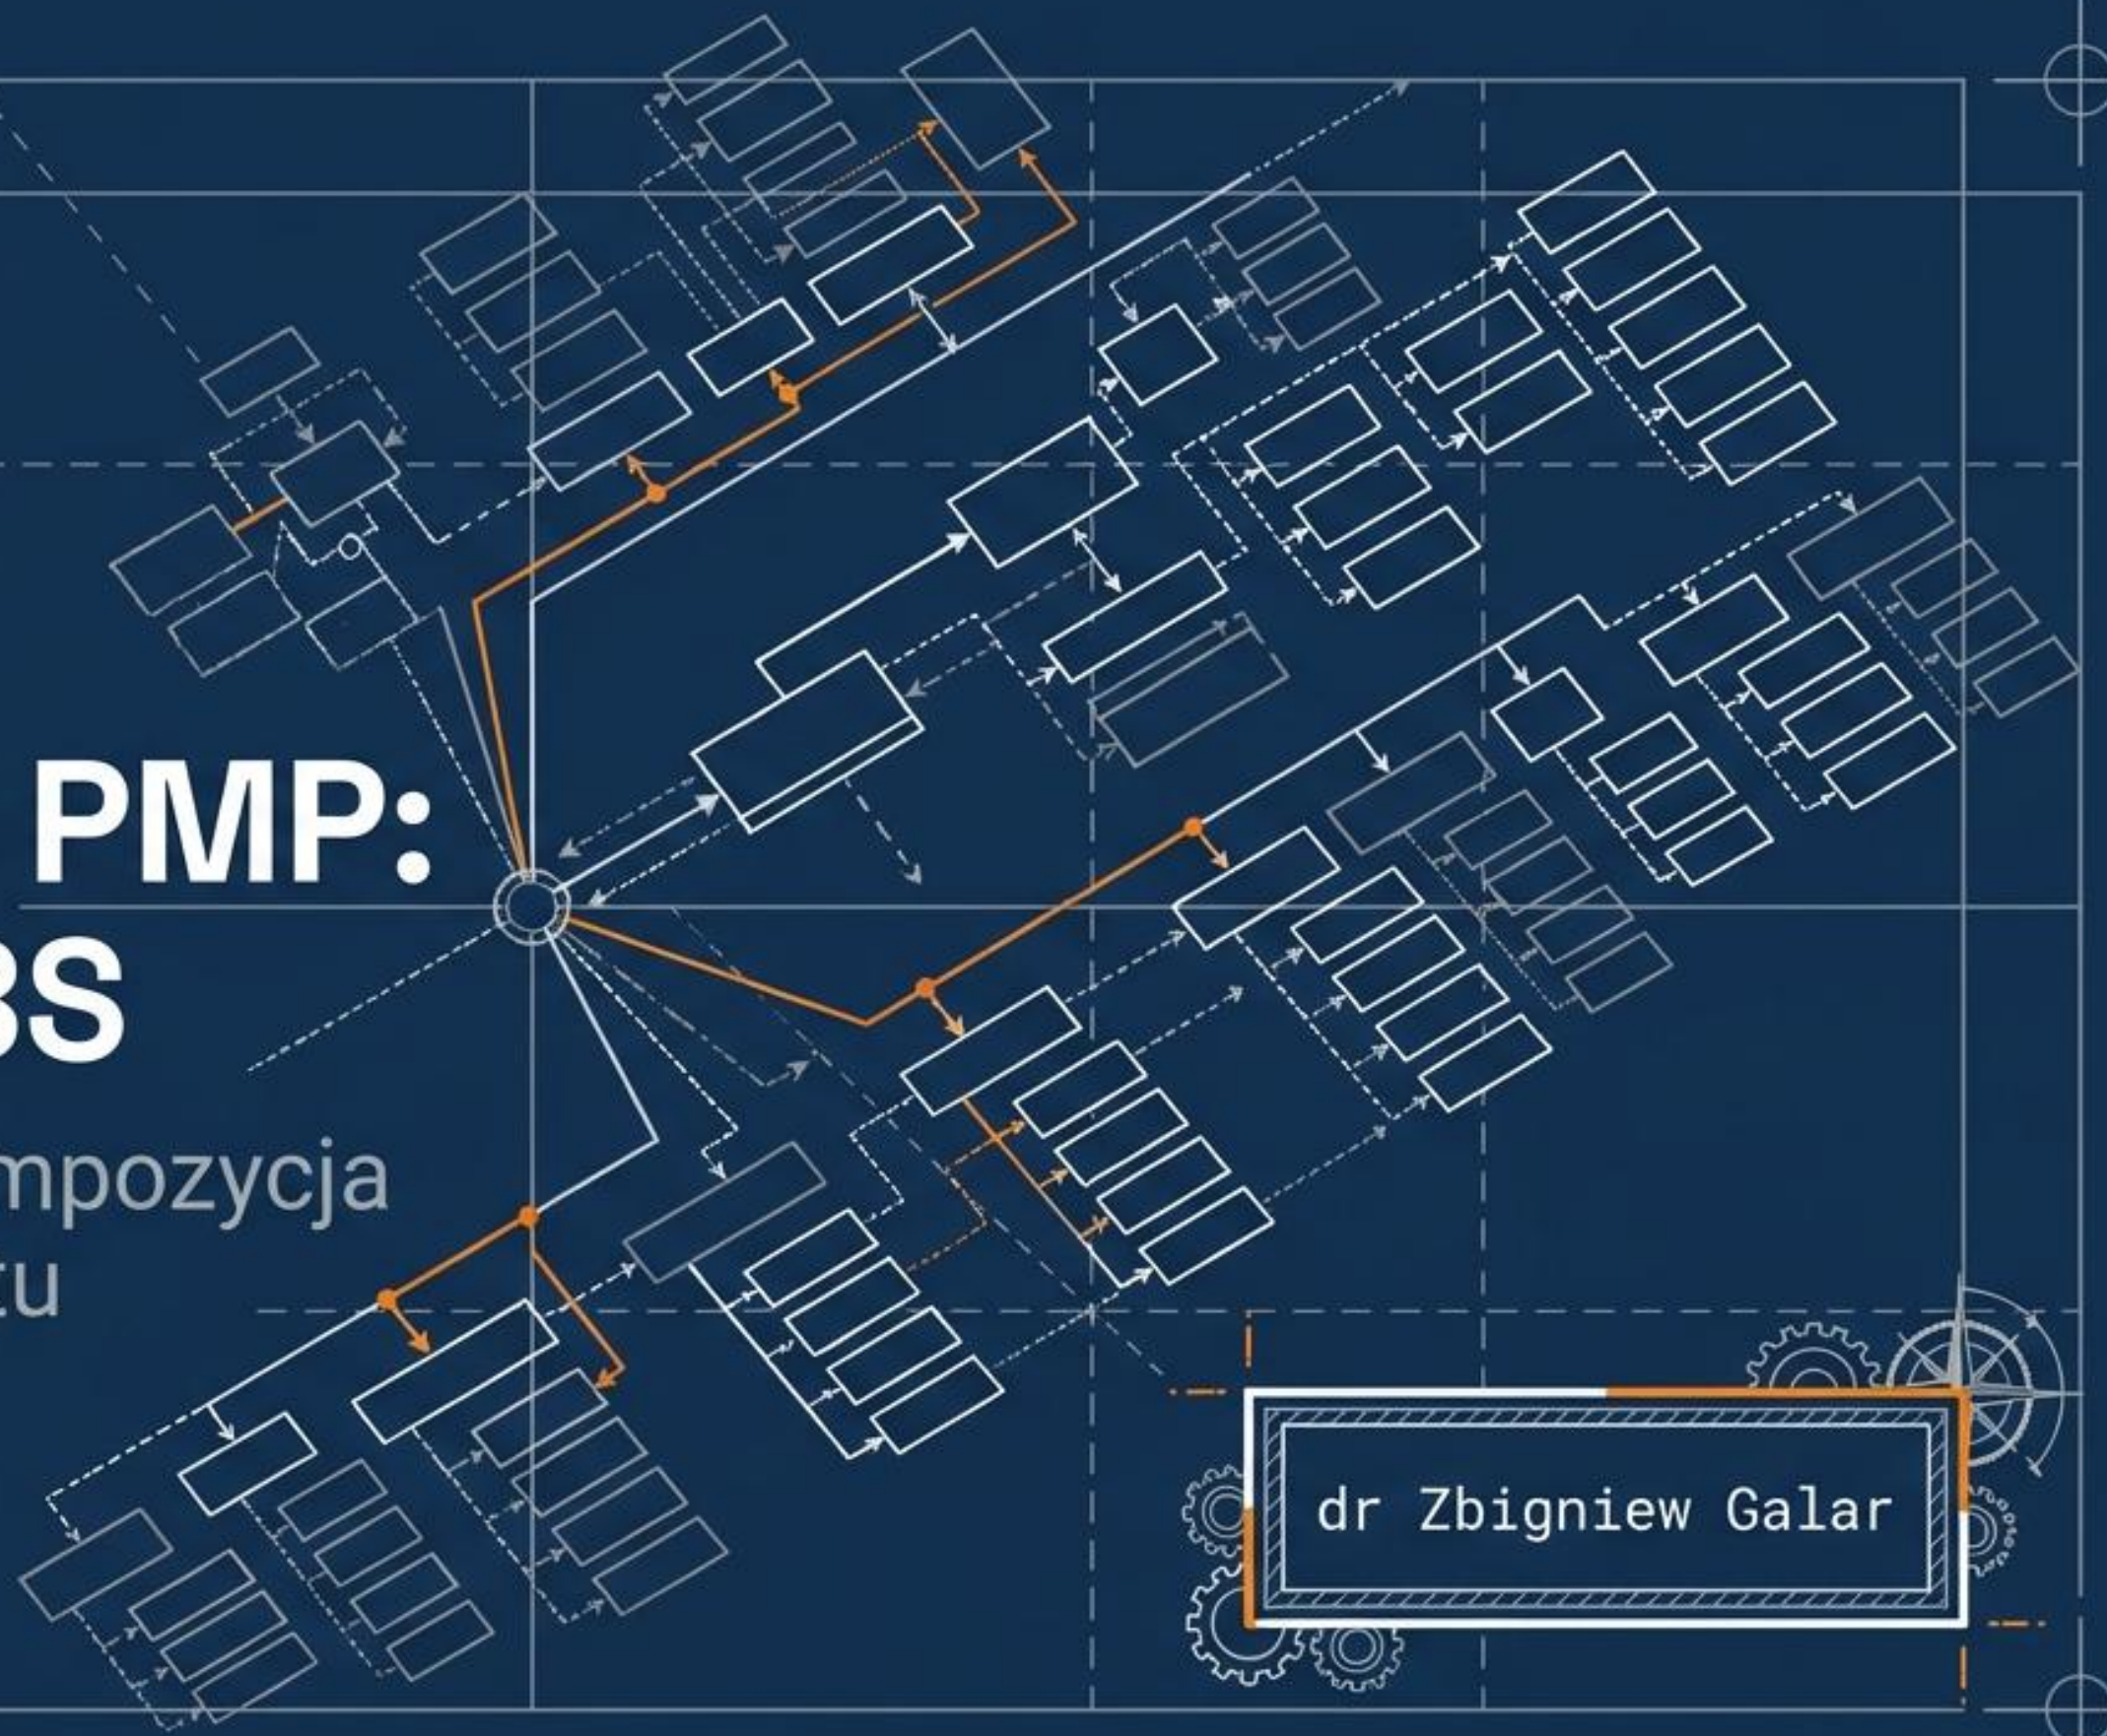

dr Zbigniew Galar

Czym właściwie jest WBS?

Projekt

Twój WBS jest tylko tak dokładny, jak Twoja lista wymagań.



Fundament planowania:

Hierarchiczna dekompozycja całkowitego zakresu pracy projektu.



Produkty, nie zadania:


WBS definiuje to, co zostanie dostarczone (deliverables), a nie to, co należy zrobić.



Baza estymacji:

Postęp, koszty i czas opierają się na precyzyjnych pomiarach segmentów WBS.

Architektura Procesu: Create WBS

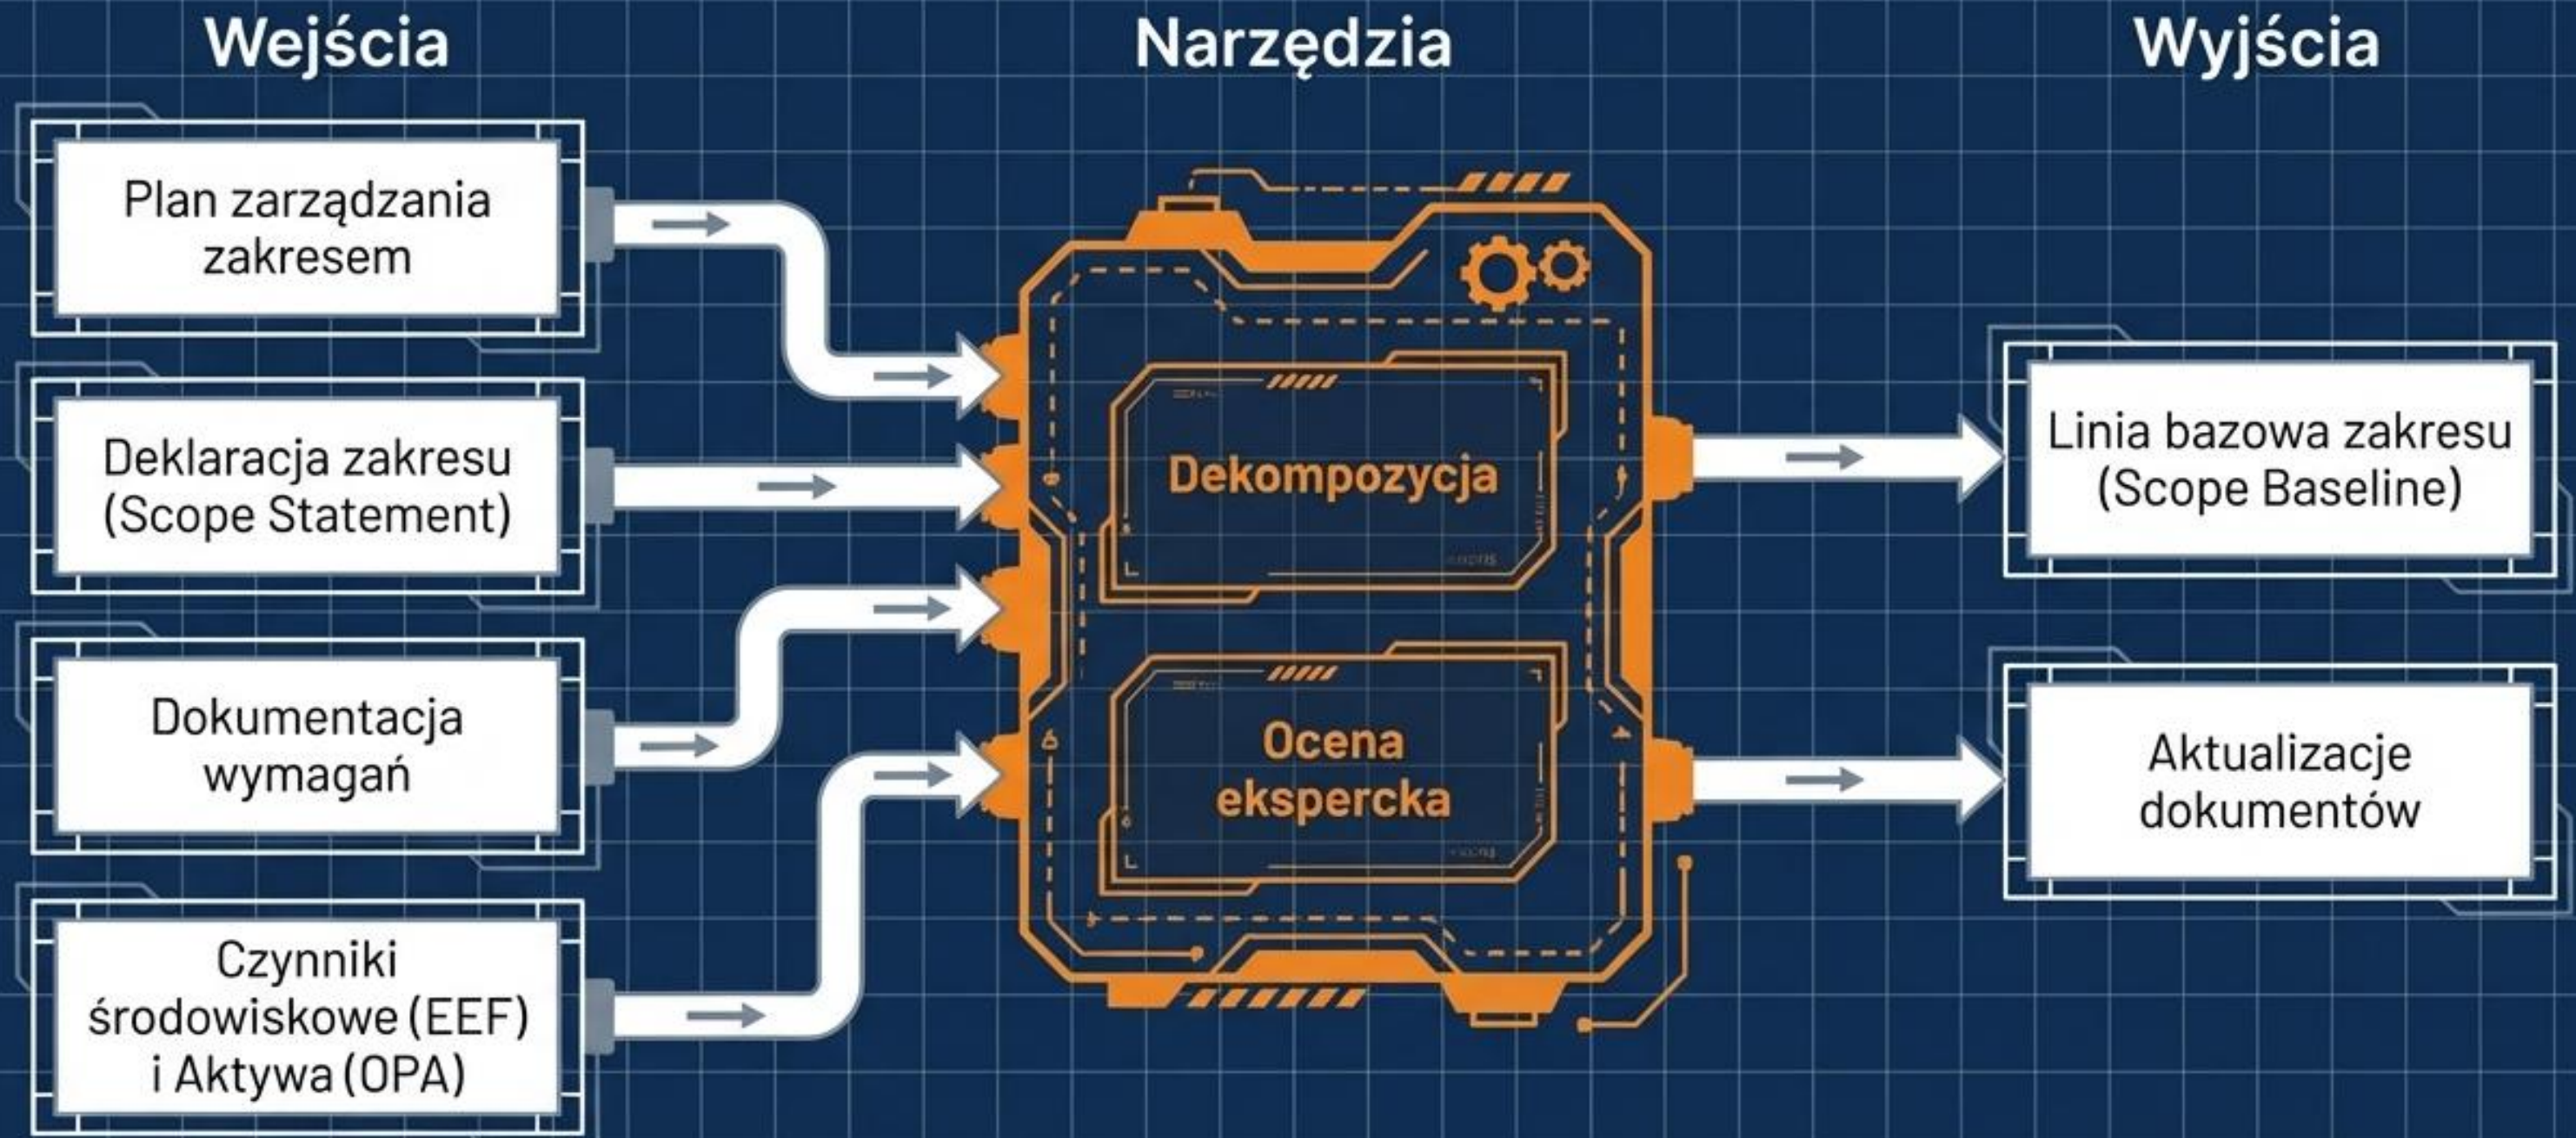

Dekompozycja: 5 Technicznych Kroków w Dół



Trzy Opcje Organizacji Struktury WBS

Fazy Projektu



Poziom 1 odpowiada cyklowi życia. Produkty są przyporządkowane do faz.

Główne Produkty




Poziom 1 oparty na fizycznych/logicznych komponentach rozwiązania.

Podprojekty Zewnętrzne



Poziom 1 zdefiniowany przez pulę prac zlecanych na zewnątrz (np. podwykonawcom).

Hierarchia i Poziomy (Od ogółu do szczegółu)

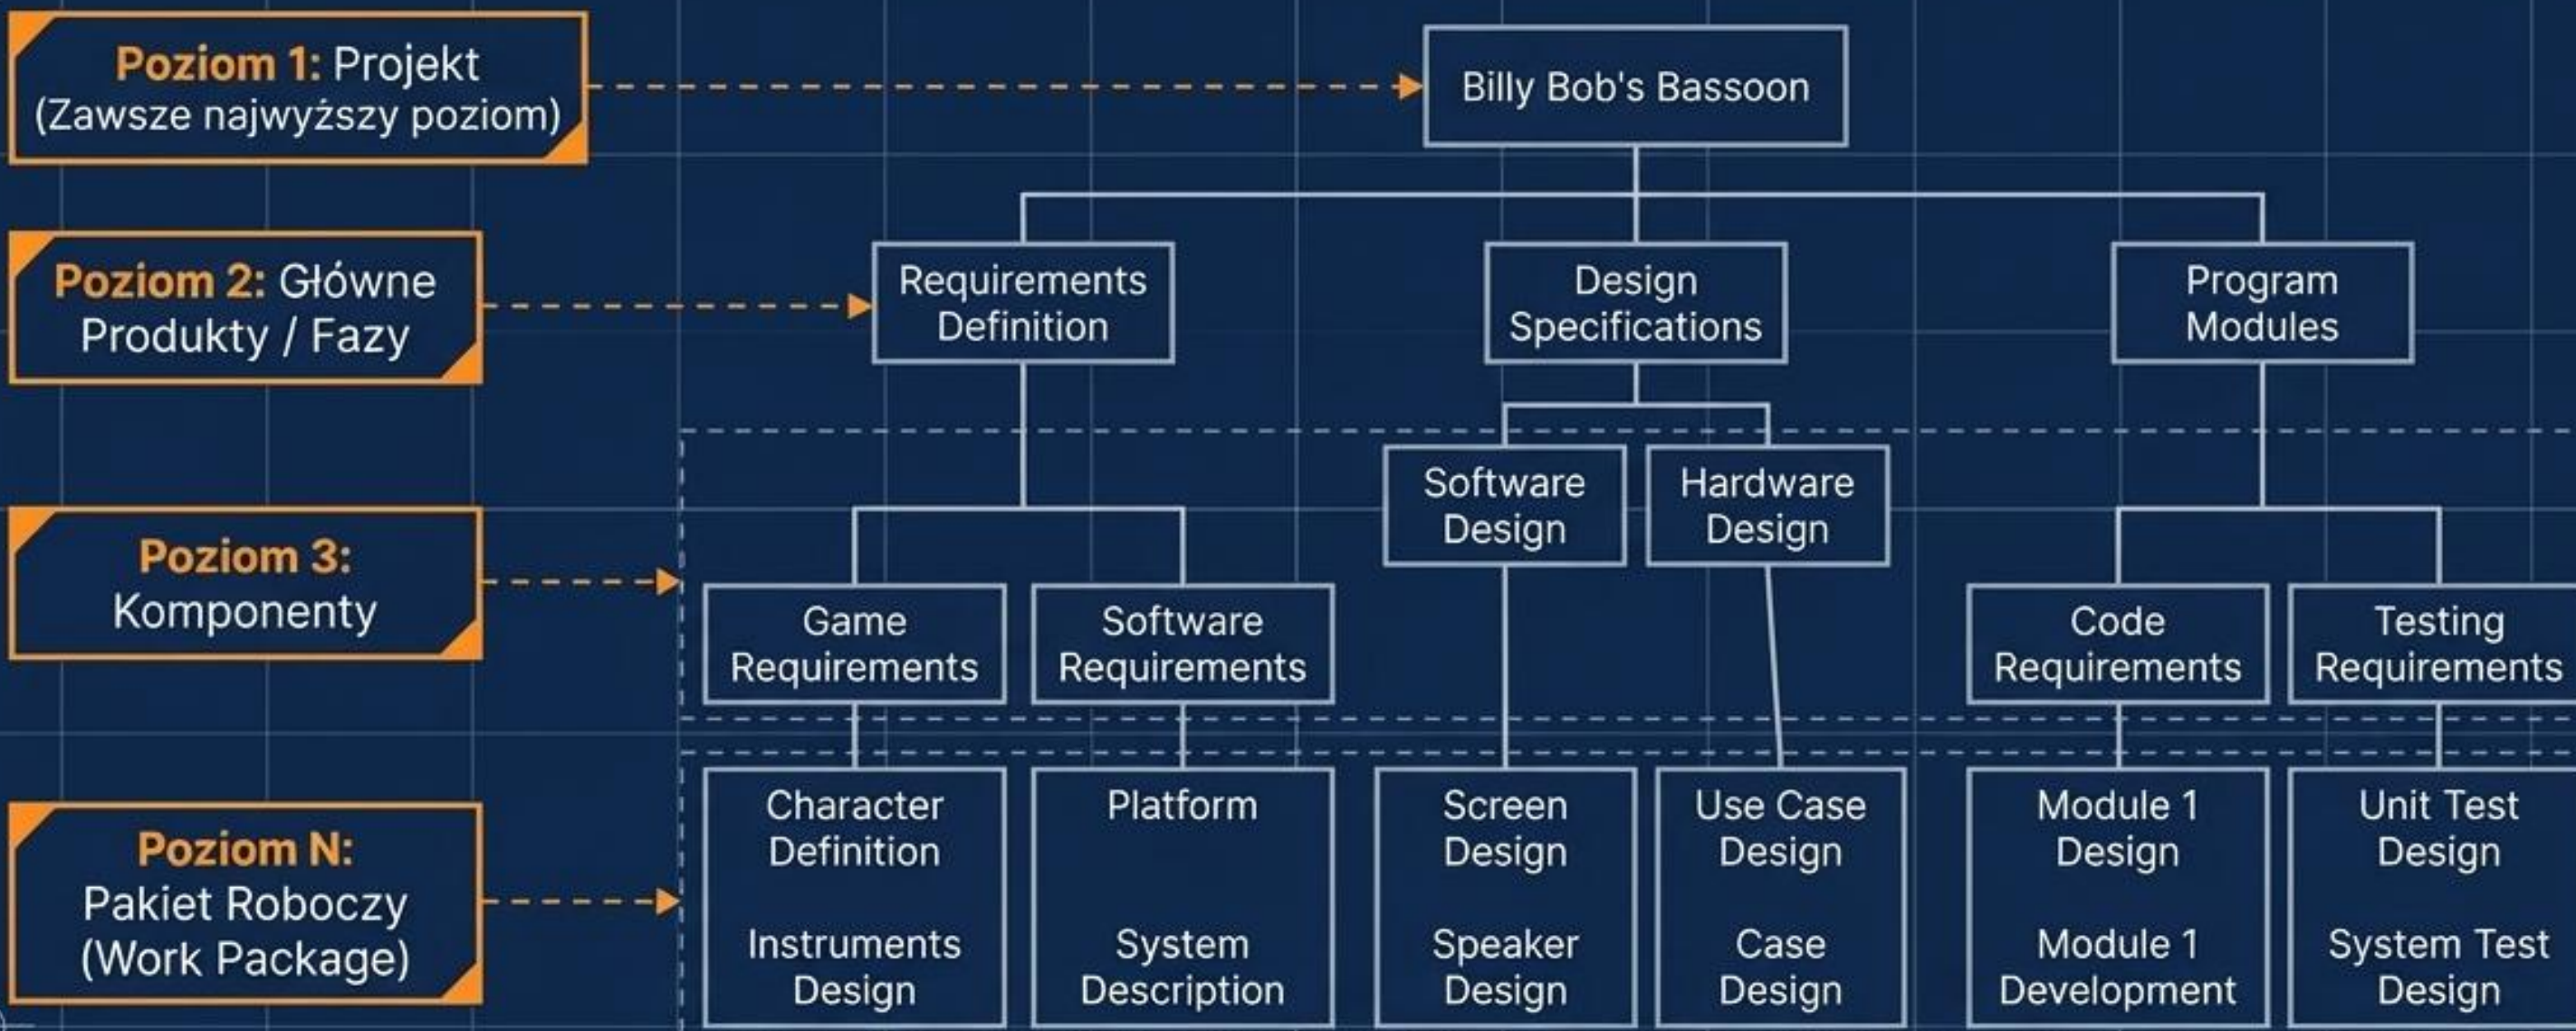

Złota zasada: Dekomponuj dotąd, aż praca będzie w pełni zrozumiała dla zespołu i możliwa do wykonania w sensownym czasie. Nie schodź do poziomu pojedynczych zadań!


Pakiet Roboczy: Najmniejszy Tryb w Maszynie



Egzaminacyjny Pewniak: Żelazna Zasada 100%



Unikalne Identyfikatory (Code of Accounts)

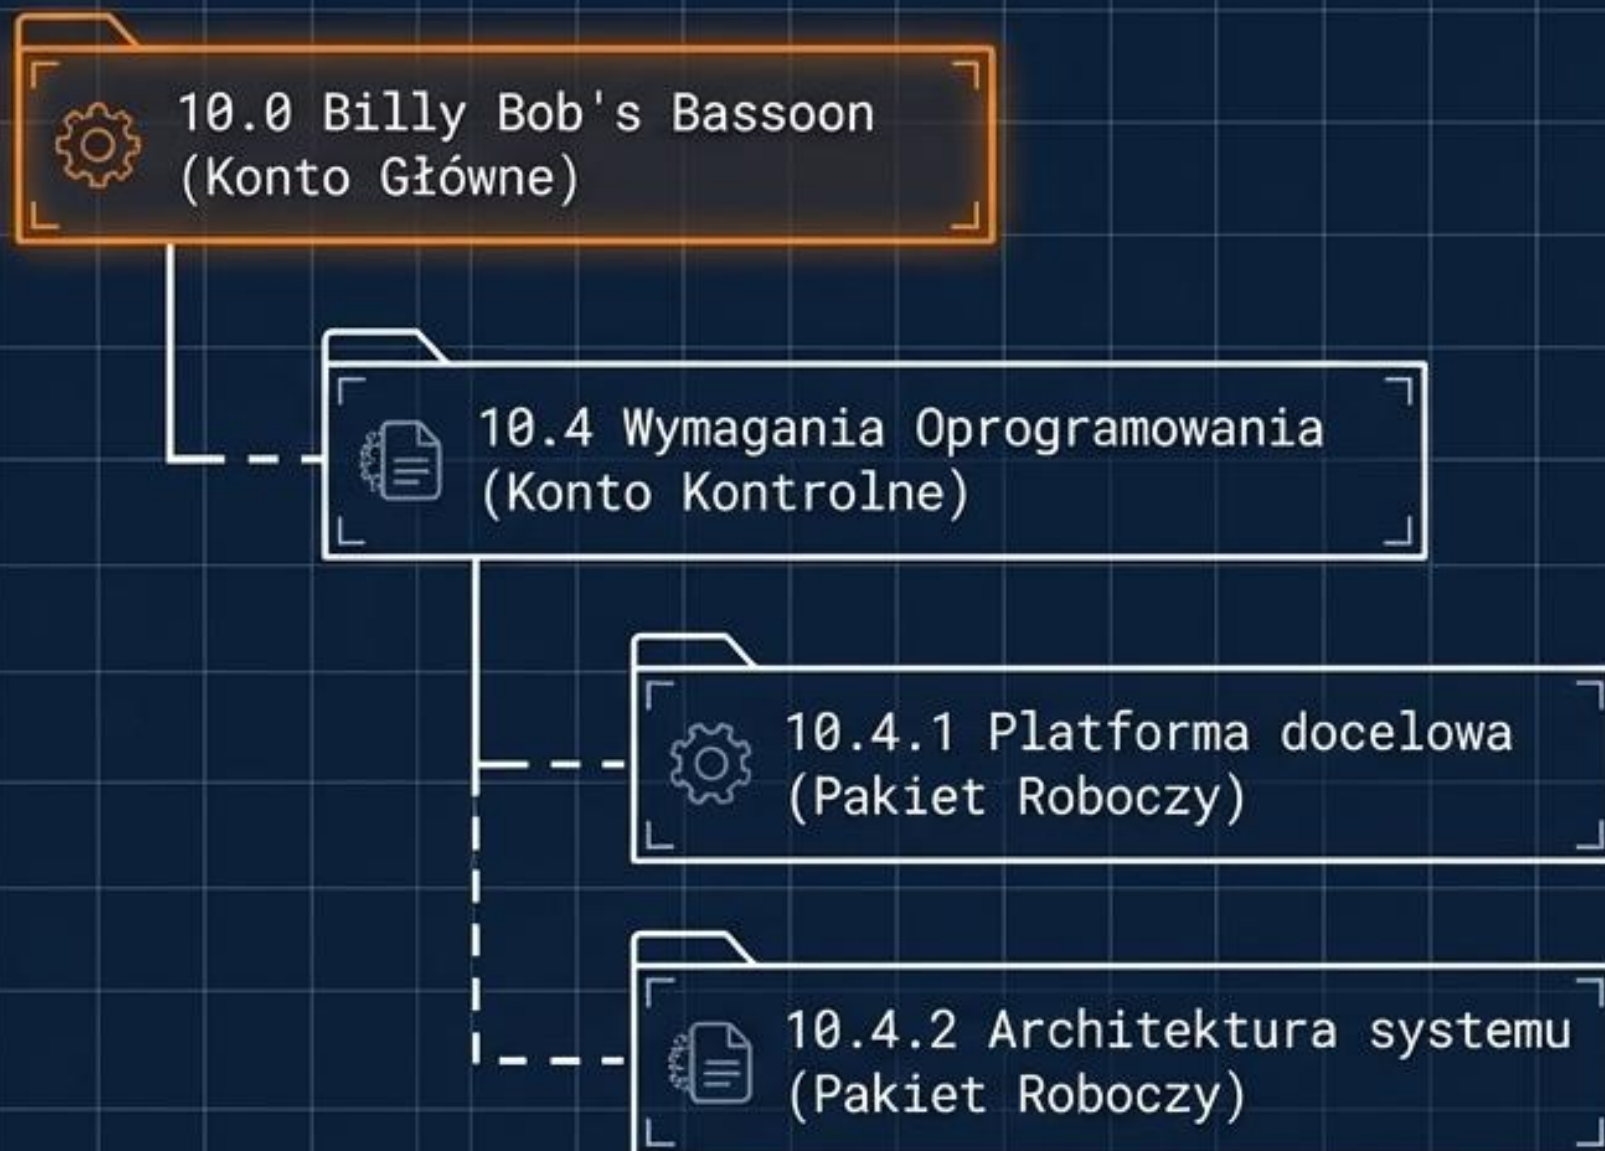

Śledzenie zasobów:

Numery służą do sumowania kosztów, harmonogramów i zasobów korporacyjnych.

Konta Kontrolne (Control Accounts):

Narzędzie łączące strukturę projektową z księgowością organizacyjną. Pozwala na zintegrowane zarządzanie budżetem i harmonogramem w wyznaczonych węzłach.

Anatomia Słownika WBS (WBS Dictionary)

Sam schemat to za mało. Słownik WBS to "dowód osobisty" i pełna specyfikacja każdego pakietu roboczego.

KARTA PAKIETU ROBOCZEGO

1	Identyfikator: KOD 3.1
2	Tytuł: Inspekcja i Identyfikacja
3	Opis prac: Inspekcja budynku pod kątem azbestu; aktualizacja planu usuwania.
4	Organizacja odpowiedzialna: Adrian (Dział Utrzymania Ruchu) / Zewnętrzny Wykonawca.
5	Kamienie milowe: Start do 1 lipca. Koniec nie później niż 15 września.
6	Szacowany koszt: [Oczekuje na wycenę dostawcy]
7	Kryteria akceptacji: Raport z certyfikowanego laboratorium środowiskowego.

APPROVED

Wielka Synteza: Linia Bazowa Zakresu



WBS to nie jest samodzielny dokument wyjściowy. To krytyczny komponent Linii Bazowej Zakresu, stanowiącej żelazny fundament decyzyjny na resztę projektu.

Macierz Diagnostyczna: Produkty vs. Działania



WBS (Zarządzanie Zakresem)

Gramatyka: Rzeczowniki (Nouns) - np. "System przeciwpożarowy".

Fokus: CO dostarczamy? (Produkty / Deliverables).

Proces PMBOK: Create WBS.

Rezultat: Zdefiniowana architektura rozwiązania.



Harmonogram (Zarządzanie Czasem)

Gramatyka: Czasowniki (Verbs) - np. "Zainstaluj rury sprężarkowe".


Fokus: JAK to zrobimy? (Działania / Activities).

Proces PMBOK: Define Activities.

Rezultat: Zdefiniowana chronologia i praca zespołu.


Planowanie Kroczące (Rolling Wave Planning)

Co zrobić z fazami, które odbędą się za rok i brakuje do nich danych wejściowych?

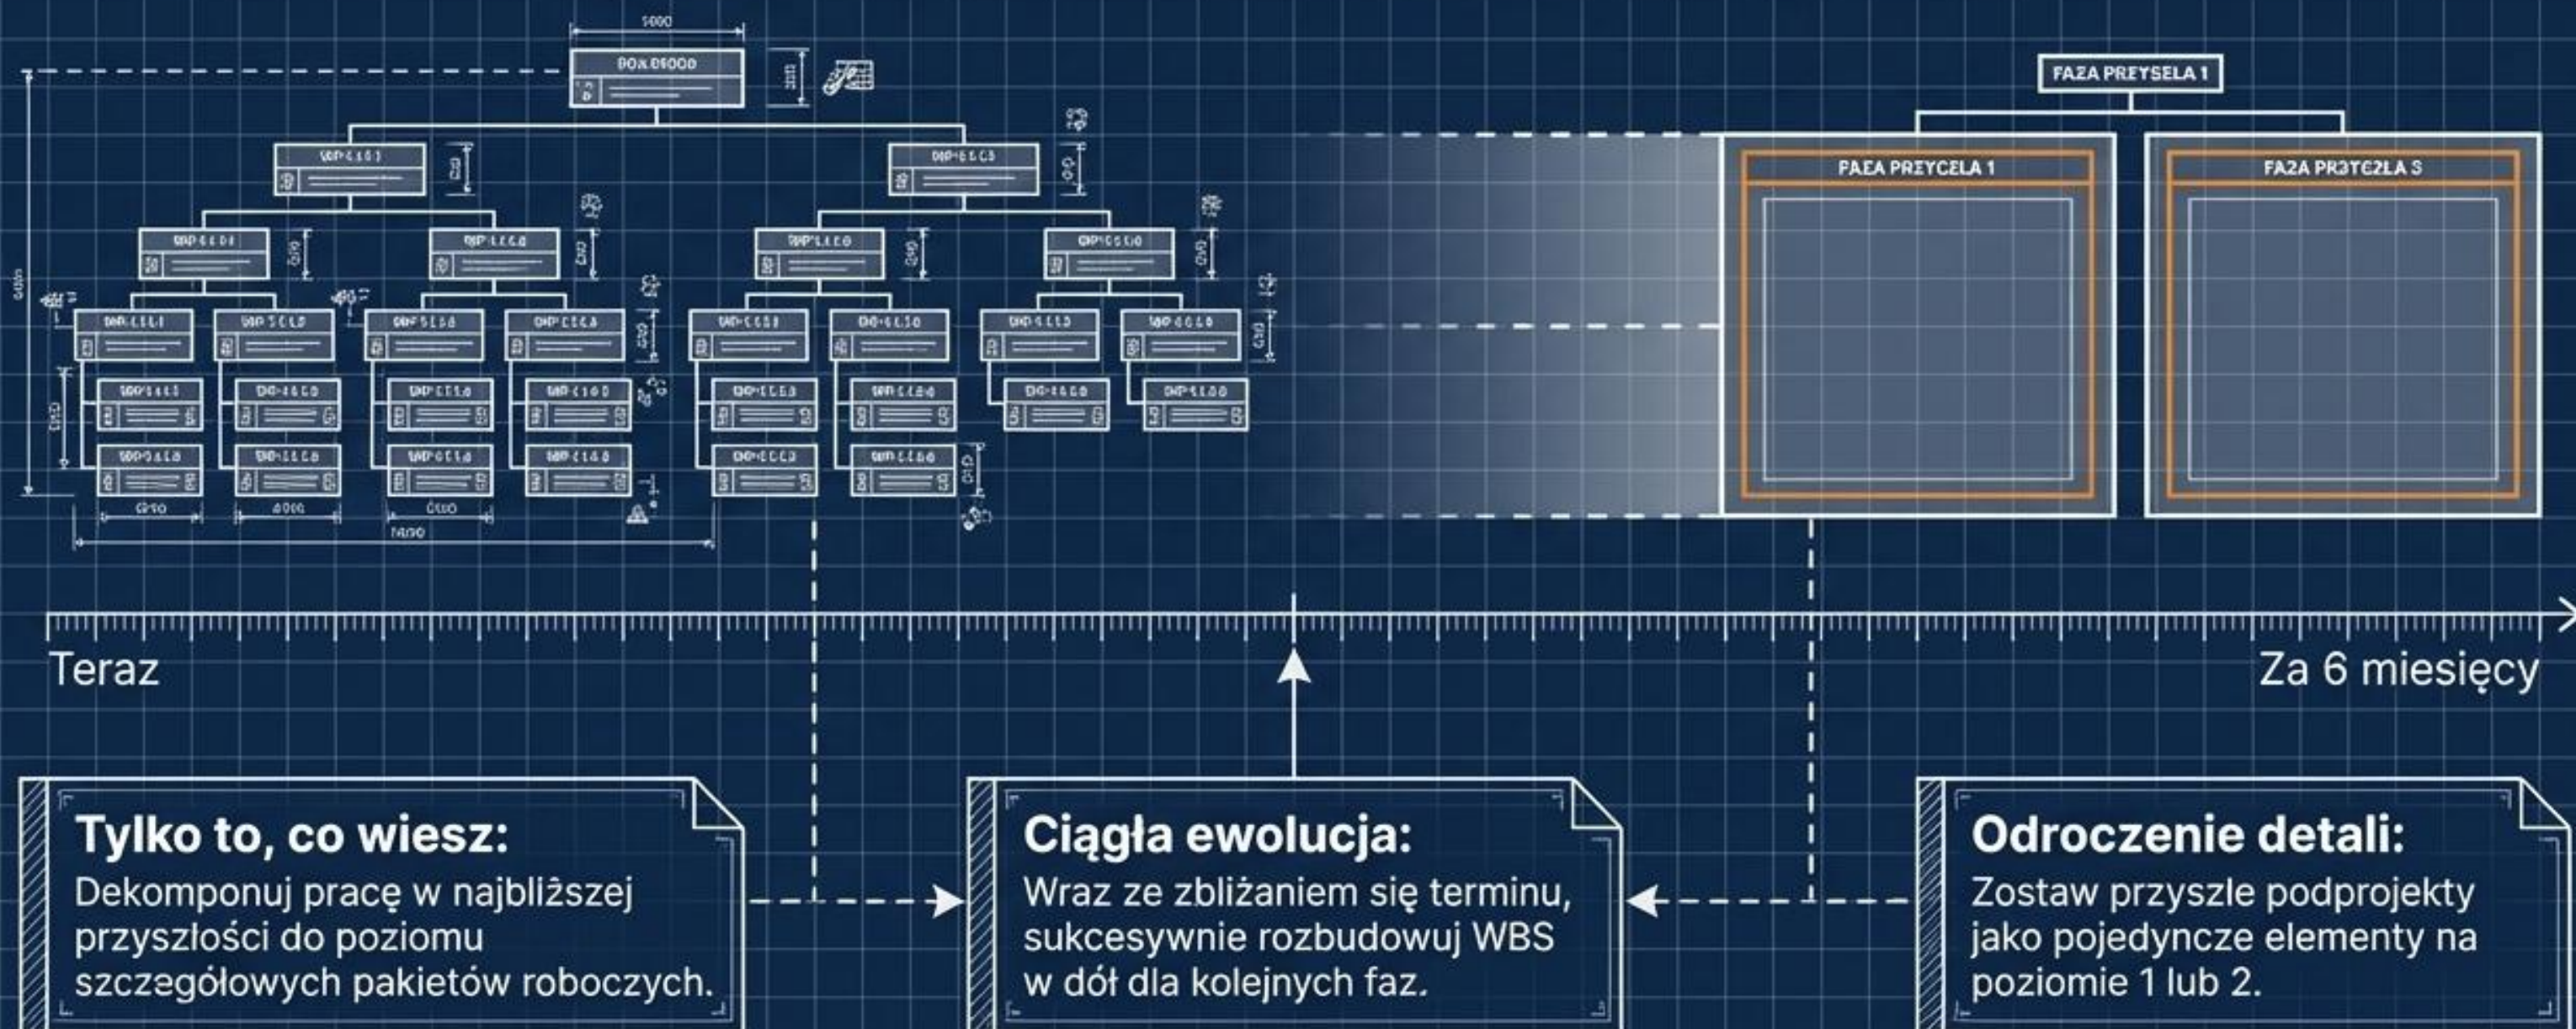

Studium Przypadku: Zlecanie Podprojektów

Renowacja budynku Lincoln Street.

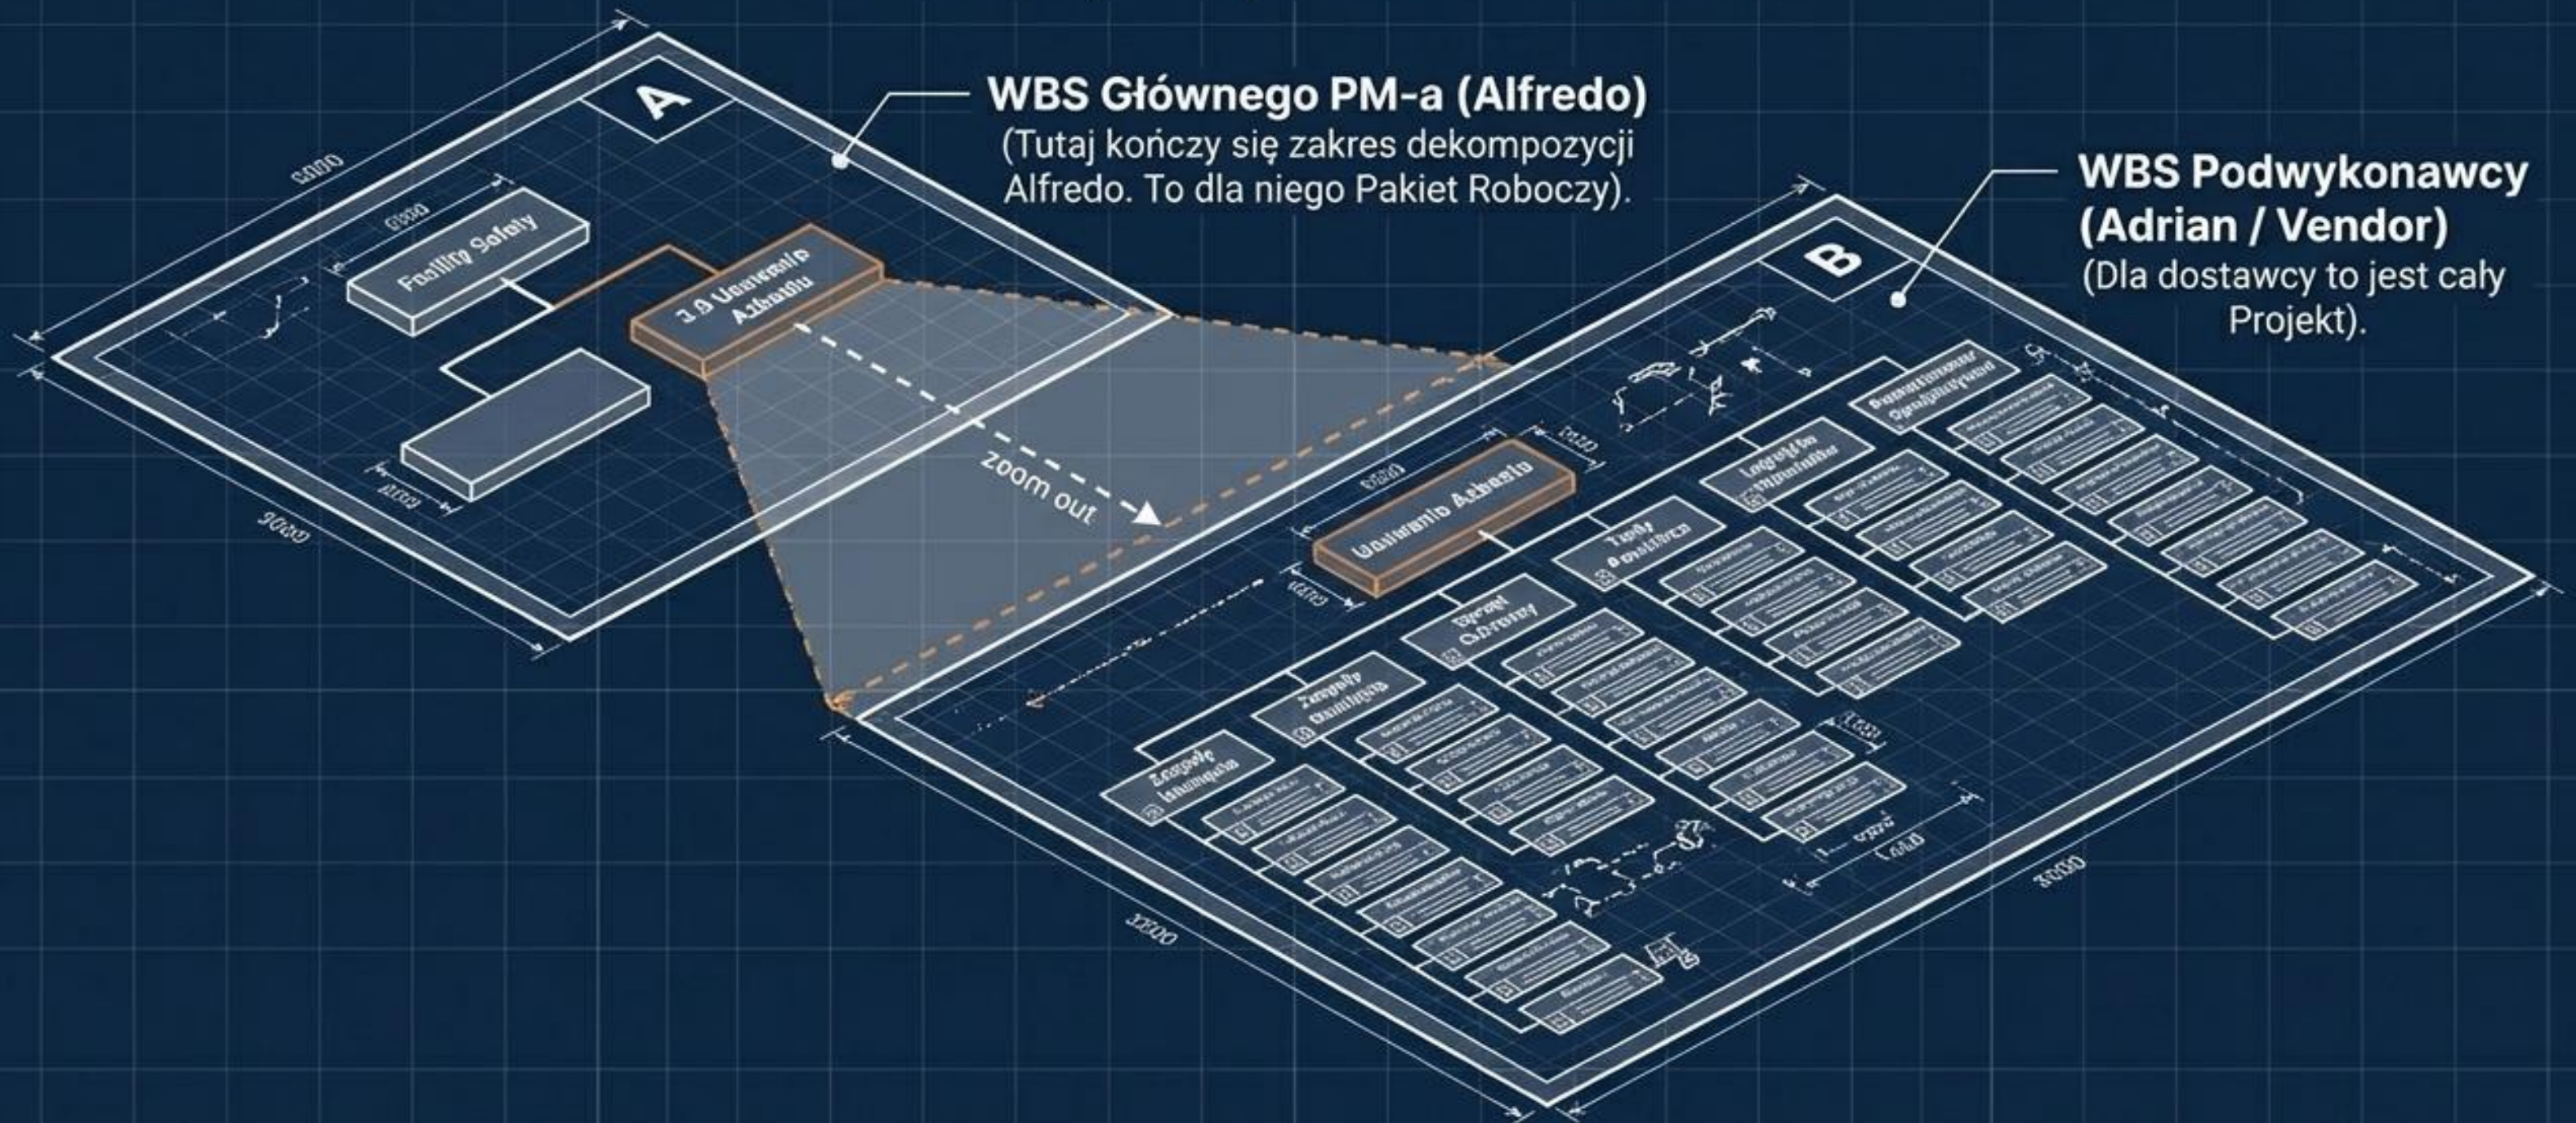

Kluczowe Wnioski Egzaminacyjne



WBS rozbija produkty, nie działania. Używaj rzeczowników. Zostaw czasowniki na fazę harmonogramowania (**Define Activities**).

Zawsze stosuj **Zasadę 100%**. Suma pracy w węzłach-dzieciach musi perfekcyjnie pokrywać zakres węzła-rodzica. Brakujący element na schemacie = praca wykluczona z projektu.

Scope Baseline to Triada. Linia bazowa zakresu, stanowiąca fundament Twoich decyzji, to nierozzerwalne połączenie: **Scope Statement + WBS + WBS Dictionary**.
