


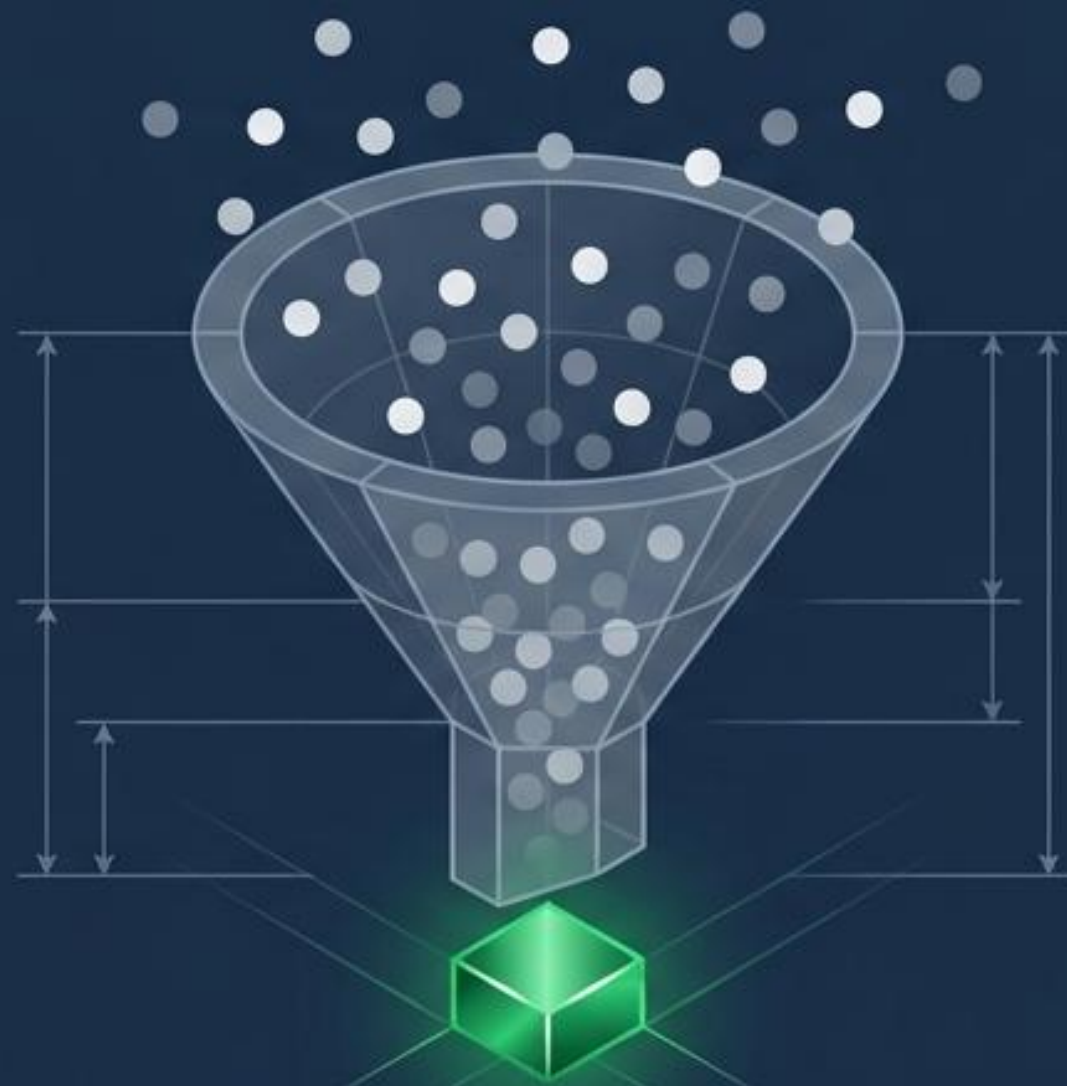

Certyfikat PMP: Zakres Projektu

Od strategicznej potrzeby, przez selekcję finansową, aż po Kartę Projektu.

dr Zbigniew Galar

THE **WRONG** WAY



Prezes ogłasza zaskoczenia

CEO niespodziewanie ogłasza wdrożenie nowego systemu telefonicznego do Święta Dziękczynienia na spotkaniu działu.

Menedżer dowiaduje się o projekcie z przemówienia.

Brak analizy, brak definicji zakresu.

THE **RIGHT** WAY



Formalne Inicjowanie

Formalne rozpoznanie potrzeby biznesowej ✓, po którym następuje rzetelna analiza opłacalności.

Projekt otrzymuje autoryzację i zasoby ✓ dopiero wtedy, gdy zakres ma legitymizację biznesową.




Brama Wstępna: Studium Wykonalności (Feasibility Study)



Kto decyduje o ostatecznym zakresie?



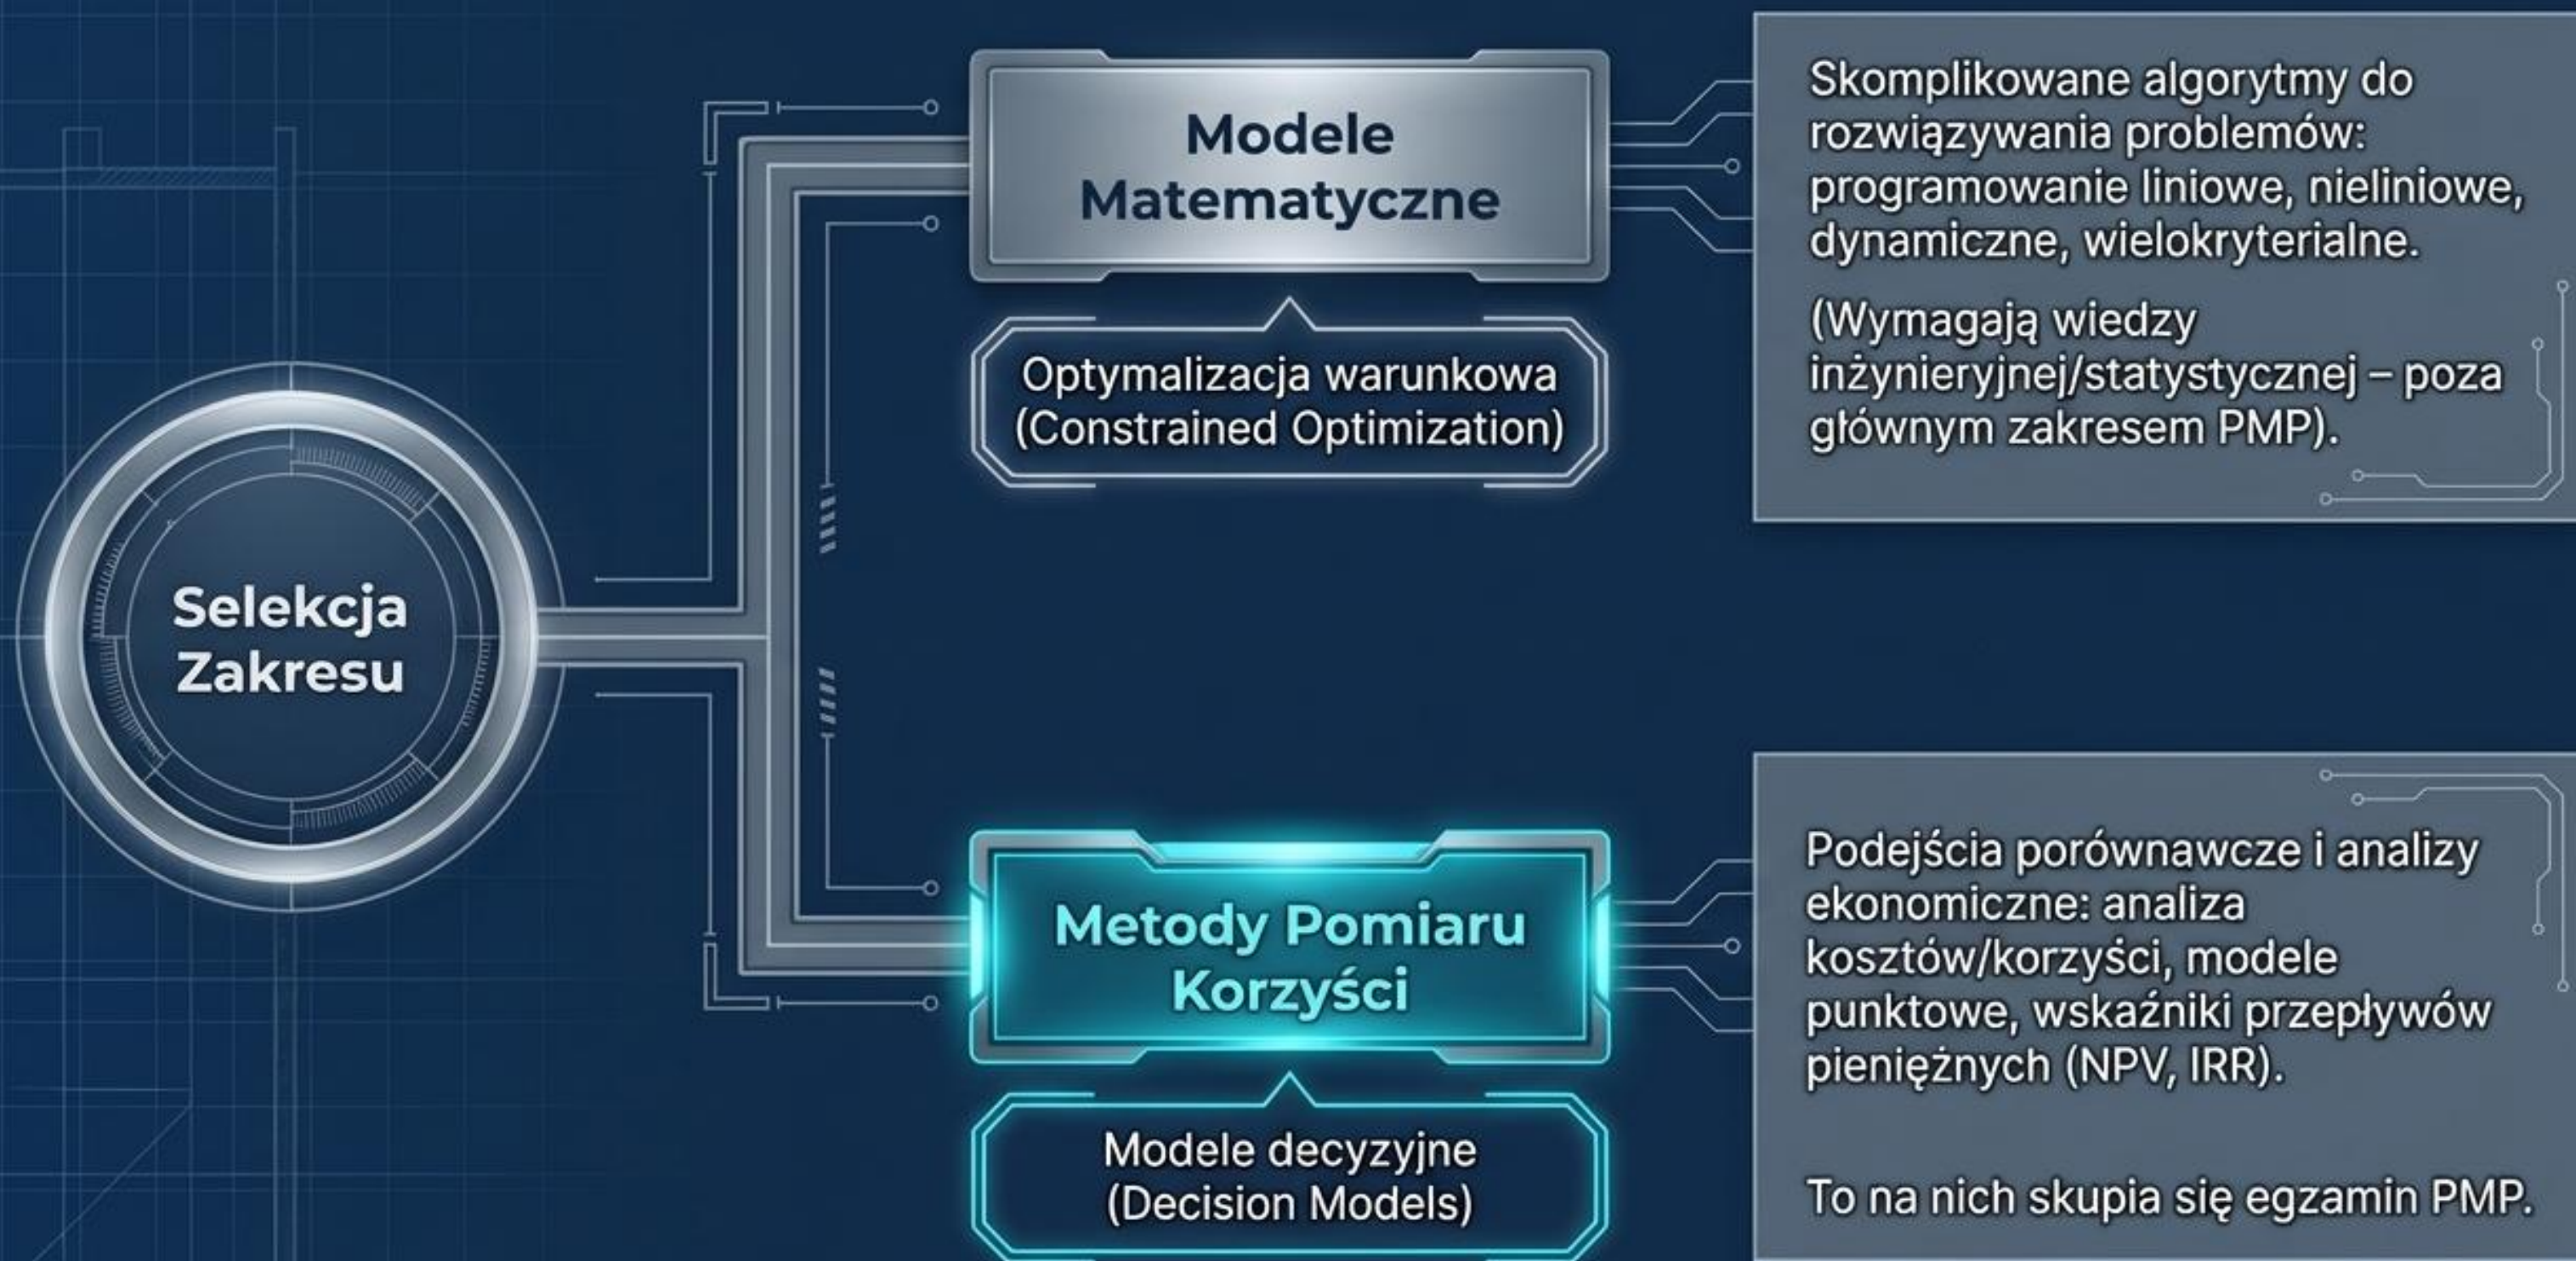

Analiza Kosztów i Korzyści (Cost-Benefit Analysis)

Koszty - \$5 mln

- **Koszty wytworzenia:** Programiści, sprzęt, testowanie.
- **Koszty wejścia na rynek:** Marketing, podróże służbowe, demonstracje.
- **Koszty wsparcia:** Zespół pomocy technicznej (Customer Support).



Korzyści - \$12 mln

- **Przychody:** Prognozowana sprzedaż przez przewidywany cykl życia produktu (np. 3 lata).

Zasada Decyzyjna: Korzyści finansowe muszą przewyższać koszty. W tym przypadku $\$12M > \$5M$. Komitet Sterujący wydaje rekomendację GO.

Modele Punktowe (Weighted Scoring Model)




	Kryterium	Waga	Projekt A wynik	Projekt A suma	Projekt B wynik	Projekt B suma	Projekt C wynik	Projekt C suma
1	Potencjał zysku	5	5	25	5	25	3	15
2	Potencjał rynkowy	3	4	12	3	9	4	12
3	Łatwość produkcji	1	4	4	3	3	2	2
	SUMA	-	-	41	-	37	-	29



Wniosek: Projekt A wygrywa bezapelacyjnie (41 pkt). Ważenie kryteriów to najprostsza matematyczna metoda rozstrzygania między projektami o nakładającym się zakresie.

Wstęp do Finansów PMP: Wartość Pieniądza w Czasie

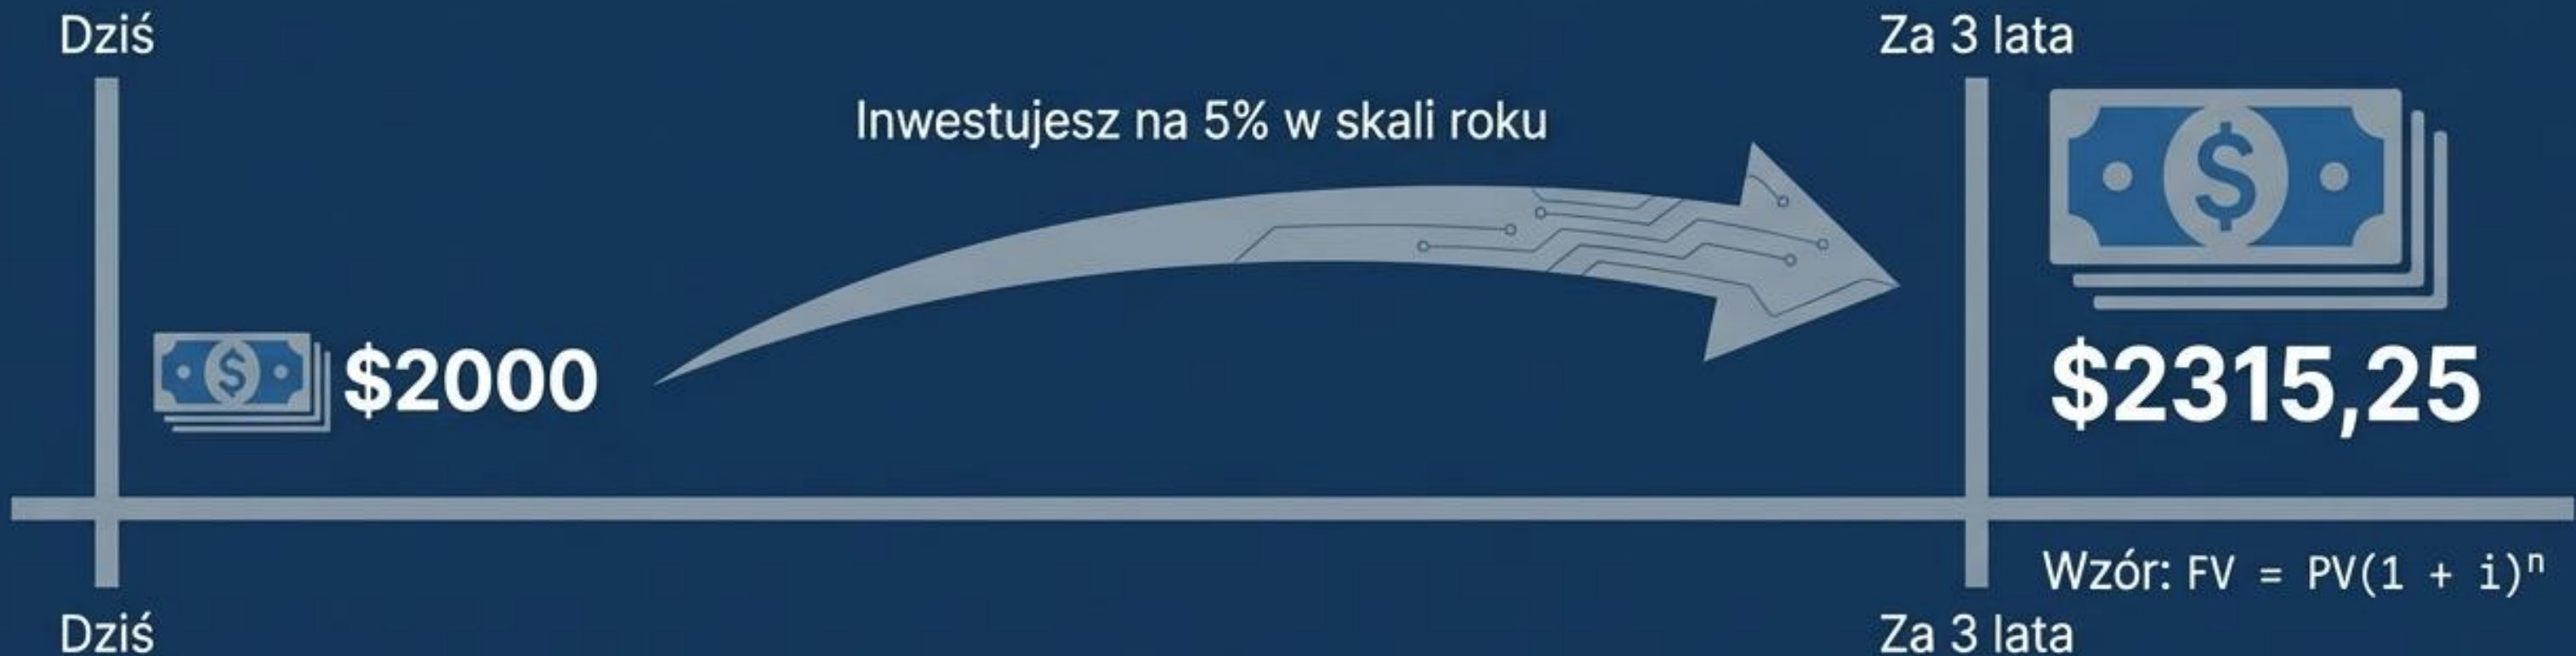

Koncepcja: \$2000 otrzymane dziś jest warte więcej niż \$2000 za trzy lata. Dlaczego? Ponieważ kapitał pracuje i generuje odsetki.

Wniosek (Discounted Cash Flow): Aby uczciwie porównać dwa projekty generujące zyski w różnym czasie, organizacja musi sprowadzić wszystkie przyszłe przychody do ich wartości w dzisiejszych dolarach (Present Value).

MACIERZ PORÓWNAWCZA:

Modele Ekonomiczne Wyboru



Payback Period (Okres Zwrotu)

Definicja: Czas potrzebny na odzyskanie początkowej inwestycji.

Wada: Najmniej precyzyjna miara. Ignoruje wartość pieniądza w czasie oraz przepływy po okresie zwrotu.

Zasada Decyzyjna: Im krócej, tym lepiej.



NPV (Net Present Value)

Definicja: Wartość projektu w dzisiejszych dolarach po odjęciu kosztów inwestycji.

Zaletą: Najbardziej precyzyjna i konserwatywna miara finansowa.

Zasada Decyzyjna: Akceptuj projekt, gdy $NPV > 0$.



IRR (Internal Rate of Return)

Definicja: Stopa dyskontowa, przy której NPV wynosi dokładnie 0.

Zasada Decyzyjna: Zawsze wybieraj projekt z najwyższym wskaźnikiem IRR.



Exam Spotlight: NPV vs. IRR w Praktyce

Case Study: Fun Days Vacation Resorts ma środki tylko na jeden projekt:

Projekt A

Okres zwrotu = 5 lat

IRR = 8%

Projekt C

Okres zwrotu = 2 lata

IRR = 3%

Konflikt

Wyższy wskaźnik IRR (Projekt A: 8%) zazwyczaj oznacza finansowe zwycięstwo.

Rzeczywistość Biznesowa (Wniosek):

Jednak Komitet Sterujący może ocenić ryzyko biznesowe – gospodarka jest niestabilna, a 5 lat to zbyt długi horyzont. Mogą wybrać niższy IRR (Projekt C), aby odzyskać gotówkę w 2 lata. PMP egzaminuje rozumienie tego napięcia między matematyką a strategią.

Karta Projektu (The Project Charter)

1

Co to jest?

Pierwszy dokument grupy procesów Inicjowania. Oficjalne potwierdzenie, że projekt istnieje.



2


Zadanie: Formalnie zatwierdza projekt, nakreśla wstępne ramy Zakresu (Scope) oraz określa cele.

3

Kluczowa Funkcja: Nadaje Menedżerowi Projektu (PM) imienne uprawnienia do dysponowania zasobami organizacji. Bez podpisanej Karty, Menedżer Projektu nie ma mocy decyzyjnej, a projekt oficjalnie nie istnieje.

Główne Wejścia Karty: Statement of Work (SOW)

Opisuje produkt, usługę lub rezultat, który ma dostarczyć projekt. W przypadku projektów zewnętrznych dokument ten dostarcza klient.

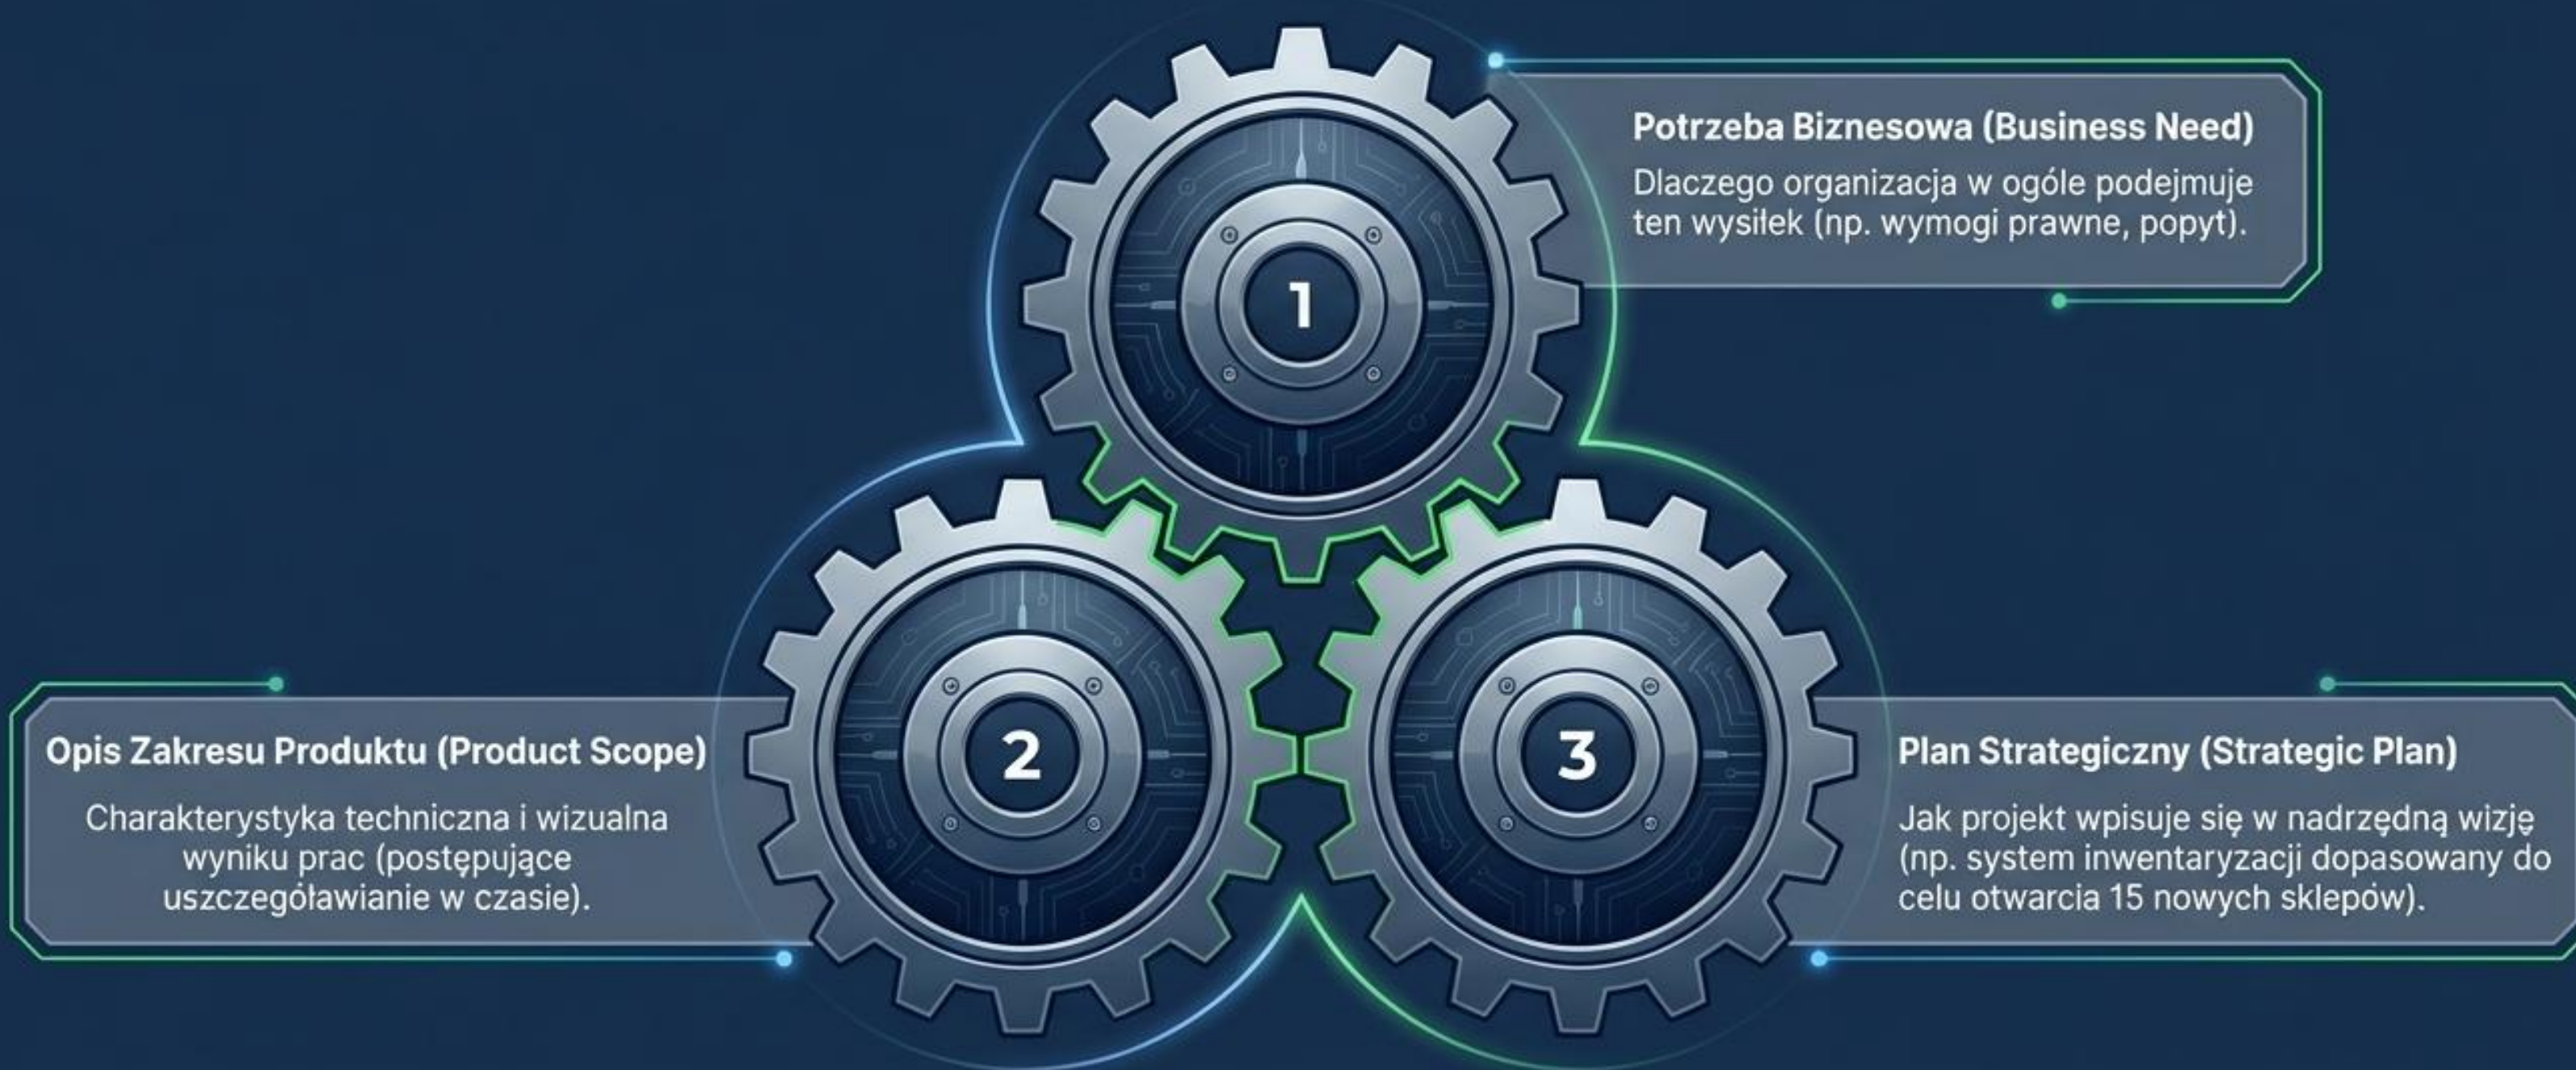

Główne Wejścia Karty: Uzasadnienie Biznesowe (Business Case)

Kluczowe pytanie: Czy ta inwestycja i ten zakres prac są w ogóle tego warte?



Synteza: Architektura Narodzin Zakresu

